






التقرير الغني لمشاريع حندوق إعادة الاعمار منذ تأسيسه و لغاية 30/4/2022

الجزء (الرابع و المحسون) نيسان 2022



### المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العر اقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريرا فنيا والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات اله (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف علها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
  - نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المرتقبة.
    - والله ولي التوفيق.

## مدفع انشاء الصندوق:-

1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.

2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.

3- تعويض الفرص التنموية.

## الية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكيه).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

# ممام حندوق إعادة اعمار المناطق المتخررة من العمليات الإرمابية وفق نظاء رقه (3) لسنة 2017

• حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي و اداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الاتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
  - · السعي الى جلب المنح و الهبات و المساعدات و القروض.
    - القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
  - متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح و القروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

## حندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العر اقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادى:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول المندوق المنفذة على الموازنة الاتحادية للاعوام 2016 لغاية 2021

الملاحظات	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المتعاقد عليه / مليار دينار	السنة
أنجزت المشاريع بالكامل	100%	_	150	150	150	19,784	2016
انجزت بالكامل مع سحب عمل من 3 مشاريع	100%	0	160	160	163	97,432	2017
مشروعين مؤجلة	97%	5	191	196	198	109,122	2018
16 مشروع لم يتم التعاقد عليها مؤجلة	80%	90	356	446	462	357,383	2019
جميع مشاريع خطة 2020 نفذت على خطة البرامج الخاصة	100%	0	23	23	23	4,962	2020
	26%	479	168	647	647	778,900	2021
	65%	574	1048	1622	1643	1,367,583	المجموع

جدول يمثل اعداد مشاريع صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة للموازنة الاتحادية حسب القطاعات منذ عام 2016 - 2021

														لماعات	القد													المحافظة
موع	المجه	حكومية	مباني	المائية	الموارد	مجاري	الماء وال	باء	الكهر	الجسور	الطرق و	حة	الص		الشر والري	اعة	الزر	غلية	الداخ	العالي	التعليم	بية	التر	بارة	التج	بة و يات	البلد <u>.</u> البلد	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز		
150	209	9	12	3	4	8	9	16	21	12	14	10	11	0	1	2	6	7	9	19	28	36	39	6	8	22	47	يئوى
73	111	1	3	2	3	0	0	11	15	5	5	1	2	0	_ i _	1	3	0	2	5	14	29	29	2	4	16	30	استثماري
77	98	8	9	1	1	8	9	5	6	7	9	9	9	0	0	1	3	7	7	14	14	7	10	4	4	6	17	برامج خاصة
384	605	16	32	15	25	128	156	34	46	28	54	13	21	3	4	3	4	12	26	25	45	64	97	3	3	40	92	الإثنيار
122	288	7	21	2	4	13	40	10	20	13	25	5	13	1	2		1	5	12	1	19	50	78			15	53	أستثماري
262	317	9	11	13	21	115	116	24	26	15	29	8	8	2	2	3	3	7	14	24	26	14	19	3	3	25	39	برامج خاصة
82	166	6	9	0	0	8	17	4	5	9	23	2	4	1	1	0	0	10	13	2	5	14	20	О	0	26	69	صلاح الدين
35	64	2	4	0	0	0	5	1 i	1	6	7	1	3	0	0	0	0	0	2	2	4	14	20	0	o	9	18	استثماري
47	102	4	5	0	0	8	12	3	4	3	16	1	1	1	1	0	0	10	11	0	1	0	0	0	0	17	51	برامج خاصة
170	255		1			24	31	16	22	85	129	4	6	1	1			4	4			18	21			18	40	ديالى
91	137					6	10	9	15	47	63	3	4			1		3	3			12	14			11	28	استثماري
79	118		1			18	21	7	7	38	66	1	2	1	1			1	1			6	7			7	12	برامج خاصة
82	107	2	3	1	1	17	18	6	6	15	23	0	0			2	2	8	9	0	1	14	20	2	2	15	22	كر كلو ك
50	62	1	2	0	0	8	8	3	3	10	12	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	14	20	0	0	11	13	استثماري
32	45	1	1	1	1	9	10	3	3	5	11	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	2	2	4	9	برامج خاصة
142	212	6	7	2	3	15	25	15	17	26	54	5	5					3	6			20	25			50	70	حزّ ام بغداد
47	85	2	2	1	2	2	9	5	5	6	25	1	1									12	16			18	25	استثماري
95	127	4	5	1	1	13	16	10	12	20	29	4	4					3	6			8	9			32	45	برامج خاصة
35	84		0		0	18	23	0	1	16	50	0	0	L		0	0			0	<u>.</u> .	1	1	0	0	0	9	ئىمال يايل
33	8 76	0	0	0	0	1 17	22	0	1	1 15	5 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	استثماري برامج خاصة
		U				1/	ZZ			12	45		- 0				U			- 0		1	1	0	- 0		8	براهج حاصه عقد تجهيز محولات لكافة
2	2							2	2																			المحافظات 2016
0	2							0	2																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2019
1	1							1	1																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2021
1048	1643	39	64	21	33	218	279	94	123	191	347	34	47	5	7	7	12	44	67	46	79	167	223	11	13	171	349	لإجمالي الكلي

القسم الثاني المنح والقروض التى يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

#### عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة المبلغ المخصص / عدد المشاريع عدد المشاريع عدد المشاريع عدد المشاريع نوع التمويل المخطط لها المتعاقد عليها المنجزة المنجزة المستمرة دولار EODPقرض البنك الدولي الطارئ-89% 13 112 125 130 \$350,000,000 قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP 34% 33 16 47 135 \$400,000,000 المنحة الألمانية لجائحة كورونا 0 **%0** 5 5 5 \$24,000,000 القرض الألماني - GFCI 2 28 **50** 7% **26 URE 500,000,000** المنحة التشيكية 10 100% 0 10 10 \$458,000,00 \$9,000,000 المنحة الصينية (118) آلية 7 100% 7 0 المرحلة الأولى **17** 18 المنحة الكويتية 31% 37 55 \$100,000,000 المرحلة الثانية 0 36

	20 / منجزة	ا لعام 16	لقطاعات	ئا <b>فظ</b> ات وا	سب المح	يدرالية ح	وازنة الف	وق على الم	ع الصند	. مشاريع	ل يمثل اعداد	جدو
الإجمالي الكلي	الموارد المائية	ā taki a uti	الماء	-1 - 4 eti	القضاء	القطاعات الصحة		n_ti_t_st	J eti	2 1 - 21	الأ. لا م. ال ص	المحافظات
112	الموارد المانية	2	<b>78</b>	الكهرباء	1	5	3	التعليم العالي	القربية	النجارة	البلديات 1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
10			2	2		2			2	1	1	نینوی
2				2								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
150	4	2	94	11	1	7	9	17	2	1	2	الإجمالي الكلي

	/ منجزة	عام 2016	القطاعات له	محافظات وا	ية على ال	بنة الفيدراا	وق للمواز	اريع الصند	مبالغ مث	، يمثل توزيع	جدول	
الإجمالي الكلي		·				القطاعات			_			المحافظات
رو جدي اسي	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الانبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								يغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نینوی
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات لعام 2017

														تصدوق حم						
موع	المج	<i>ع</i> كومية	دو ائر۔	رد مائية	قطاع الموا	الماء	قطاع	لكهرباء	قطاع ا	ف والجسور	قطاع الطرة	اخلية.	قطاع الد	تعليم العالي	قطاع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التربية	قطاع	لديات	قطاع الب	المحافظة
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
33	33	0	0	0	O	0	0	1	1	0	0	4	4	12	12	4	4	12	12	نينوى
15	15															4	4	11	11	استثماري
18	18							1	1			4	4	12	12			1	1	تشغيلي
51	52	1	1	5	5	2	2	2	3	3	3	1	1	3	3	28	28	6	6	الانبار
31	31			2	2					1	1					28	28			استثماري
20	21	1	1	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	3	3			6	6	تشغيلي
27	27	Ø	0	0	0	5	5	2	2	0	0	2	2	2	2	6	6	10	10	صلاح الدين
10	10							1	1					2	2	6	6	1	1	استثماري
17	17					5	5	1	1			2	2					9	9	تشغيلي
19	20	0	0	0	0	3	3	1	1	12	12	0	0	0	0	2	3	1	1	ديالي
15	16							1	1	12	12					2	3			استثماري
4	4					3	3											1	1	تشغيلي
11	11	0	0	0	0	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	كزكوك
2	2															2	2			استثماري
9	9					3	3	3	3	1	1							2	2	تشغيلي
13	13	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	7	7	0	0	بغداد
8	8			1	1											7	7			استثماري
5	5	1	1			1	1	2	2	1	1					************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,		تشغيلي
6	7	0	0	0	0	4	4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	بادل
0	1								1											استثماري
6	6					4	4			2	2									تشغيلي
160	163	2	2	6	6	18	18	11	13	19	19	7	7	17	17	49	50	31	31	المجموع الكلي

ملاحظة : الخلايا باللون الأصفر تعني تم سحب العمل من احد المشاريع .

#### جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2017

الإجمالي الكلي				·		ات			القطاع	Cot					المحافظة
رب جونی اسی	موارد مائية	ماء	كهرباء	طرق وجسور	دوائر حكومية	الموارد المانية	الكهرباء	الطرق والجسور	الطرق	الداخلية	التعليم العالي	التربية	البلدية	البلديات	
50,522,074,002	15,612,422,000	136,800,000	3,614,782,980	2,507,415,000	99,750,000					1,052,385,000	621,812,300	21,853,665,59 7	4,369,654,125	653,387,000	الانبار
1,964,072,520		298,620,000	819,788,000	845,664,520											بابل
6,193,070,280		284,350,000	694,443,370		100,000,000	899,346,750		88,225,000				4,126,705,160			بغداد
6,714,502,350		385,400,000							4,196,530,750			2,025,821,600		106,750,000	ديالى
12,547,743,900		1,713,600,000	1,628,400,000							779,982,000	1,214,602,000	3,491,996,900		3,719,163,000	صلاح الدين
2,908,337,000		196,481,000	1,842,734,000	63,200,000								616,582,000		189,340,000	كر كو ك
16,583,191,450							731,600,000			519,926,500	9,418,039,550	2,885,667,900		3,027,957,500	نینوی
97,432,991,502	15,612,422,000	3,015,251,000	8,600,148,350	3,416,279,520	199,750,000	899,346,750	731,600,000	88,225,000	4,196,530,750	2,352,293,500	11,254,453,85 0	35,000,439,15 7	4,369,654,125	7,696,597,500	الإجمالي الكلي

### جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2018

	11											ت	L	اعـــــا	القط												المحافظات
ہموع	<del>,</del>	نكومية	دوائر د	الموارد المانية	لمجاري	الماء وال	رياء	الكهر	الجسور	الطرق و	حة	الص	الرياضة	لشباب و	اعة اا	الزرا	لية ا	الداخ	العالي	التعليم	بية	الترب	ارة	التج	البلديات	البلدية و	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي		المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي			المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
45	48	4	5		4	4	6	6	4	4	4	4			1	1	2	3	5	5	13	13	1	2	1	1	نينوى
24	26	1	1				5	5	2	2	1	1			4	1		1	3	3	10	10	1	2	1	1	استثماري
21	22	3	4		4	4	1	1	2	2	3	3			1	1	2	2	2	2	3	3					تشغيلي
51	51	0	0.		16	16	10	10	5	5	4	4			0	0	5	5	3	3	7	7	1	1	0	0	الاثبار
10	10								3	3	3	3					4	4									استثماري
41	41		11:1:1:1:1:		16	16	10	10	2	2	1	1		111111111			1	1	3	3	7	7	1	1	1010111111	151515111	تشغيلي
18	18						1	1	3	3	1	1					4	4			6	6			3	3	صلاح الدين
8	8								2	2											6	6					استثماري
10	10						1	1	1	1	1	1					4	4				. [ - ] - ] - ] - ] -			3	3	تشغيلي
33	34	0	0	ļ., <b></b>	4	4	3	3	18	18	1	1			0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	2	2	دیالی
16	16						2	2	12	12											2	2					استثماري
17	18	1 11111111	11:1:1:1:1:		4	4	1	1	6	6	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11:1:1:1:1	1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		111111111				3	4	1111111111	111111111	2	2	تشغيلي
25	28	1	1		6	6	1	1	4	5							3	4		1	6	6	2	2	2	2	كركوڭ ، ــ. ــ.
15	16	1	1		2	2	1	1	4	4							1	1		1	6	6	_		_		استثماري
10	12				4	4				1							2	3					2	2	2	2	تشغيلي
18	18	2	2		4	4	2	2	1	1	1	1			0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	حرّام بغداد
2	2	_			_						_						_	_			2	2					استثماري
16	16	2	2		4	4	2	2	1	1	1	1			: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		2	2			1	1			3	3	تشغيلي
1	1								1	1																	شمال بابل استثماري
1	1								1	1																	استنماري تشغيلي
191	198	7	8		34	34	23	23	36	37	11	11			1	1	16	18	8	9	40	41	4	5	11	11	الإجمالي الكلي

		عام 2018	والقطاعات ك	ى المحافظات	الفيدرالية عل	في للموازنة	اريع الصندوؤ	ع مبالغ مشا	ل يمثل توزي	جدو		
1511 . 1102 1					ات		القطاع					المحافظات
الإجمالي الكلي	دوائر حكومية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية و البلديات	
19,120,011,200		4,021,707,200	2,658,704,000	3,013,384,000	1,242,514,000		2,345,197,800	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		الانبار
2,000,259,000				2,000,259,000								بابل
5,194,149,600	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		1,753,555,600		680,815,000	بغداد
13,705,639,215		1,107,700,700	1,321,577,000	7,961,501,514	96,755,000				2,379,179,500		838,925,501	ديالى
14,564,300,850			1,017,611,200	4,985,812,000	284,192,000		2,579,462,400		4,281,372,250		1,415,851,000	صلاح الدين
11,219,925,305	362,528,000	2,248,862,005	467,952,500	2,278,434,000			1,678,050,400	864,570,000	2,398,886,000	576,140,000	344,502,400	كركوك
43,318,433,950	2,054,444,000	1,479,428,750	13,159,580,000	3,300,644,000	6,263,047,000	232,313,000	2,317,910,600	3,348,214,600	5,944,624,000	5,029,748,000	188,480,000	نینوی
109,122,719,120	2,716,972,000	9,675,601,755	19,641,534,600	23,746,014,514	7,906,258,000	232,313,000	9,320,657,200	5,354,733,500	20,846,756,650	6,213,304,000	3,468,573,901	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2019

									عم و			ات ا				ر از از از لاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	القط	ن المحوار	<u>ی ر</u>	<u>.,                                    </u>	حبي ·			وں یہ	•			المحافظة
ي الكلي	الإجمالم	حكومية	مبائي	المائية	الموارد	امجاري	الماء وا	رباء	الكه	الجسور	الطرق و	حة	الص		الشر والريـ	اعة	المزر	خلية	الداخ	العالي	التعليم	بية	التر	ارة	التج	البلديات	لبلدية و	ا نوع التمويل
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
48	75	1	3	2	3	1	2	7	12	5	5	4	4	0	1	1	5	0	0	2	9	17	20	4	5	4	6	نینوی
34	54		2	2	3			6	10	3	3				1	1	3			2	9	15	15	1	2	4	6	استثماري
14	21	1	1			1	2	1	2	2	2	4	4				2					2	5	3	3			تشغيلي
110	139	9	11	3	3	20	25	16	17	9	11	2	3	2	2	3	3	2	3	1	6	25	34	2	2	16	19	الانبار
72	97	7	9			9	14	9	10	8	10	2	3	1	1			1	2	1	5	22	30			12	13	استثماري
38	42	2	2	3	3	11	11	7	7	1	1			1	1	3	3	1	1		1	3	4	2	2	4	6	تشغيلي
24	43	6	7	0	0	1	3	0	0	4	8	1	3	1	1	0	0	0	2	0	2	2	8	0	0	9	9	صلاح الدين
17	32	2	3				1			4	5	1	3						2		2	2	8			8	8	استثماري
7	11	4	4			1	2				3			1	1											1	1	تشغيلي
73	87	0	0	0	0	14	15	11	14	21	22	3	3	1	1	0	0	3	3	0	0	10	11	0	0	10	18	ديالى
56	70					6	7	6	9	20	21	3	3					3	3			8	9			10	18	استثماري
17	17					8	8	5	5	1	1			1	1							2	2					تشغيلي
42	48	0	1	1	1	7	7	2	2	10	10	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	6	10	0	0	11	12	كركوك
33	39		1			6	6	2	2	6	6					2	2					6	10			11	12	استثماري
9	9			1	1	1	1			4	4							3	3									تشغيلي
58	67	3	3	1	1	7	9	5	5	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	10	13	0	0	27	31	يغداد
31	40	2	2			2	4	5	5			1	1									3	6			18	22	استثماري
27	27	1	1	1	1	5	5					3	3					1	1			7	7			9	9	تشغيلي
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
																												استثماري
1	1									1	1																	تشغيلي
0	2								2																			عقد تجهيز محولات 400KVA 250لكافة المحافظات
356	462	19	25	7	8	50	61	41	52	50	57	14	17	4	5	6	10	9	12	3	17	70	96	6	7	77	95	الإجمالي الكلي

#### كلف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2019 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

					· •	- 55- 20	, 10 / ,	<del>,                                    </del>	<del>33 - 63</del>					
							القطاعات							
الإجمالي الكلي	مباني حكومية	الموارد المانية	الماء والمجاري	الكهرياء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية والبلديات	المحافظة
105,832,527,134	5,408,799,800	731,329,600	13,378,678,200	6,311,006,334	14,639,315,200	2,826,389,800	1,133,000,000	1,093,879,000	4,933,227,700	7,678,840,000	22,397,589,400		25,300,472,100	الانبار
197,190,000					197,190,000									بايل
22,437,696,150	250,000,000	284,972,000	1,885,424,000	1,941,297,500	12,866,938,000	1,230,226,000					3,728,838,650		250,000,000	بغداد
56,451,653,650			5,362,936,190	7,745,451,400	18,809,091,400	7,406,275,000			1,969,140,800		6,523,158,660		8,635,600,200	دیالی
37,025,090,702	5,472,100,900		1,135,174,400		11,014,512,000	2,698,634,400			1,085,670,400	920,492,000	5,000,335,600		9,698,171,002	صلاح الدين
27,686,252,641	3,098,129,600		4,171,735,000	1,175,735,040	7,679,450,000			2,131,577,600	461,959,000		2,369,721,600		6,597,944,801	كركوك
80,312,855,740	275,000,000	4,334,667,600	406,700,000	17,715,446,300	601,200,000	5,614,116,000	339,240,000	6,062,453,800		24,555,012,200	6,001,559,000	5,044,808,640	9,362,652,200	نینوی
				10,300,000,000										عقد تجهيز محولات KVA + 400KVA 250 لكافة المحافظات
340,243,266,017	14,504,030,300	5,350,969,200	26,340,647,790	45,188,936,574	65,807,696,600	19,775,641,200	1,472,240,000	9,287,910,400	8,449,997,900	33,154,344,200	46,021,202,910	5,044,808,640	59,844,840,303	الإجمالي الكلي

				انة)	نفيذ ام	ة - (ت	ج خاص	ا برامح	202	عام 0	لخطة	فظات	والمحا	اعات	ب القط	بة حس	فيدرال	إزنة ال	ى المو	ق علم	الصندو	ساريع	داد مث	مثل اء	دول ي	<b>,</b>			
												ات				ظاعــــــ	الذ												المحافظة
) الكلي	الإجمالي	حكومية	مباني	المانية	الموارد	لمجاري	الماء واا	باء	الكهر	الجسور	الطرق و	حة	الص	الرياضة	الشباب و	اعة	الزر	غلية	الداخ	لعالي	التعليم ا	بية	الترا	ارة	التج	البلديات	البلدية و	نوع التمويل	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي		
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4		الاتبار
0	0																											استثماري	
6	6													1	1					1	1					4	4	تشغيلي	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		بابل
																												استثماري	
1	1																					1	1					تشغيلي	
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		بغداد
0	0																											استثماري	
4	4																									4	4	تشغيلي	
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		ديالى
0	0																											استثماري	
5	5									4	4											1	1					تشغيلي	
3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		صلاح الدين
0	0																											استثماري	
3	3					1	1			2	2																	تشغيلي	
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<b>كركو</b> ك
0	0																											استثماري	
1	1	1	1																									تشغيلي	
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		نینوی
0	0																											استثماري	
3	3									1	1							1	1							1	1	تشغيلي	
23	23	1	1	0	0	1	1	0	0	7	7	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	9	9	پ	الإجمالي الكلم

#### كلف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2020 موزعة حسب القطاعات والمحافظات / البرامج خاصة (تنفيذ امانة)

	1	رسي مصدر المسيد	<del>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>	القطاعـــــات	, Lan #19#1 - 19#1	<u> </u>		
اجمالي كلفة المشاريع	مباني حكومية	الماء	الطرق	الشباب و الرياضة	الداخلية	التربية	البلدية	المحافظات
1,386,656,000				202,106,000	249,975,000		934,575,000	الإنبار
195,233,500						195,233,500		بایل
853,704,000							853,704,000	بغداد
1,030,457,500			908,620,000			121,837,500		دیائی
658,600,000		194,750,000	463,850,000					صلاح الدين
179,547,500	179,547,500							كركوك
658,033,000			200,425,000		220,185,000		237,423,000	نینوی
4,962,231,500	179,547,500	194,750,000	1,572,895,000	202,106,000	470,160,000	317,071,000	2,025,702,000	الإجمالي الكلي

#### خلاصة باعداد المشاريع للموازنة الاتحادية لعام 2021 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

																قطاع_	tı											
لمحافظات	اجمالي ا	<u> </u>	مبانی ۵	المائية	الموارد	مجاري	الماء وال	رباء	الْكهر	الجسور	الطرق و	حة	الص	الرياضة	الشباب و	اعة		طية	الداخ	العالى	التعليم	بية	الترب	ارة	التجا	البلديات	البلدية و	المحافظات
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز		المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي			المنجز	الكلي	نوع التمويل
11	40	4	4	1	1	1	1			2	4		1						1		2					3	26	نینوی
	16												1						1		2						12	استثماري
11	24	4	4	1	1	1	1			2	4															3	14	برامج خاصة
54	245	3	17	3	13	12	35	5	15	11	35	2	9		1		1		13	1	16	4	28			13	62	الانيار
9	150		12		2	4	26	1	10	1	11		7		1		1		6		14		20			3	40	استثماري
45	95	3	5	3	11	8	9	4	5	10	24	2	2						7	1	2	4	8			10	22	برامج خاصة
6	71		2			1	8	1	2		10								1		1					4	47	صلاح الدين
	14		1				4																				9	استثماري
6	57		1			1	4	1	2		10								1		1					4	38	برامج خاصة
40	109		1			3	9	1	4	30	73		2					1	1							5	19	ديالى
4	35					<u> </u>	3		3	3	18		1													1	10	استثماري
36	74		1			3	6	1	1	27	55		1					1	1							4	9	برامج خاصة
	16						1				7												2				6	<u>كر كو ك</u>
	5						_				2												2				1	استثماري
	11						1				5																5	برامج خاصة
43	104		1		1	3	11		2	24	52								3				2			16	32	بغداد
6	35				1	<u> </u>	5			6	25												1				3	استثماري
37	69		1			3	6		2	18	27								3				1			16	29	برامج خاصة
13	61					1	6			12	46																9	بابل
1	6					1	1				4																1	استثماري
12	55						5			12	42																8	برامج خاصة
1	1							1	1	_																		عقد تجهيز محولات 250 KVA 400KVA +لكافة المحافظات
168	647	7	25	4	15	21	71	8	24	79	227	2	12		1		1	1	19	1	19	4	32			41	201	اجمالي القطاعات

Zί

#### كلف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2021 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

						ات	القطاع						
المجموع	مباني حكومية	الموارد المائيه	الماء و المجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	البلدية والبلديات	المحافظة
312,096,979,799	14,379,323,700	15,675,854,500	45,993,763,000	12,100,515,500	42,929,287,500	9,727,567,500	629,667,000	320,950,000	18,072,708,000	14,132,972,130	30,554,476,000	107,579,894,969	الإنبار
44,199,615,950			4,218,077,750		25,874,156,100							14,107,382,100	بابل
108,879,762,750	714,290,000	4,348,686,000	13,781,052,850	3,654,080,000	38,273,790,000				3,778,080,000		1,893,295,900	42,436,488,000	بغداد
108,119,807,900	785,336,000		9,486,914,000	2,480,584,200	70,647,169,200	1,643,642,000			208,769,000			22,867,393,500	ديالى
86,332,414,568	2,335,072,500		7,418,070,500	1,851,528,000	2,541,357,000				1,799,999,500	4,333,601,833		66,052,785,235	صلاح الدين
26,665,802,300			1,292,140,000		12,188,645,000						1,456,016,500	11,729,000,800	كركوك
88,756,325,133	856,492,000	242,973,000	142,710,000		820,250,000	579,850,000			2,036,837,833	7,221,145,000		76,856,067,300	نینوی
3,850,000,000				3,850,000,000									عقد تجهيز محولات 250 KVAلكافة المحافظات
778,900,708,400	19,070,514,200	20,267,513,500	82,332,728,100	23,936,707,700	193,274,654,800	11,951,059,500	629,667,000	320,950,000	25,896,394,333	25,687,718,963	33,903,788,400	341,629,011,904	المجمـــوع

## مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2016



#### مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار الميلغ القضاء / الناحبة اسم المشروع القطاع ت الرمادي صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م3 / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة 200م3 / ساعة 58,320,000 الماء 1 الرمادي صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م3 في الرمادي الماء 69,525,000 2 صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م3 + تاهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م3 /ساعة الرمادي الماء 55,534,000 3 تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروعي ماء تل اسود ( عبد مخيلف ) وتل اسود ( عبد مناور ) 86,000,000 هيت / الفرات الماء 4 الرمادي صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م³/ساعة في قضاء الرمادي 96,515,000 الماء 5 الرمادي صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي الماء 76,570,000 6 تجهيز مولدة كهرباء 250 كي في اي لمجمع اليونسيف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث الرمادي الماء 90,000,000 7 تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي الرمادي الماء 66,000,000 8 الرمادي صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي 81,167,000 الماء 9 الرمادى صيانة ماء طوى البوجراد الماء 10 72,500,000 الرمادي صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م³/ساعة+تاهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة 200م³/ساعة 75.850.000 الماء 11 صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م³/ساعة في قضاء الرمادي الرمادي 84,960,000 الماء 12 صيانة مجمع ماء البو كاطع + تجهيزمولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذياب الحويجة الرمادي 93,000,000 الماء 13 صيانة مجمع ماء البوعبيد ( طالب عفات ) + تاهيل مجمع ماء البوذياب القصر سعة 200م3/ساعة في قضاء الرمادي الرمادي الماء 73.280.000 14 الرمادى تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذياب الجنابيين الماء 90,000,000 15 صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م³/ساعة في قضاء الرمادي الرمادى 42,890,000 الماء 16 استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي الماء 68.495.000 17 لرمادي استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في 66,295,000 الرمادي الماء 18 الرمادي 72,960,000 الرمادى صيانة مجمعات اليونسيف / الدوار في قضاء الرمادي الماء 19

تاهيل الشارع الرابط بين شارع البو ذويب وجسر الحوز في الرمادي

البلديات

20

67,000,000

الرمادي

2:	الداخلية	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الرمادي	82,778,000
2	الداخلية	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الرمادي	40,950,000
23	الماء	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الرمادي	82,120,000
24	الماء	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الرمادي	75,493,000
2!	الماء	ايصال التيار الكهرباني المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الإنبار	الرمادي	51,800,000
2	التعليم العالي	تأهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	الرمادي	99,325,000
2	الموارد المائية	تأهيل محطة ري البوذياب المساعدة ( البوهايس )	الرمادي	45,800,000
2	الموارد المائية	تجهيز محولات 630 KVAفي محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايز ابو طيبان	الرمادي	86,810,000
2	التعليم العالي	صيانة وتأهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	الرمادي	97,235,000
3	التعليم العالي	تأهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	الرمادي	87,740,000
3	التعليم العالي	اعادة تأهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
3	الداخلية	اعادة تأهيل بناية دائرة حماية المنشاّة في الرمادي	الرمادي	45,520,000
3	المحافظة	اعادة تأهيل بناية الاشراف الهندسي	الرمادي	99,350,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة 200م3 في قضاء الرمادي	الرمادي	83,660,000
1 3	الموارد المائية	تأهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الرمادي	99,500,000
	المحافظة	اعادة تأهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
3	الموارد المائية	تأهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البو ذياب	الرمادي	96,200,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الفلوجة	19,638,000
3	الماء	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الفلوجة	44,930,000
4	الماء	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الفلوجة	96,500,000

41	الماء	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م³/ساعة	هيت / الفرات	58,405,000
42	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفاوجة	الفلوجة	94,650,000
43	الماء	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م2/ساعة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	78,500,000
44	الماء	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيتاويين في الفلوجة	الفلوجة	73,000,000
45	الماء	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	86,950,000
46	الماء	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م3/ساعة+تاهيل مجمع ماء البو يوسف	الفلوجة	97,760,000
47	الماء	صيانة مجمعات ماء البو عزام والفلاحات الجفة والبوذياب في قضاء الفلوجة	الفلوجة	67,195,000
48	الماء	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلوان 1 في الفلوجة	الفلوجة	75,180,000
49	التعليم العالي	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	الفلوجة	99,900,000
50	القضاء	تأهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	الفلوجة	79,550,000
51	التعليم العالي	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	الفلوجة	90,000,000
52	الماء	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	هيت	55,905,000
53	الماء	مد الخط الناقل لاحياء الحلبسية وفرات وسيطرة ماجد في هيت	هيت	43,200,000
54	الماء	اعادة تأ هيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م3/ساعة	هيت	84,505,000
55	الكهرباء	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	هيت	93,306,000
56	الماء	صيانة مجمع ماء البو مانع سعة 200م³/ساعة	هيت / القرات	67,000,000
57	الماء	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م3	هيت	58,405,000
58	الماء	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	هيت	42,000,000
59	الماء	تاهیل مشروع ماء قری هیت	هيت	97,500,000
60	الماء	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	هيت / القرات	90,350,000

61	الماء	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كبيسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	هيت	84,810,000
62	الماء	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	هيت	92,620,000
63	الماء	صيانة مجمع ماء تل اسود ( مخلف المحل ) + صيانة مجمع ماء تل اسود ( عبد مناور )	هيت / القرات	99,080,000
64	الماء	صيانة المجمعات المانية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م3/ساعة * 80م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغداداي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	هيت	95,700,000
65	الصحة	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	هيت	99,877,000
66	الصحة	اعادة تاهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	هيت	99,928,000
67	الصحة	اعادة تاهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	هيت	99,972,000
68	الصحة	اعادة تاهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	هيت	99,947,000
69	الصحة	اعادة تاهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	هيت	99,877,000
70	الماء	تاهيل مشروع ماء هيت /كبيسة الموحد سعة 1000م3/ساعة	هيت	96,500,000
71	الماء	صيانة ماء الغرير سعة 50م3/ساعة	هيت / الفرات	86,240,000
72	التعليم العالي	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	هيت	84,769,000
73	الماء	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م3 / ساعة	هيت	93,210,000
74	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	حديثة	97,000,000
75	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	حديثة	97,500,000
76	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م3/ساعة	حديثة	93,800,000
77	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م3/ساعة	حديثة	75,780,000
78	الماء	تاهيل مجمع ماء الخسفة	حديثة	80,750,000
79	الماء	اعادة تاهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م3/ساعة	حديثة	80,650,000
80	الماء	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م³/ساعة	حديثة	76,250,000

95,445,000	حديثة	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	التعليم العالي	81
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م³ في الكرمة	الماء	82
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهيب 2	الماء	83
98,260,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهيب 1 بسعة 100م3	الماء	84
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م³ في الكرمة	الماء	85
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م³	الماء	86
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م <sup>3</sup>	الماء	87
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البودخيل	الماء	88
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الماء	89
94,750,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الماء	90
95,650,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الماء	91
99,800,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركز 250 كي في اي	الماء	92
91,750,000	الخالدية	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحبانية في قضاء الخالدية	الماء	93
96,700,000	الخالدية	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الماء	94
90,400,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الماء	95
99,700,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	96
63,520,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م³/ساعة	الماء	97
87,200,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	98
93,300,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الماء	99
95,000,000	الرطبة	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الماء	100

84,000,000	الرطبة	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطبة	الماء	101
53,800,000	طريبيل	تأهيل وجدة التحلية رقم ( 3 ) في مركز ماء طريبيل الرئيسي	الماء	102
96,500,000	طريبيل	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق 450 متر	الماء	103
82,175,000	الصقلاوية	تاهيل بناية الاقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	104
88,700,000	الصقلاوية	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	التعليم العالي	105
90,334,000	الصقلاوية	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بنل في المعهدالتقني	التعليم العالي	106
87,455,000	الصقلاوية	تاهيل قسم الكهرباء والقسم المدنى في المعهد التقني	التعليم العالى	107
70,900,000	الصقلاوية	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقنى	التعليم العالى	108
97,060,000	الصقلاوية	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	التعليم العالى	109
93,180,000	الصقلاوية	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	التعليم العالي	110
66,622,500	الصقلاوية	تاهيل وانشاء قاعة دراسية مرسم المعهد التقني	التعليم العالي	111
93,860,000	الصقلاوية	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تاهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	التعليم العالي	112
97,000,000	الصقلاوية	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	التعليم العالي	113
9,306,587,480		المجم		



	نینوی	201 / محافظة	مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 6	
المبلغ	القطاع	القضاء	اسم المشروع	ت
22,000,000	الماء	سنجار	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	1
45,886,000	التربية	سنجار	اعمار مدرسة ( برجا بة لة ك ) في ناحية شنكال	2
8,000,000	الصحة	سنجار	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	3
95,000,000	البلديات	سنجار	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار	4
19,000,000	الصحة	سنجار	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	5
98,000,000	التجارة	سنجار	اعمار سايلو سنجار	6
19,078,500	الكهرباء	سنجار	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	7
99,000,000	الماء	سنجار	اعمار مركز تشغيل ماء سنجار	8
20,000,000	الكهرباء	سنجار	بناية دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	9
17,256,750	التربية	سنجار	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	10
542,971,250			المجموع	



	حافظة صلاح الدين	مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / مـ		
الميلغ	القضاء	اسم المشروع	القطاع	ت
79,120,000	الدجيل	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحاقي ومركز شرطة السجلة	الداخلية	1
61,820,000	الدجيل	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الداخلية	2
56,200,000	تكريت	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	الداخلية	3
66,200,000	تكريت	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	الداخلية	4
263,340,000		المجم		



#### مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك اسم المنطقة المبلغ اسم المشروع القطاع ت اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة الداخلية تازة 92,310,500 1 اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة 95,000,000 تازة الماء 2 اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى الداخلية الملتقي 97,713,000 3 285,023,500



# Babil Governorate projects



### مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل اسم المنطقة اسم المشروع المبلغ القطاع ت تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م3 / ساعة الاسكندرية الماء 70,500,000 1 مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الغربية ) الاسكندرية الماء 82,500,000 2 تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م3 / ساعة الاسكندرية الماء 76,500,000 3 مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الشرقية ) الاسكندرية الماء 79,200,000 مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الشمالية ) الاسكندرية الماء 88,000,000 5 مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الجنوبية ) الاسكندر بة الماء 80,300,000 6 الاسكندر بة تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م3 / ساعة الماء 70,500,000 تأهيل مجمع ماء ابو شمسى سعة 200م3 / ساعة الاسكندرية 92,000,000 الماء 8 تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م3 / ساعة الاسكندرية الماء 92,000,000 9 تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 3 ) سعة 50م3 / ساعة جرف النصر الماء 88,000,000 10 تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 2 ) سعة 50م3 / ساعة جرف النصر 88,000,000 الماء 11 جرف النصر تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 4 ) سعة 50م3 / ساعة الماء 88,000,000 12 تأهيل مجمع ماء الفاضلية (1) سعة 50م3 / ساعة جرف النصر 87,500,000 الماء 13 1,083,000,000 وع\_



## مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

المبلغ	اسم المنطقة	اسم المشروع	القطاع	Ü
99,962,500	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (1)	الكهرباء	1
99,956,000	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان ( 2 )	الكهرباء	2
99,881,000	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربانية في قرية العجاج	الكهرباء	3
99,950,500	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربانية في قرية العناز (1)	الكهرياء	4
99,915,500	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربانية في قرية العناز (2)	الكهرياء	5
99,925,500	النصر والسلام	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربانية في قرية عودة الشكر	الكهرباء	6
599,591,000		المجم		

# مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2017



			4	2017 / 3	إستثمارية	الخطة الا	ة الفيدرالية /	، على الموازن	ظة نينوو	يع محافة	مشار		
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع	مدة المشروع	اعداد المستفيدين	GPS	القطاع	ت المشروع
انجاز العمل	0%	100%	100%	7/9/2018	2017-08-16	2017-08-02	716,492,000	715,512,000	38+170	600	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	التربية	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة 1 / نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	5/12/2018	2017-08-16	2017-08-02	684,563,900	687,989,900	28+180	600	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	التربية	اعدادية القيارة للبنين 12 صف /القيارة / نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	18/4/2018	2017-08-16	2017-08-02	748,708,000	750,236,000	18+170	600	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	التربية	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	5/3/2018	2017-08-13	2017-08-02	735,904,000	737,710,000	28+160	600	35° 42′31.9"N 43° 17′58.5"E	التربية	مدرسة اجحلة الابتدائية للبنين12 صف/ القيارة/ نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	16/9/2018	25L6L2016	2018-05-06	188,480,000	188,480,000	60			البلديات	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية 5 للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى
												البلديات	6 تأهيل شوارع وصبغ القوالب في الشورة
												البلديات	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل
												البلديات	كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة
انجاز العمل	0%	100%	100%	16/6/2018	2017-11-20	2017-11-05	1,570,680,000	1,527,640,000	28+70	400,000		البلديات	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز و ناحية القيارة
												البلديات	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصبة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى
												البلديات	11 إكساء شوارع داخل ناحية الشورة
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-11-28	2017-11-14	993,785,000	945,980,000	24+65	150,000		البلديات	12 إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقة 13 صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقة بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقسالس في برطلة 15 تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة
							5,638,612,900	5,553,547,900		552400			المجموع

					صة / 2017	البرامج الخاد	على الموازنة الفيدرالية ا	اريع محافظة نينوى	مش		•		
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع	مدة المشروع	اعداد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع
انجاز العمل	0%	100%	100%		2017-08-20	2017-08-02	985,290,000	900,000,000	45+140	2000	36 22.897'N 43 8.592'E	التعليم العالي	صيانة وتاهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ ينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%		منجز	2017-10-18	731,600,000	731,600,000	30	25,000	36 21 34 05N 43 01 34 28E	الكهرباء	ناهيل شبكات الكهرباء / الموصل
انجاز العمل	0%	100%	100%	29/1/2018	2017-11-16	2017-11-02	275,012,500	275,016,500	4+50	85,000		البلديات	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود
انجاز العمل	0%	100%	100%		2017-12-04	2017-11-20	327096500	303428000	12+50	150000		الداخلية الداخلية	تاهيل بناية مركز شرطة الوقاص تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك
												الداخلية	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني
انجاز العمل	0%	100%	100%	2/11/2018	2017-12-03	2017-11-21	192830000	175316000	12+50	200000		الداخلية	الجزائر تأهيل بناية مديرية شرطة النصر
انجاز العمل	0%	100%	100%	16/5/2018	2017-10-08	2017-08-02	1,539,455,000	1,414,930,000	40+154	4000		التعليم العالي	تاهيل ابنية كلية الاداب / جامعة الموصل/ نينوى
الجار النس	0%	100%	100%	16/5/2018	2017-10-08	2017-08-02	1,559,455,000	1,414,930,000	40+154	4000	36° 23.126'N 43° 8.471'E	التعليم العالي	تاهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى
* * * *											36° 22.574'N 43° 8.948'E	التعليم العالي	تاهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-03	2017-09-25	1,785,149,550	1,627,784,000	34+140	4000	36° 22.696'N 43° 8.696'E	التعليم العالي	تاهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى
انجاز العمل	0%	100%	100%	26/4/2018	2017-10-29	2017-10-15	1,611,067,000	1,464,915,000	28+140	2500	36° 23.197'N 43° 8.919'E	التعليم العالي	تاهيل كلية طب الاسنان/جامعة الموصل /نينوى
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0%	100%	100%	20/4/2018	2017-10-29	2017-10-13	1,011,007,000	1,404,915,000	20+140		36° 22.491'N 43° 8.637'E	التعليم العالي	فاهيل كليه الصيدك إنجامعه الموصل/نينوى
											36° 22.552'N 43° 8.762'E	التعليم العالي	فاهيل بداية فسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوي
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-11	2017-09-28	1,784,852,000	1,624,462,000	45+105	4250	36° 22.557'N 43° 8.579'E	التعليم العالي	ناهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى
												التعليم العالي	ناهیل ابنیه المراکز البحنیه/ جامعة الموصل/نینوی
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-11-14	2017-10-30	1,712,226,000	1,571,950,000	61+110	4250		التعليم العالي	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل تأهيل ابنية كلية الهندسة /
			43									التعليم العالي	جامعة الموصل جامعة الموصل
			45				10,944,578,550	10089401500		481000	_		



ثانوية الشورة / الشورة / نينوى





اعدادية القيارة / القيارة / نينوى





كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى





45

كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى





46

تأهيل مديرية شرطة النصر/نينوى





تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقة





إعادة تأهيل الطرق في ناحية (الشورى، القيارة، حمام العليل)



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى





كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى





كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى





تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل



				201	ستثمارية 7	الخطة الا	الاستثمارية /	للموازنة	افظة الانبار	مشاریع مح		
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	كلفة المشروع	مدة المشروع	اعداد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع
انجاز العمل	0%	100%	100%	18/7/2018	2017-08-06	2017-07- 23	1,066,033,00 0	95+210	650	33 25 13.0N 43 18 28.2E	التربية	1 ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	26/4/2018	2017-08-09	2017-07- 24	1,070,000,00 0	80+190	/IEN	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	التربية	<ul> <li>تانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار</li> </ul>
انجاز العمل	0%	100%	100%	15/5/2018	2017-08-21	2017-07- 30	1,144,525,00 0	78+190	650	33 39 03.0N 42 49 48.3E	التربية	ة ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-07-04	2017-08-17	2017-07- 30	659,631,000	177+160	<i>4</i> 50	33 23 31.4N 43 52 50.8E	التربية	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/ كالكرمة/الفلوجة/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	18/7/2018	2017-08-13	2017-07- 31	585,985,000	166+170	/ISN	33 33 14.7N 44 06 14.5E	التربية	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-10-05	2017-08-15	2017-08- 02	598,000,000	83+165	<i>1</i> 50	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	التربية	<ul> <li>مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار</li> </ul>
انجاز العمل	0	100%	100%	2/1/2019	2017-08-17	2017-08- 02	1,093,229,00 0	96+210	650	33 23 57.2N 43 36 01.7E	التربية	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/ الكرمة/الفلوجة/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-01-07	2017-08-15	2017-08- 02	611,468,000	153+180	450	33 28 03.5N 43 18 04.6E	التربية	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ 8 الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	30/6/2018	2017-08-08	2017-08- 03	599,981,000	103+180	450	33° 26′ 00.0N 43° 22′ 05.6E	التربية	و اعدادية حليمة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-12-04	2017-08-21	2017-08- 03	639,571,000	63+170	/ISN	33 37 55.3N 42 50 26.8E	التربية	1 مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-04	2017-08-15	2017-08- 03	1,266,865,00 0	29+210	650	33 25 17.0N 43 19 57.9E	التربية	1 متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/7/2018	2017-08-16	2017-08- 03	592,525,000	20+170	450	33 25 39.2N 43 17 01.6E	التربية	1مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/12/2018	2017-08-13	2017-08- 03	614,777,000	143+160	15N	33 29 46.6N 44 06 14.5E	التربية	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف / الكرمة/ الفلوجة/ 1 الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-25	2017-08- 03	573,888,800	150+150	450	33 27 50.4N 43 36 27.3E	التربية	1 مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/7/2018	2017-08-15	2017-08- 03	1,078,596,00 0	161+210	650	33 19 49.2N 43 47 49.5E	التربية	1 مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/ الفلوجة/ الانبار

انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-02	2017-08-09	2017-08- 03	631,520,000	93+180	450	33 27 29.1N 43 16 17.7E	التربية	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	1 16
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/12/2018	2017-08-23	2017-08- 13	595,000,000	134+180	450	33 25 31.6N 43 43 10.7E	التربية	مدرسة المروج الخضراء الابتدانية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	1 17
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/3/2018	2017-09-05	2017-08- 13	688,586,000	15+170	450	33 00 16.3N 42 26 13.6E	التربية	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	18
انجاز العمل	0%	100%	100%	14/7/2018	2017-09-10	2017-08- 13	651,962,500	129+170	450	33 26 49.3N 43 44 37.4E	التربية	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	19
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-01-07	2017-08-23	2017-08- 13	594,113,000	134+180	450	33 26 00.0N 43 22 05.6E	التربية	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	20
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/9/2018	2017-08-23	2017-08- 13	575,131,000	101+160	450	33 54 33.0N 42 33 04.6E	التربية	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادي هيت/ الانبار	21
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/8/2018	2017-08-27	2017-08- 13	611,635,000	20+170	450	33 24 44.5N 43 18 24.5E	التربية	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	22
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-20	2017-08- 13	669,928,000	114+180	450	33 42 17.7N 43 55 18.8E	التربية	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	23
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-27	2017-08- 13	672,513,500	145+160	450	33 23 02.4N 43 51 59.1E	التربية	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	24
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-09-07	2017-09-06	2017-08- 14	577,451,000	20+165	450	33 24 04.0N 43 19 58.1E	التربية	ثانوية الرشيدية للبنين12 صف /الرمادي/ الانبار	25
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/4/2018	2017-09-06	2017-08- 15	573,900,500	71+170	1 450	33 25 54.3N 43 12 40.1E	التربية	مدرسة جنة الماوى الابتدانية للبنين12 صف /الرمادي/ الانبار	1 16
انجاز العمل	0%	100%	100%	30/1/2018	2017-08-23	2017-08- 23	667,409,500	180	450	33 38 16.8N 42 49 34.1E	التربية	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	27
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-11	2017-08- 24	1,195,056,00 0	162+180	650	33 24 02.3N 43 42 05.6E	التربية	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الإنبار	1 72
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-11-19	2017-11- 07	7,038,189,00 0	25+570	10,000,000	33° 26.057'N 43° 15.928'E	موارد مائية	مشروع ناظم الورار	29
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-11-19	2017-11- 07	6,911,239,00 0	25+570	10,000,000	33° 26.444'N 43° 16.138'E	موارد مانية	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	30
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-12-17	2017-12- 07	1,983,315,00 0	180	200000		طرق وجسور	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	31
							36,832,023,8 00		20,213,800			المجموع	

				2017	الخاصة /	/ البرامج	نة الفيدرالية	الانبار للمواز	يع محافظة ا	مشار			
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ : الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع (دينار)	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	ت المشروع
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-03-01	2017-08-21	2017-07-30	312,200,000	285,000,000	145	400,000	33 25 36.6N 42 58 36.1E	طرق و <b>ج</b> سور	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- 1 هيت/ الرمادي/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/1/2018	2017-08-29	2017-08-02	242,575,000	220,575,000	180	100,000	33 24 46.0N 43 12 51.0E	البلديات	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-02	2017-10-29	2017-10-15	229,851,000	211,829,000	80	500.00		التعليم العالي	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/2/2018	2017-10-29	2017-10-17	920,790,000	877,170,000	25+90			موارد مانية موارد مانية موارد مانية	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	\	تنفيذ امانة	99,750,000	99,750,000		150,000		دوانر حكومية	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	١	تنفيذ امانة	100,000,000	100,000,000		12000		ماء	8 مجمع ماء الحميدية
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	\	تنفيذ امانة	36,800,000	36,800,000		10000		ماء	
انجاز العمل	0%	100%	100%	17/4/2018	2017-10-30	2017-10-18	396,779,980	361,000,000	25+90	200,000		كهرباء	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحضرة 33/11 كي في سعة 2*31.5 ام في أي/ هيت/الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-11-05	2017-10-22	2,250,940,000	2,123,020,000	60+140	100,000		البلدية	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع 11 الفرسان في الرمادي/ الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-06	2017-11-06	2017-10-22	1,037,349,000	967,828,000	25+140	100,000		البلدية	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى 12 تقاطع شارع (20) الرمادي/الانبار

انجاز العمل	0%	100%	100%	14/4/2018	2017-11-14	2017-10-22	507,653,000	472,473,000	25+140	150,000	<u> </u>	13 تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل 33/11 كي في /هيت/الانبار
سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة			0%		2017-11-14	2017-10-25	2,710,350,000	2,710,350,000	140	1,500,000	ئهرباء	12 إعادة تاهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في اعموم محافظة الإنبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05- 07	2017-11-06	2017-10-26	410,812,000	373,752,000	70+170	200,000	ليلديات	15 البلدي الثّاني/الرمادي/الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/5/2018	2017-11-19	2017-10-30	1,052,385,000	974,585,000	25+150	250,000	لداخلية	اعادة انشاء مديرية شرطة 17 نموذجية في قضاء الفلوجة
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/6/2018	2017-11-14	2017-11-12	1,081,365,125	983,270,000	30+120	100,000	لبلدية	الشارع الرابط بين تقاطع شارع 18 عشرين الى شارع الملعب
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/12/201 7	2017-11-23	2017-11-14	211,900,000	194,400,000	30	75,000	<b>ىلرق</b> رچسور	
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04- 07		2017-12-04	391,961,300	360,895,000	25+75	8,000	لتعليم لعالي	تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي 20 في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار
				<i>J.</i>							لتعليم لعالي	تأهيل بناية القاعات الدراسية في 21 كلية الزراعة / جامعة الانبار
							11,993,461,405	11,352,697,000		3,355,500		المجموع



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار







مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

56 اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة اثناء العمل)















مدرسة جنة المأوى / الرمادي / الانبار





تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/ الرمادي/ الانبار







58

مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرمادي / الانبار



مدرسة الصمد/هيت/الانبار



مدرسة المأمون/الرمادي/الانبار



إعادة تاهيل مستشفى هيت العام



60

ثانوية الشيماء للبنات / الانبار



إعادة تاهيل جسر هيت







العبارة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)



هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار





62

هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار





إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار





هيت / الانبار تجهيز و ونصب محطة المشتل 33/11 كي في /



## مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

					,		1 2 3	* 55				_^_		
أسباب الانحراف	نسبة الإنحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الإنجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع (دينار)	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	ت
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-08	2017-08-05	2017-07-25	729,733,400	716,944,000	92+180	I 45N	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	التربية	درسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	1
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-28	2017-07-30	1,194,869,900	1,119,644,000	120+17 0	1 700	34 26 18.0N 43 40 35.5E	التربية	انوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	2 ٿ
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-07-03	2017-08-21	2017-08-03	339,733,500	330,000,000	12+120	1 755	34 27 42.8N 43 50 31.3E	التربية	درسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	<b>3</b>
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-22	2017-08-13	303,645,000	303,645,000	33+180	250	34 26 42.9N 43 44 05.2E	التربية	درسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	4
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-28	2017-08-13	417,595,000	417,595,000	96+180	350	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	التربية	وضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	5
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/7/2018	2017-09-11	2017-08-24	506,420,100	469,258,000	95+180	140	34 18 23.4N 43 46 59.1E	التربية	درسة الاشاوس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	6
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-12-09	2017-10-04	2017-09-25	484,140,000	484,140,000	10+150		34 27 36N 43 48 34E	التعليم العالي	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	7
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-10	2017-09-26	1,083,067,000	994,050,000	80+150	25,000	37 68 92N 42 77 17 E	البلديات	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية ـ صلاح الدين	8
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-12-20	2017-12-11	730,462,000	754,370,000	78+240	4,000	34° 40.717'N 43° 38.914'E	التعليم العالي	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	9
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز		2017-12-14	144,600,000	144,600,000	20	50,000		كهرباء	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز		2017-12-14	939,000,000	939,000,000	30	25,000		كهرياء	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	10
							6,873,265,900	6,673,246,000		109,145			المجموع	

#### مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017 الكلفة الكلية بعد نسبة الإنجاز نسبة الإنجاز اضافة اوامر مدة المشروع نسبة الانحراف تاريخ المباشرة | تاريخ الانجاز كلفة المشروع تاريخ العقد القطاع المشروع أسباب الانحراف GPS ت المخطط المستفيدين الغيار ناهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م3/ساعة/ الشرقاط 35 63 864N 1 43 24 181E انجاز العمل 0% 100% 100% 17/12/2017 2017-08-06 2017-07-25 257900000 257900000 120 27.000 تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م3/ساعة/بيجي/ صلاح 34 85 308N ماء 2 43 54 104E 34 28 12N كساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين منجز 43 47 38.16E نجاز العمل البلديات 100% 2017-09-26 10.000 3 0% 100% 2017-09-17 435,000,000 435,000,000 80 انجاز العمل 21 49 34 .27N 26 76 الداخلية تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين 16/1/2018 2017-10-01 2017-09-17 324,387,000 40.000 4 0% 100% 100% 307,000,000 10+90 43 47E تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات 3.21 34 37N 2017-09-25 الداخلية انضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين 5 انجاز العمل 0 100% 100% 20/12/2017 2017-10-05 455.595.000 455.595.000 85 30.000 23.44 43 40E 34 35 159N تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ البلديات 6 43 40 425E انجاز العمل 100% 100% 26/3/2018 2017-10-02 2017-09-25 20+80 150,000 0% 767,215,000 762,737,000 عادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية 37 68 92N البلديات 7 بطول 680 م/ تكريت اصلاح الدين 42 77 17 E 43 40 58.16E 34 34 البلديات 8 47.29N ناهیل مبنی مختبر صلاح الدین الانشائی/ تکریت اصلاح الدین تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تكريت إصلاح الدين 43 41 01.95E 34 35 البلديات 9 11.93N 43 41 02.27E 84 34 35 انجاز العمل 0% 100% 100% 15/6/2018 2017-10-17 2017-10-03 872.881.000 872.881.000 180.000 البلديات 10 13.79N ناهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين 43 44 11.1E 34 23 البلديات تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال 11 لإرهابية/سامراء/صلاح الدين 39.25N 43 41 01.15E 34 35 البلديات 12 00.27N ناهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين ناطق متفرقة ماء تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء 1,173,000,000 1,173,000,000 13 انجاز العمل منجز 0% 100% 100% 2017-11-26 90 80,000 جهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع ناطق متفرقة البلديات 561,000,000 561,000,000 14 جهيز غواطس عدد / 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية منجز ماء 15 انجاز العمل 0% 100% 100% 30/1/2018 2017-12-04 95.450.000 95.450.000 30 75.000 تجهيز غواطس نهرية ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ منجز انجاز العمل 0% 100% 100% 22/2/2018 2017-12-10 187,250,000 187.250.000 45 50.000 ماء الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى 16 تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلى انجاز العمل 0% 100% 100% منجز 2017-12-14 75,300,000 75,300,000 20 50,000 كهرباء 17 جهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي انجاز العمل منجز 2017-12-14 30 0% 100% 100% 469,500,000 469,500,000 50,000 المجموع 5.652.613.000 742,000 5.674.478.000





مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين





مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين





قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين





68

إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)



مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين





70

تأهيل مديرية الزراعة / صلاح الدين





تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات \ المعهد الفني / الدور / صلاح الدين





إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين







محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين



2017	ارية / ا	ة الاستث	/ الخطأ	فيدرالية	للموازنة ال	ة كركوك	يع محافظ	مشار

أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الإنجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع	مدة المشروع	اعداد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	Ú
انجاز العمل	0%	100%	100%	29/1/2018	2017-08-03	2017-07-23	306,926,000	306,926,000	165		35 14.653N 44 16.121E	التربية	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدانية 6 صف/كركوك	
انجاز العمل	0%	100%	100%	27/3/2018	2017-08-03	2017-07-23	309,656,000	306,926,000	165	180	35 13.101N 44 16 .902E	التربية	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	
							616,582,000	613,852,000		360			المجموع	

# مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع (دينار)	مدة المشروع	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	Ú
انجاز العمل	0%	100%	100%	31/8/2018	2017-08-10	2017-07-31	153,734,000	153,734,000	30	5,200	35 27 .117N 44 11 .325E	كهرياء	إعادة تاهيل الشبكات الكهربانية إعادة تاهيل الشبكات الكهربانية في قرى ملا عبدالله وادريس خباز وادريس خزعل والهندية 1,2/كركوك	
انجاز العمل	0%	100%	100%	14/11/2017	2017-08-03	2017-07-31	71,281,000	71,281,000	85	3 200	35 24 .107N 44 21.151E	ماء	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م3/ساعة في قرية قرتبة- ناحية يابجي/كركوك	3
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/9/2017	2017-08-03	2017-08-03	189,340,000	189,340,000	55	4,000	35 14 .511N 44 16.217E	البلديات البلديات	صيانة طريق الشمسية/كركوك تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة الوقف الشيعي في قصر البشير )/ كركوك	5
انجاز العمل	0%	100%	100%			2017-12-14	1,689,000,000	1,689,000,000	30	250,000		كهرباء	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	6
انجاز العمل	0%	100%	100%	15/1/2018		تنفيذ امانة	55,600,000	55,600,000		20,000		ماء	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	7
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/12/2017		تنفيذ امانة	63,200,000	63,200,000		75,000		طرق وجسور	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	8
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/12/2017		تنفيذ امانة	69,600,000	69,600,000		12,500		ماء	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي/ الحويجة	
							2,291,755,000	2,291,755,000		370,500			المجموع	





إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد







إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك







إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك





إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك




نحراف أسياب الانحراف	مشاريع محافظة ديالي للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017  عدد مدة المشروع عدد المشروع عدد المستفيدين المستفيدين المستفيدين الاضافية المشروع المستفيدين الاضافية المشروع المنطط الفعلية المستفيدين الاضافية المشروع المنطط الفعلية المشروع المنطط المنطط الفعلية المشروع المنطط الفعلية المشروع المنطط الفعلية المشروع المنطط المنط														
	نسبة الانحر	الإنجاز	الإنجاز	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد		كلفة المشروع	(يوم)+المدة		GPS	القطاع	المشروع	ن	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%		2017-09-26	2017-07-23	745,105,400	752,704,000	107+180	720	34.273507 N 44. 542155E	لتربية	مدرسة المامون /12 صف/ العظيم/الخالص/ديالي	1	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	2019-02-18	2017-09-24	2017-07-25	505,058,200	461,667,000	168+63	600	34 03 44.1N 44 59 00.6E	لتربية	مدرسة الهديل /9 صف/الصدور/المقدادية/ديالي	2	
تم فسخ العقد رضانياً مع المقاول	0%	0%	0%				775,658,000	775,658,000	160	600	34 01 30N 4 57 32.1E	لتربية 4	مدرسة ابن زيدون	3	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-04	2017-11-29	2017-11-12	449,000,000	449,000,000	120	2,200	34 01 41.7N 44 45 17.4E	الطرق	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول ( 6كم )		
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	13/3/2018	2017-12-25	2017-11-13	390,420,000	390,420,000	60	3800		الطرق	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	5	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	17/1/2018	2017-12-04	2017-11-13	116,040,000	116,040,000	45	2,500	34 11 18.24N 07 08.5E	الطرق	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	6	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	28/3/2018	2017-12-13	2017-11-13	348,860,000	348,860,000	60	10,000		الطرق	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم)	7	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	20/3/2018	2018-01-02	2017-11-13	259,563,500	259,563,500	90	200000	34 15 41.59N 45 9 29.47E	الطرق	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاء الرئيسي	8	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-08-02	2017-11-19	2017-11-07	168,750,000	168,750,000	90	2000		الطرق	فرش خابط بطول ( 12كم ) من جسر شاقراق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود		
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	25/3/2018	2017-12-06	2017-11-22	375,373,250	375,373,250	40	8000		الطرق	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	10	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	24/6/2018	2017-11-19	2017-11-13	559,484,000	559,485,000	12+180	10000	34 04 13 N 44 88 08E	الطرق	تبليط شوارع في  قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالي	11	
انجاز العمل	0%	100%	100%	2019-02-07	20/6/2018	2018-05-06	195,720,000	195,720,000	100	4500	46 82 27.411E 3 32 93 2.28N	نطرق	تاهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	12	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	29/7/2018	21/6/2018	2018-07-06	111,220,000	111,220,000	45			لكهرباء	مشروع تاهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوية/ديالى	13	
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	31/10/2018	2018-04-07	20/6/2018	921,260,000	921,260,000	120	8000	33 40 39.7N 01 36.3E	لطرق 5!	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبة بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى		
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-03-10	19/7/2018	25/6/2018	227,020,000	227,020,000	75	1000	33 39 19N 44 37 35.7E	الطرق	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالي		
0 انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-09-08	19/7/2018	25/6/2018	185,040,000	185,040,000	30	2500	33 56 6 87N 44 54 89 57E	الطرق	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلى الهادي والشيماء)/ديالى	16	
					70		6,333,572,350	6,297,780,750		256420			المجموع		


### مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع (دينار)	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	ß
											34 03 46 N 44 58 35 E	ماء	تاهیل مجمع ماء سوید وزحام والعالی وبسعة 200 م3/ ساعة/المقدادیة/ دیالی	1
انجاز العمل	0%	100%	100%	26/10/2017	2017-08-27	2017-07-20	385,400,000	385,400,000	60		34 02 79.1N 44 58 54.3E	ماء	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م3 / ساعة /المقدادية /ديالي	2
											33 48 06 N 44 44 09 E	ماء	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م3 / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	, a
انجاز العمل	0%	100%	100%	18/10/2018	2017-09-14	2017-07-31	106,750,000	106,750,000	35	35,000	30 11 23.01N 45 07 13.63E	البلديات	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	4
							492,150,000	492,150,000		48,500			المجموع	



تبليط شوارع / قرية علي الهادي / خان بني سعد / ديالى

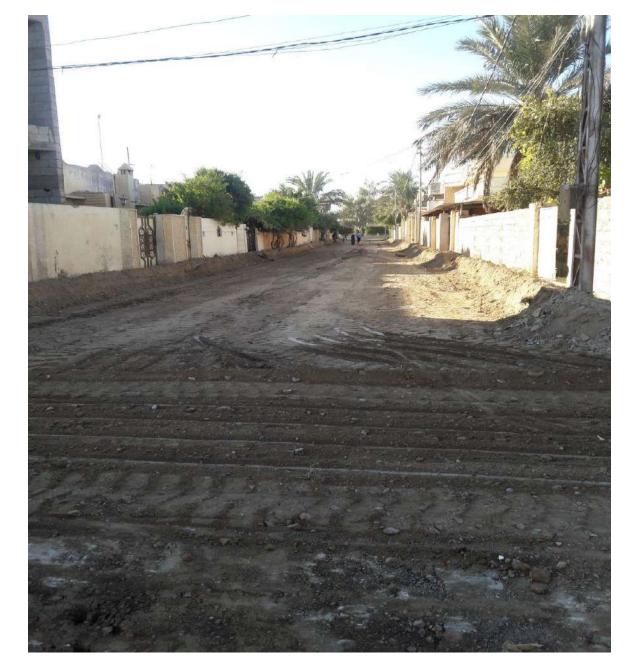


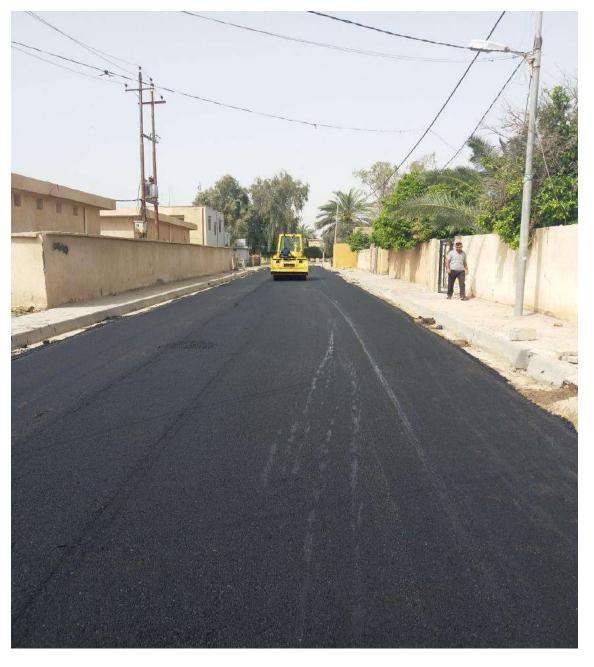

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





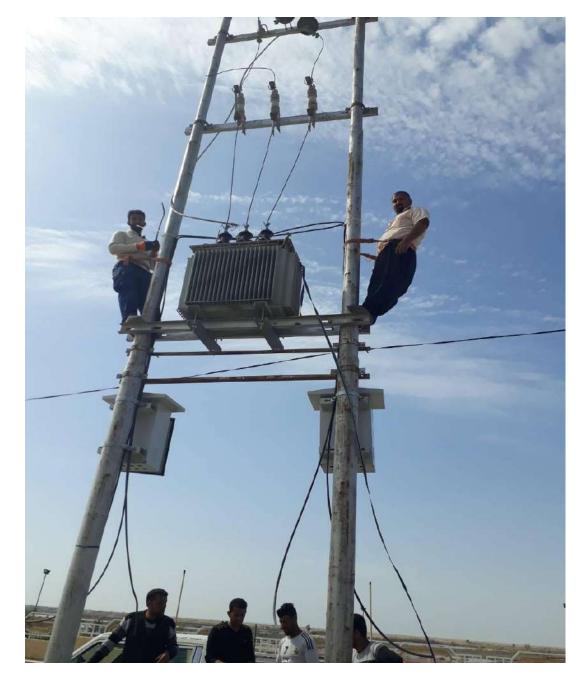

8

إعادة تأهيل الشارع العام الرئيسي / جلولاء / ديالي





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى





مدرسة المأمون / ديالى




	مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017														
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	ت	
تم فسخ العقد رضانياً مع المقاول	0%	0%	0%		26/11/2018	21-11-2017	819,788,000	819,788,000	150	11,568		كهرياء	جهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 ي.في) في قطاع المسيب / بابل	ب 1 م	
							819,788,000	819,788,000					المجموع	工	
مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية /البرامج الخاصة / 2017															
أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	كلفة المشروع	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	ت	
انجاز العمل	0%	100%	100%	09-05-2017	13-08-2017	13-08-2017	287,125,000	287,125,000	40	12,500	43 22 34 X 36 27 763 Y	طرق وجسور	سيانة طريق الحامية - صنيديج بطول ,3 كم جرف النصر الشمال بابل	5 1	
											32 46 32.1N 44 15 48.3E	ماء	د واستيدال شبكة ماء متفرقة في حي مواطنين والحي العسكري/جرف نصر/شمال بابل	네 2	
انجاز العمل	0%	100%	100%	10-04-2017	14-08-2017	13-08-2017	298,620,000	298,620,000	50	18,000	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E	ماء	د واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف نصر/شمال بابل	مد 3 الن	
المناز المناز	070	100%	100/0	10-04-2017	14-00-2017	13-00-2017	235,020,000	230,020,000	30	18,000	33 00 53.5N 44 09 56.1 E	ماء	د واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 الفاضلية 1) اجرف النصر اشمال بابل	مد (ا)	
											33 00 49.6N 44 08 36 E	ماء	د واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 الفاضلية 2) اجرف النصر الشمال بابل	مد ا(ا)	
انجاز العمل	0%	100%	100%	18/1/2018	19-11-2017	16-11-2017	558,539,520	558,560,000	60	15,000	43 46 70X 36 33 44 6Y	طرق وجسور	عون 16 حيو	ص 6 ابط	
							1,144,284,520	1,144,305,000		45,500			المجموع	1	





استبدال شبكة الماء / شمال بابل

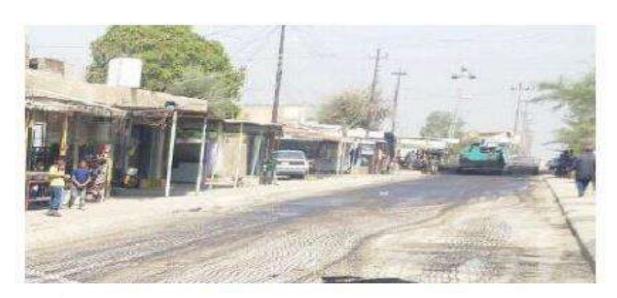



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل







تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم



#### مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدارلية / الخطة الاستثمارية / 2017 مدة كلفة المشروع نسبة الإنجاز نسبة الإنجاز الكلفة الكلية بعد أسياب نسبة المشروع عدد المستفيدين تاريخ الانجاز تاريخ العقد تاريخ المباشرة القطاع المشروع **GPS** اضافة اوامر الغيار الانحراف الفعلبة المخطط (دینار) الانحراف (يوم) مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 33 195 557N التربية انجاز العمل 24/6/2018 100% 59+70 0% 100% 11-09-2017 23-07-2017 380,255,000 349,240,000 360 43 968 712E مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف/لناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 170124+17 33 213 317N انجاز العمل 87% 100% 100% 08-05-2018 11-09-2017 26-07-2017 513,436,400 479,647,000 600 43 892 967 E مدرسة إبراهيم طوقان الابتدائية 9 صف/اناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 33 209 976N التربية انجاز العمل 0% 100% 100% 19/8/2018 30-07-2017 440,344,000 400,366,000 51+175 600 11-09-2017 43 930 087E مدرسة عزالدين القسام الابتدائية 18 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 33 216 750 N التربية انجاز العمل 0% 100% 100% 17/9/2018 11-09-2017 30-07-2017 815,204,000 827,057,000 105+200 900 43 879 541 E مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف/اناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 33 216 750 N التربية انجاز العمل 19/8/2018 0% 30-07-2017 100% 100% 11-09-2017 437,960,200 398,228,000 111+180 600 43 879 541 E مدرسة الزخرف 9 صف/لناحية النصر والسلام/أبو غريب/يغداد 33 219 497 N التربية انجاز العمل 0% 100% 100% 19/8/2018 11-09-2017 02-08-2017 1,073,136,960 1,024,768,500 126+190 600 43 911 557E مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف/إناحية 33 394 093N التربية انجاز العمل 0% 100% 15/7/2018 03-08-2017 600 100% 11-09-2017 466,368,600 425,137,000 124+180 النصر والسلام/أبو غريب/بغداد 44 037 368E الموارد تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في انجاز العمل 0% 100% 100% 14/8/2018 20-11-2017 07-11-2017 899,346,750 830,278,500 100+120 2,000,000 كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الآخرى. المجموع 5,026,051,910 4,734,722,000 2,004,260

# مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

أسباب الانحراف	نسبة الانحراف	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط	تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	تاريخ العقد	كلفة المشروع (دينار)	مدة المشروع (يوم)	عدد المستفيدين	GPS	القطاع	المشروع	ت
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	24-08-2017	13-08-2017	438,843,370	50	2000		كهرياء	جهيز وتنفيذ ونصب شبكات هرباء في ناحية النصر السلام/ أبو غريب/حزام	1  ک
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	قيد التنفيذ	18-10-2017	255,600,000	15	15000		كهرياء	اهیل شبکات کهرباء (تجهیز حولات) اُبو غریب/حزام بغداد	
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	تنفيذ امانة		88,225,000	30	25000		الطرق والجسور	شاء جسر عودة الشكر في رفوش	3 IL
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	تنفيذ امانة		284,350,000		10,000		ماء	اهيل محطات ماء (السعدان, فهيتاويين, فزع شنيتر)	
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	20-11-2017		100,000,000				دوانر حكومية	طوير موقع الصندوق	<u>ນ</u> 5
							1,167,018,370		52000			المجموع	







جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد





إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد





93

مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية / بغداد / حزام بغداد



(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)





94

(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

# مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2018



# الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


			<u>'</u>							
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,038,672,000	2018/11/27	180	13/11/2018	12	100%	منجز	الصحة	تلعفر	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	1
830,406,000	2018/11/27	180	18/11/2018	16	100%	منجز	الطرق والجسور	القيارة	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول 65م	2
553,100,000	2019/01/14	200	31/12/2018	140	100%	منجز	التعليم العالي	الموصل	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	3
589,560,000	2018/12/03	150	29/11/2018	28	100%	منجز	شبكة الاعلام العراقي	الموصل	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتنلفزيوني / الفيصلية	4
2,254,676,800	2018/12/18	240	4/12/2018	35	100%	منجز	التجارة	الموصل	اعادة تاهيل سقانف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	5
509,927,000	2019/01/02	220	19/12/2018	111	100%	منجز	التعليم العالي	الموصل	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	6
1,501,358,000	1/1/2019	240	18/12/2018	99	100%	منجز	الطرق والجسور	الحضر	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	7
1,961,520,000	2019/01/10	550	30/12/2018	132	59%	قيد التنفيذ	الداخلية	الموصل	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	8
1,537,540,000	2018/12/18	200	4/12/2018	41	100%	منجز	التعليم العالي	الموصل	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	9
579,291,200	2018/12/13	240	5/12/2018	44	100%	منجز	التربية	حمام العليل	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 12 صف	10
579,291,200	2018/12/13	240	5/12/2018	51	100%	منجز	التربية	تلكيف	هدم واعادة بناء ثانوية فلفيل 12 صف	11
579,291,200	2018/12/13	240	5/12/2018	45	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12صف	12

579,291,200	2018-12-16	240	4/12/2018	36	100%	منجز	التربية	الايسىر	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	13
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	76	100%	منجز	التربية	تاعفر	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	14
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	75	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	15
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	74	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	16
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	73	100%	منجز	التربية	الايسىر	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	17
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	88	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	18
511,028,000	2018-12-27	220	26/12/2018	126	100%	منجز	التربية	الايسىر	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	19
2,775,071,200	2019-01-23	450	26/12/2018	125	88%	قيد التنفيذ	التجارة	الموصل	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	20
1,530,000,000	2018-10-23	45	23/10/2018	8	100%	منجز	الكهرياء		تجهيز محولات قدرة 16 MVAمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 11/ 0,4 كف	21
177,500,000		45	23/10/2018	7	100%	منجز			تجهيز محولات توزيع سعة KVA250	22
2,988,297,000	2019-01-12	360	30/12/2018	135	100%	منجز	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	23
3,381,299,000	2018-12-17	360	4/12/2018	39	100%	منجز	الكهرياء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	24
3,281,763,000	2018-12-17	360	4/12/2018	38	100%	منجز	الكهرياء	الموصل	تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	25
382,221,000	2018-11-27	100	30/12/2018	134	100%	منجز	الكهرباء	الأيمن	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	26
188,480,000	2018-06-19	60	5/6/2018	2	100%	منجز	البلديات	سنجار	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	27
30,864,723,800									المجموع	
			!			!			į.	


### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى

كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	تاريخ المباشرة العقدي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,700,000,000		2019-01-02	180	104	100%	منجز	الصحة	الموصل	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	1
2,560,000,000		2019-01-02	180	105	100%	منجز	الصحة	الموصل	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	2
964,375,000		2019-01-02	180	110	100%	منجز	الصحة	عدة اقضية	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد (50)	3
336,068,750	2018-12-27	27/12/2018	160	72	100%	منجز	المجاري	الموصل	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	4
122,870,000	2019-01-26		60	تنفيذ امائة	100%	تنفيذ امانة / منجز	الماء والمجاري	الموصل	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	5
422,670,000	2019-01-02	27/12/2018	150	71	100%	منجز	المجاري	الموصل	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	6
597,820,000	2018-12-18	18/12/2018	180	42	100%	منجز	المجاري	الموصل	تاهيل بناية مخازن مديرية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	7
197,495,000			60	تنفيذ امانة		تنفيذ امانة / الغي - مؤجل للعام القادم	الادارة المحلية	الموصل	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	8
221,525,000	2019-01-03		60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	العلوم والتكنولوجيا	الموصل	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	9
232,313,000	2018-12-19	19/12/2018	100	47	100%	منجز	الزراعة		اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى	10
747 647 600	2010 11 20	27/11/2018	100	13	100%	منجز	التعليم العالي		إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى	11
747,647,600	2018-11-26		180	13	100%	منجز	التعليم العالي		اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية النقنية الزراعية / الموصل	12

322,399,200	2018-12-27	27/12/2018	150	87	100%	منجز	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	5/1/2019	180	114	100%	منجز	رئاسة الوزراء		تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى	14
356 300 600	2040 04 40	2/4/2040	120	101	100%	منجز	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك, الوقاص, النصر) المرحلة الثانية	15
356,390,600	2019-01-10	2/1/2019	120	101	100%	منجز	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	30/12/2018	180	90	100%	منجز	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي	17
598,800,000	2018-12-27	27/12/2018	180	89	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	27/12/2018	100	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2018-12-23	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	45	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة(400,250) kva (400,250) عدد (185)محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2019-01-03	3/1/2019	60	تنفيذ امائة	100%	تنفيذ امائة / منجز	التربية	سنجار	تاهیل ابنیة مدرسیة في قضاء سنجار (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2019-01-21	18/11/2018	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امائة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	









#### تأهيل الأبنية المدرسية لـ (مدرسة اميرة الجنة - الجزيرة -المنتظر)

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع تأهيل الأينية المدرسية وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 75 يوم وقد تم إنجاز العمل 100% الموضوعة في العقد الموضوعة في العقد


















اسم المشروع: سنندستير سننه

الشركة المنقدة: عدسه


لجهة المستغيدة: سددسسسور

مدة التنفيذ الكلية :



قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع تأهيل مدرسة كوجو وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 60 يوم مستمر حالياً علماً ان نسبة الإنجاز الفعلي 100%











صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة










#### إعادة تأهيل مراكز الشرطة وابنية مرور نيتوى

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع إعادة تأهيل مراكز الشرطة وابنية مرور نینوی و هو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 120 يوم ومستمر به العمل حاليا علماً ان نسبة الإنجاز الفعلي 100%















#### تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع معالجة المياه الثقيلة لشقق الخضراء وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 150 يوم ومستمر به العمل حاليا علماً ان نسبة الإنجاز الفعلى 100%





### الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

	_									
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ij
				124	100%	منجز	الصحة	الخالدية	هدم واعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	1
1,150,824,000	8/1/2019	200	26/12/2018	124	100%	منجز	الصحة	الخالدية	هدم واعادة بناء مركز صحي المضيق	2
				124	100%	منجز	الصحة	الخالدية	هدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	3
907,329,600	12/1/2019	180	30/12/2018	136	100%	منجز	الداخلية	راوه	هدم واعادة بناء جنسية راوه	4
907,329,600		180		136	100%	منجز	الداخلية	عنه	هدم واعادة بناء جنسية عنه	5
579,545,000	13/1/2019	150	30/12/2018	138	100%	منجز	الداخلية	القائم	هدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	6
		150		138	100%	منجز	الداخلية		تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي	7
633,920,000	7/1/2019	180	27/12/2018	130	100%	منجز	الطرق والجسور	عنه	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	8
467,200,000	7/1/2019	180	26/12/2018	122	100%	منجز	الطرق والجسور	حديثة	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	9
1,301,888,000	12/1/2019	360	30/12/2018	131	100%	منجز	الطرق والجسور		اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 420متر	10
5,040,706,600									المجموع	

		ر	2018 / الانبا	لية لعام	الفيدرا	ار للموازنة	ر إعادة الاعم	يع صندوق	الخطة التشغيلية لمشار	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
560,392,000	16/12/2018	90	22/11/2018	19	100%	منجز	الماء والمجاري	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	1
				19	100%	منجز	الماء والمجاري	الخالدية	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	2
1,003,847,500	20/12/2018	120	6/12/2018	56	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/البوعلوان /البوراشد )	3
				56	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تأهيل مجمع ماء الاسباني/ الشهداء النعيمية	4
				56	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	5
				56	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200)م3/س	6
130,640,000	2/1/2019	55	5/12/2018	50	100%	منجز	الماء والمجاري	القائم	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	7
125,670,000	19/12/2018	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	الماء والمجاري	هيت	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	8
699,079,000	3/1/2019	90	5/12/2018	52	100%	منجز	الماء والمجاري	حديثة	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	9
				52	100%	منجز	الماء والمجاري	حديثة	تاهيل مشروع ماء حديثة ـ حقلانية الموحد	10
				52	100%	منجز	الماء والمجاري	حديثة	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	11
743,927,500	24/12/2018	150	11/12/2018	62	100%	منجز	الماء والمجاري	الرمادي	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	12
560,939,200		80	29/11/2018	29	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	13
	24/12/2018			29	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	14
				29	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	15
197,212,000	14/12/2018	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	الماء والمجاري	الرطبة	أنشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	16
529,287,500	5/1/2019	180	18/12/2018	100	100%	منجز	الكهرباء	حديثة	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	17
202,198,000	23/12/2018	150	29/11/2018	30	100%	منجز	الكهرباء	الخالدية	تأهيل الشبكة الكهربانية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	18
				30	100%	منجز	الكهرباء	الخالدية	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	19
248,715,000	26/12/2018	60			100%	منجز	الكهرباء	الرطبة	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	20

							1		·	
794,233,500	17/12/2018	120	5/12/2018	46	100%	منجز	الكهرياء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	21
22,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / قائمقامية القائم	22
28,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرياء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / تربية القائم	23
407,976,000	11/12/2018	150	2/12/2018	33	100%	منجز	الطرق والجسور	البغدادي	اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	24
202,400,000	20/12/2018	90	11/12/2018	61	100%	منجز	الطرق والجسور	الفلوجة	أعادة أعمار جسر الجغيفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	25
607,416,000	9/12/2018	120	27/11/2018	25	100%	منجز	التجارة	الرمادي	ترميم وصيانة مخازن عدد /6 في سايلو الرمادي	26
573,888,800	2/1/2019	180	20/12/2018	112	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة الدعاء/12 صف	27
552,765,000	28/12/2018	160	16/12/2018	91	100%	منجز	التربية والتعليم	عنه	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	28
581,613,500	16/12/2018	180	4/12/2018	40	100%	منجز	التربية والتعليم	الكرمة	هدم واعادة بناء مدرسة الفداء /12 صف	29
1,190,436,000	10/1/2019	180	20/12/2018	113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 12 صف	30
				113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو البجادين للبنين 12 صف	31
1,190,436,000	2/1/2019	180	19/12/2018	109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 12 صف	32
				109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 12 صف	33
694,910,500	27/12/2018	90	13/12/2018	69	100%	منجز	التربية والتعليم	الفلوجة	تأهيل الشفق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	34
				69	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	تأهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	35
447,038,400	3/1/2019	180	11/12/2018	66	100%	منجز	التربية والتعليم	الصقلاوية	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلاوية	36
858,323,200	27/12/2018	180	13/12/2018	85	100%	منجز	الداخلية	الرمادي	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	37
691,500,000	30/1/2019	45	23/12/2018	116	100%	منجز	الكهرياء		تجهيز محولات كهرباء	38
91,690,000	26/12/2018	60			100%	منجز	الصحة	القائم	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام	39
142,770,000	23/12/2018	60			100%	منجز	الكهرباء	راوه	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	40
		60			100%	منجز	الكهرباء	هيت	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	41
14,079,304,600			108						المجموع	



### الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين نسبة الإنجاز الفني مدة العقد ا حالة المشروع رقم العقد كلفة العقد الأصلى تاريخ المباشرة الفعلى تاريخ العقد القطاع الناحية او القضاء اسم المشروع ت الشر قاط اعادة تاهيل جسر الشرقاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين 2018-12-12 360 21/11/2018 17 100% منجز الطرق والجسور 3,948,780,000 1 منجز التربية هدم وإعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات 12 صف 610,965,000 180 5/12/2018 بلد 2019-01-15 54 100% 2 هدم وإعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12صف منجز التربية 2019-01-15 180 4/12/2018 3 528,360,000 100% منجز التربية تکریت هدم وإعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنبن 12 صف 12/12/2018 607,200,000 2018-12-25 180 67 100% 4 هدم واعادة بناء ثانوية الاريج للبنات 12صف منجز التربية 573,400,000 2019-01-20 180 4/12/2018 37 100% بيجي 5 اعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء الطرق والجسور 579,632,000 2018-12-08 150 22/11/2018 20 100% منجز بيجي 6 بيجى في محافظة صلاح الدين هدم واعادة بناء ثانوية بيجى للبنات 18 صف التربية 980,658,750 2019-01-20 180 13/12/2018 80 100% منجز 7 بيجي 11/12/2018 منجز التربية يثرب هدم واعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف 2019-01-14 180 8 980,788,500 64 100% المجموع 8,809,784,250

#### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين نسبة الإنجاز الفنى مدة العقد حالة المشروع تاريخ المباشرة الفعلى رقم العقد القطاع كلفة العقد الأصلى تاريخ العقد الناحية او القضاء اسم المشروع ت الصحة الشر قاط توسعة مركز صحى في الساحل الأيسر/ قضاء الشرقاط منجز 284,192,000 2018-12-18 150 5/12/2018 55 100% 1 467,699,000 120 19/12/2018 منجز البلدية سليمان بيك هدم و اعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك 2019-01-02 103 100% 2 البلدية أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء 120 5/12/2018 منجز سامراء 3 548,060,000 2018-12-23 49 100% منجز البلدية يثرب هدم و اعادة بناء مديرية بلدية بترب 400,092,000 2018-12-24 160 11/12/2018 65 100% 4 منجز الداخلية سليمان بيك هدم و أعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك 2018-12-27 180 11/12/2018 58 100% 5 563,272,900 هدم و أعادة بناء مديرية شرطة يترب منجز الداخلية يثرب 834,784,000 180 2/12/2018 100% 6 2018-12-20 الداخلية 22/11/2018 منجز المعتصم هدم و أعادة بناء مركز شرطة المعتصم 2018-12-16 180 18 7 591,548,000 100% الداخلية دحلة هدم و أعادة بناء مركز شرطة دجلة منجز 589,857,500 2018-12-24 180 27/11/2018 23 100% 8 أعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ +16) كم و المحطة ( منجز 2018-12-26 150 13/12/2018 77 100% الطرق والجسور 9 457,400,000 بيجي 17+115) كم على طريق تكريت - بيجي منجز الكهرباء تكريت تاهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / Α - Α جامعة تكريت 140 19/12/2018 1,017,611,200 2019-01-03 106 100% 10 المجموع 5,754,516,600



			ركوك	2018 / ک	يدرالية لعام	ق إعادة الاعمار للموازنة الف	ية لمشاريع صندو	لخطة الاستثمار		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ß
557,435,000	2018-11-19	210	18/11/2018	15	100%	منجز	التربية	الحويجة	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12صف في قضاء الحويجة	1
467,952,500	2018-12-09	160	26/11/2018	22	100%	منجز	الكهرباء	الحويجة	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبدالله	2
1,249,294,000	2018-12-06	360	26/11/2018	21	100%	منجز	الطرق والجسور		اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك -تكريت)	3
391,990,000	2018-12-09	180	27/11/2018	26	100%	منجز	الطرق والجسور		صيانة جسور باي حسن	4
864,570,000	2018-12-30	150	19/12/2018	108	88%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الحويجة	اعادة اعماربنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	5
362,528,000	2019-01-03	150	23/12/2018	115	100%	منجز	وزارة العدل	الرياض	اعادة ترميم محكمة بداءة الرياض	6
380,882,400	2019-05-19	150	23/12/2018	121	100%	منجز	الداخلية	الزاب	اعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	7
401,301,000	2018-12-27	240	13/12/2018	84	100%	منجز	التربية	الحويجة	اعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	8
706,112,001	2018-12-30	180	16/12/2018	92	100%	منجز	الماء	الحويجة	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400) م3/ساعة – قضاء الحويجة	9
264,000,000	2018-12-30	150	18/12/2018	98	100%	منجز	الماء	العباسي	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	10
557,408,000	2018-12-27	300	13/12/2018	82	100%	منجز	التربية	داقوق	هدم واعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في داقوق	11
557,410,000	2018-12-31	300	17/12/2018	96	100%	منجز	التربية	الحويجة	هدم واعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	12
325,332,000	2018-12-31	200	17/12/2018	95	100%	منجز	التربية	الملتقى	هدم واعادة بناء مدرسة البوبتير 6 صف في ناحية الملتقى	13
	2018-12-31			95	100%	منجز	التربية	الحويجة	هدم واعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	14
280,000,000	10/1/2019	60	31/12/2018	143	100%	منجز	الطرق والجسور	الملتقى	صيانة الشارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	15
286,350,000	2019-01-08	60	27/12/2018	128	100%	منجز	الطرق والجسور	الرياض	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	16
7,652,564,901									المجموع	

#### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك مدة العقد / نسبة كلفة العقد الأصلى تاريخ المباشرة الفعلى رقم العقد حالة المشروع الناحية او القضاء تاريخ العقد القطاع اسم المشروع ت الإنجاز الفنى تنفيذ امانة منجز / تنفيذ امانة تبديل رمل و حصى للفلاتر لمشروع ماء الحويجة الحديث الحوبجة 162,250,000 27/12/2018 60 100% الماء 1 تنفيذ امانة منجز / تنفيذ امانة الحويجة 100% الماء تاهيل مجمع ماء جديدة السادة 2 قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1-تأخر تحريات التربة 2- شدة الداخلية هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدنى في قضاء الحويجة 535,403,200 30/12/2018 180 16/12/2018 93 93% الحويجة 3 الامطار 3- امر غيار 4- تلكؤ منجز الحويجة تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة/ الحويجة 368,000,004 31/12/2018 50 17/12/2018 94 100% الماء الداخلية هدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض 11 100% منجز الرياض 18/11/2018 180 4/11/2018 5 380,882,400 الداخلية الربثياد هدم وإعادة بناء مركز شرطة الرشاد 100% 380,882,400 16/12/2018 180 4/11/2018 10 منجز 6 تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة / كركوك 31/1/2019 31/12/2018 منجز الماء 7 60 142 100% 748,500,000 البلدية هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجارى ناحية الرياض 26/12/2018 150 13/12/2018 100% الرياض 81 8 منجز 344,502,400 البلدية الحويجة هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجارى ناحية الزاب 26/12/2018 150 13/12/2018 100% 81 9 الحويجة تاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة التجارة 576,140,000 26/12/2018 183 13/12/2018 منجز 78 100% 10 تاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض 78 100% منجز التجارة الرياض 11 لم ينفذ / تم تحويله الى خطة تنفيذ امانة الطرق والجسور رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحديثة 70,800,000 25 12 عام 2019 المجموع 3,567,360,404



		الی	عام 2018 / دیـ	درالية ك	نة الفي	عمار للمواز	وق إعادة الا	لمشاريع صند	الخطة الاستثمارية	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,009,317,500	21/11/2018	90	14/11/2018	14	100%	منجز	الطرق والجسور	الخالص	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	1
631,352,500	28/1/2019	60	11/12/2018	60	100%	منجز	الكهرباء	العظيم	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهرباء في ناحية العظيم	2
908,000,000	2/1/2019	120	18/12/2018	97	100%	منجز	الطرق والجسور		صيانة واكساء وتثبيت اكتاف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم	3
540,411,500	4/2/2019	180	26/12/2018	123	100%	منجز	التربية	جلولاء	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليقطين 12 صف في جلولاء	4
404,240,000	8/1/2019	120	23/12/2018	119	100%	منجز	الطرق والجسور	بعقوبة	اعادة تاهيل طريق قرية الجيل بطول 4كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	5
308,040,000	23/1/2019	90	23/12/2018	120	100%	منجز	الطرق والجسور	الخالص	اعادة تأهيل طرق ( الزركانية - العودة - سفيط - دراويش ) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (2+100)	6
518,640,000	14/1/2019	100	31/12/2018	139	100%	منجز	الطرق والجسور	بهرز	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجيل الصاعد بطول 6كم من المحطة (صفر+صفر)الى (6+صفر) /ناحية بهرز	7
709,840,000	13/1/2019	120	30/12/2018	137	100%	منجز	الطرق والجسور		إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها	8
426,670,000	17/1/2019	180	30/12/2018	133	100%	منجز	التربية	السعدية	هدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	9
921,260,000	3/7/2018	120	20/6/2018	4	100%	منجز	الطرق	بلدروز	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز ( قرية عتبة 7.5 كم وقرية طعيمات 1.5 كم	10
320,000,000	25/11/2018	60	28/10/2018	9	100%	منجز	الطرق		اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قرة تبة و قصبتها القديمة	11
227,020,000	19/7/2018	75	25/6/2018	5	100%	منجز	الطرق	بعقوبة	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	12
185,040,000	19/7/2018	30	25/6/2018	6	100%	منجز	الطرق	بعقوبة	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبه / ربيع عطشانه / وعلي الهادي والشيماء	13
195,720,000	20/6/2018	100	5/6/2018	1	100%	منجز	الطرق	بعقوبة	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع مابين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	14
96,184,000	13/1/2019	75	5/12/2018	53	100%	منجز	الطرق	السلام	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	15
111,220,000	21/6/2018	45	7/6/2018	3	100%	منجز	الكهرباء	بعقوبة	تأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	16
7,512,955,500									المجموع	

		يالى	ام 2018 / د	الية لع	نة الفيدر	الاعمار للمواز	وق إعادة	شاريع صند	الخطة التشغيلية لم	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة الْعقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ប្
448,757,500	28/1/2019	90	27/12/2018	129	100%	منجز	البلدية	بلدروز	تبليط طرق في قضاء بلدروز	1
390,168,001	27/12/2018	90	27/11/2018	24	100%	منجز	البلدية		اكساء الشوارع الرئيسية - هبهب	2
216,000,000	24/12/2018	45			100%	تنفيذ امانة / منجز	الطرق	الخالص	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص	3
193,240,000	11/12/2018	90	29/11/2018	31	100%	منجز	الطرق		صيانة جسر بعقوبة الثالث	4
257,600,000	3/1/2019	60	5/12/2018	48	100%	منجز	الطرق		صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 3 كم / ابو صيدا	5
692,320,014	16/12/2018	90	2/12/2018	32	100%	منجز	الطرق		صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قرة تبة/ ناحية جبارة	6
412,320,000	9/1/2019	120	11/12/2018	59	100%	منجز	الطرق		تبليط طريق ناحية السلام	7
579,004,500					100%	منجز	الكهرباء	المقدادية	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة- النضال-ابو الدهن)	8
87,796,000	9/1/2019	30	19/12/2018	107	100%	منجز	الكهرباء	المقدادية	أ- تجهيز قابلوات واسلاك كهربانية / كهرباء المقدادية	
184,000,000	21/1/2019	45	23/12/2018	118	100%	منجز	الكهرباء	المقدادية	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	
167,800,000	26/12/2018	45			100%	تنفيذ امائة /منجز	الماء	الخالص	تبديل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هبهب قطر 315 ملم	9
159,237,700	30/12/2018	60			100%	تنفيذ امانة امنجز	الماء	المقدادية	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخة في قضاء المقدادية	10
559,663,000	9/12/2018	120	29/11/2018	27	100%	منجز	الماء		تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 100 م3/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة 250 ملم	11
239,487,000	26/12/2018	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	خانقين	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (6) صف	12
96,755,000	31/1/2019			141	100%	منجز	الصحة		تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء	13
386,900,000	16/1/2019	90	13/12/2018	86	100%	منجز	الطرق		تبليط طريق كشكول الصغير و الكبير	14
1,097,486,000		180	13/12/2018	79	100%	منجز	التربية	الخالص	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 12 صف	15
	4/2/2019			79	100%	منجز	التربية	الخالص	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصالة 12 صف	16
221,429,100	30/12/2018	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	الماء	بعقوبة	تاهيل مجمع ماء السادة سعة 200م3/ساعة	17
75,125,000	24/12/2018	40			100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	مندلي	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	18
6,465,088,815		117							المجموع	



		ابل	ىمال ب	ً 2018 / ﷺ	العام	فيدرالية	لموازنة ال	عادة الاعمار لا	ع صندوق إ	لمشاري	الخطة الاستثمارية	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	تاريخ المباشرة العقدي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	الكلفة التخمينية	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü
2,000,259,000	27/12/2018	26/12/2018	150	12/12/2018	68	%100	انجز بتاریخ 8/8/2019	2,860,369,360	الطرق والجسور	جرف النصر	صيانة طريق مسيب – جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	
2,000,259,000								2,860,369,360			المجموع	



### الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد تاريخ المباشرة الفعلي مدة العقد تاريخ المباشرة / يوم العقدي نسبة الإنجاز الفني الناحية او القضاء تاريخ العقد كلفة العقد الأصلى حالة المشروع الكلفة التخمينية القطاع اسم المشروع هدم واعادة بناء مدرسة بن غازى الابتدائية 18 صف الطارمية منجز التربية 840,178,000 27/12/2018 2/1/2019 240 19/12/2018 102 100% 1,207,253,080 2 | هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف المشاهدة التربية 840,177,600 8/1/2019 8/1/2019 240 26/12/2018 127 100% منجز 1,207,253,080 المجموع 1,680,355,600 2,414,506,160

			ا بغداد	2018 <sub>é</sub>	درالية لعاد	لاعمار للموازنة الفي	صندوق إعادة ا	ة لمشاريع	ة التشغيلي	الخطأ	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	الكلفة التخمينية	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
507,471,500	23/12/2018	120	9/12/2018	57	100%	منجز	512,502,848	الكهرباء	المشاهدة	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نفط المشاهدة	1
99,800,000	21/10/2018	25			100%	تنفيذ امانة / منجز	99,800,000	الماء		ايصال الماء الصافي الى قرية المزرفة في التاجي	2
				70	100%	منجز		الماء	اليوسفية	مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة 200م3/س	3
718,103,100	27/12/2018	120	13/12/2018	70	100%	منجز	792,511,290	الماء	اليوسفية	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة 200م3/س	4
				70	100%	منجز		الماء	اليوسفية	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	5
205,980,000	24/12/2018	45			100%	تنفيذ امانة / منجز	230,270,000	الطرق والجسور	المحمودية	تبليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر/ قضاء المحمودية	6
508,638,400	25/12/2018	60	11/12/2018	63	100%	منجز	561,344,763	الكهرباء		تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دوليبة/ قضاء ابو غريب	7
19,750,000					100%	لجنة مشتريات / منجز	17,437,235	الصحة		انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور	8
200,332,000	23/12/2018	50			100%	تنفيذ امانة / منجز	249,485,000	الداخلية	الرستمية	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	9
199,704,000	23/12/2018	50			100%	تنفيذ امانة / منجز	248,676,000	الداخلية	الشعب	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	10
210,000,000	24/12/2018	45			100%	تنفيذ امانة / منجز	250,000,000	البلدية	التاجي	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	11
229,915,000	24/12/2018	45			100%	تنفيذ امانة / منجز	262,075,000	البلدية	الشعب	تاهيل طريق حنون	12
240,900,000	24/12/2018	45			100%	تنفيذ امائة / منجز	286,350,000	البلدية	التاجي	تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوة	13
73,200,000	27/12/2018	45			100%	تنفيذ اماتة / منجز	73,200,000	التربية	التهروان	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	14
250,000,000	27/12/2018	60			100%	تنفيذ اماتة / منجز	500,000,000	مباني حكومية		توسعة مقر الصندوق	15
50,000,000		60			100%	لجنة مشتريات / منجز	50,000,000	مباني حكومية		توسعة القسم الهندسي / مقر الصندوق	16
3,513,794,000							4,133,652,136			المجموع	

# مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2019



# الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

كلفة العقد الأصلى	تاريخ المباشرة الفعلى	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفعلى	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
2,969,285,600	2019-09-02	365	23	100%	منجز	التعليم العالي	الجانب الأيمن	اعادة تاهيل ابنية الاقسام الداخلية في مجمع الفاروق / الساحل الأيمن / جامعة الموصل	1
445,851,000	2019-09-03	180	37	40%	فسخ عقد	الكهرباء	تلعفر	تجهيز المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في قضاء تلعفر	2
606,156,800	2019-10-06	270	45	100%	منجز	الموارد المائية	الجانب الأيمن	تاهيل بناية ادارة الدراسات والتصاميم الهندسية في الموصل	3
5,444,672,000	2019-10-30	500	55	60%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء	4
2,416,492,800	2019-11-18	380	66	60%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 3 / طب الموصل	5
2,416,202,800	2019-12-22	380	84	35%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 2 / طب الموصل	6
2,355,423,000	2019-12-24	380	90	0%	فسخ العقد رضائيا	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 4 / طب الموصل	7
2,349,894,000	2019-12-24	380	93	0%	فسخ العقد رضائيا	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاءعمادة كلية الطب جامعة الموصل	8
2,965,872,000	2019-12-22	360	98	78%	قيد التنفيذ	البلديات	الموصل	اعادة انشاء بناية مديرية بلديات نينوى	9
2,750,000,000	2020-01-01	380	103	45%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	التعليم العالي	الموصل	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 1 / طب الموصل	10
1,148,480,000	2020-01-01	180	105	100%	منجز	الطرق والجسور	سنجار	تبليط وفرش اكتاف الطريق الرابط من مشروع ري الجزيرة الشمالي الى قرية حردان بطول 12,5كم	11
1,284,315,200	2020-01-07	180	113	75%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	البلدية والبلديات	تلعفر / تركمانية	انشاء وتبليط وإكساء شوارع داخلية متفرقة في قضاء تلعفر	12
	2020-01-07	180	113	75%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	التجارة	تلعفر / تركمانية	اعادة تاهيل المسقفات ويناية الادارة لسايلو تلعفر	13
536,110,800	2020-01-08	210	117	100%	منجز	الموارد المائية	الموصل	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المانية في الموصل	14
3,990,968,000	2020-01-19	400	130	46%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	الزراعة	الموصل	اعادة انشاء بناية المقر الرئيسي لمديرية زراعة نينوى	15
1,123,049,200	2020-01-20	240	139	100%	منجز	التربية	الموصل / الجانب الايمن	هدم و أعادة أنشاء مدرسة الأعدادية المركزية 24 صف الموصل/ الجانب الأيمن	16
651,606,000	2020-01-08	200	142	100%	منجز	التعليم العالي	الموصل	اعادة تاهيل مطبعة جامعة الموصل	17
1,001,593,200	2020-01-20	210	147	100%	منجز	التربية	الموصل	هدم واعادة بناء متوسطة العقيدة للبنين 12 صف	18
	2020-01-20	210	147	100%	منجز	التربية	الموصل	هدم واعادة بناء روضة الاريج 4 صف	19
963,860,800	2020-01-08	210	160	93%	قيد التنفيذ	الزراعة	الجانب الايمن	اعادة تاهيل المستشفى البيطري في باب سنجار- الجانب الأيمن	20
558,717,200	2020-01-08	210	161	100%	منجز	التربية	الموصل	هدم واعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل 12 صف	21
3,472,866,240	2020-01-27	320	165	100%	منجز	التجارة	الموصل	هدم واعادة بناء مجمع الكرامة 21	22
1,515,000,000	2019-12-30	150	171	100%	منجز	الكهرباء	الجانب الايسر	تجهيز مواد لتاهيل واعمار وصيانة الشبكة الكهربانية - الجانب الايسر	23
2,700,319,000	2020-02-02	360	178	100%	منجز	الكهرباء	الموصل	هدم واعادة بناء محطة الشفاء الثانوية (11/33) kv الجانب الايمن	24

809,862,000	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم متوسطة تلعفر للبنين / تركمانية	25
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة المجد الابتدائية / تركمانية	26
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة اليمامة للبنات / تركمانية	27
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة سكينة بنت الحسين الابتدائية للبنين / تركمانية	28
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة ام القرى الابتدائية للبنين / تركمانية	29
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم اعدادية تلعفر للبنين / تركمانية	30
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة العزة للبنات / تركمانية	31
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	بناء جناح إدارة في متوسطة اسيا / تركمانية	32
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة تبوك للبنين / تركمانية	33
	2020-01-23	90	179	100%	منجز	التربية	تلعفر / تركمانية	ترميم مدرسة الفضائل للبنين / تركمانية	34
824,975,000	2020-02-13	220	180	100%	منجز	التربية	سنجار	هدم واعادة بناءاعدادية اسماعيل طالب /ناحية القيروان- 12 صف	35
922,000,000	2020-02-03	150	181	100%	منجز	الكهرباء	الموصل	تجهيز وتنفيذ مصادر جهد (33) kv المحطة كهرباء باب عشتار الثانوية من المحطة الرئيسية	36
261,985,000	2020-01-27	210	202	100%	منجز	البلدية والبلديات	سنجار	اعادة تأهيل بناية بلدية القيروان	37
4,525,160,000	2020-02-02	400	203	67%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	اعادة تأهيل مخازن كهرباء الكرامة	38
2,210,000,000	2020-01-21	210	211	100%	منجز	البلدية والبلديات	تلعفر	تبليط وتاهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة داخل قضاء تلعفر	39
	2020-01-21	210	211	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل وتبديل القوالب الجانبية لشارع السوق من دورة القلعة الى دورة رأس الجادة في تلعفر مع تبليط شوارع بطول 1525م	40
339,240,000	2020-01-27	80	218	94%	قيد التنفيذ	الشباب والرياضة	تلعفر / تركمانية	ترمیم منتدی شباب تلعفر / ترکمانیة	41
3,201,436,000	2020-01-26	360	221	50%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الموصل	اعادة تأهيل ملعب جامعة الموصل	42
3,192,400,000	2020-01-20	320	225	96%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	الموارد المائية	تلكيف	اعادة اعمار وتاهيل جسر موقع سد بادوش الحديدي	43
1,492,000,000	2020-01-24	220	227	100%	منجز	البلدية والبلديات	تلكيف	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء تلكيف	44
459,497,000	2020-01-22	80	228	100%	منجز	الزراعة	تلعفر + العياضية / تركمانية	اعادة بناء شعبة زراعة العياضية / قضاء تلعفر / تركماتية	45
2,886,905,000	2019-12-31	90	234	100%	منجز	الكهرباء	تلعفر / تركمانية	تجهيز محولات ( 400 (KVAالدائرة توزيع كهرباء تلعفر/ بعدد ( 100) محولة	46
	2019-12-31	90	234	100%	منجز	الكهرياء	تلعفر + العياضية / تركمانية	تجهيز مواد الشبكة الكهربانية لأعادة تأهيل كهرباء قضاء تلعفر والقرى التابعة لها	47
	2019-12-31	90	234	100%	منجز	الكهرباء	تلعفر / تركمانية	اعادة تاهيل مغذي 11 كي في حي الخضراء والجزيرة من محطة تلعفر الجديدة 33/11 كي في وبطول 5 كم	48
1,830,835,000	2020-02-08	180	235	47%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	الكهرباء	سنجار	اعادة تأهيل محطةً كهرباء القيروان	49
1,888,570,000	2020-02-08	180	238	47%	قيد التنفيذ / تلكؤ الشركة	الكهرباء	البعاج	اعادة تأهيل محطة كهرباء البعاج سعة 2*16 مفأ	50
			محال - مؤجل		مؤجل / لم يوقع عقد	مباني حكومية	تلعفر	تاهيل بناية شعبة احصاء تلعفر	51
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	مباني حكومية	تلعفر / تركمانية	تأهيل قاعة القائمقامية قضاء تلعفر مع بناء قاعة	52

72,451,179,240

# الإضافي الأول

3,431,828,600	2020-12-24	260	226	100%	منجز	البلديات	تلعفر	تبليط وتاهيل شوارع في حي الكفاح وحي الجزيرة وحي العسكري والصناعة المجزيرة وحي العسكري والصناعة المجزيرة وحي المتعادي والمتعادي والمتعادي والمتعادي المتعادي والمتعادي والمت	1
507,750,000	2020-12-24	150	213	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	صيانة واكساء طريق تل زلط ـ المولمي	2

## الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

				<i></i>	المورود المجاورات المام 13	٠, ١	,		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ث
455,116,000	2019-08-05	180	12	100%	منجز	الصحة	الموصل	اعادة انشاء مركز صحي الوحدة	1
601,200,000	2019-08-19	150	17	100%	منجز	الجسور	تلعفر	اعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل - كسك	2
	2019-08-19	150	17	100%	منجز	الجسور	زمار	اعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)	3
739,203,600	2019-09-02	180	25	100%	منجز	التربية	زمار	هدم و اعادة بناء ثانوية زمار للبنات 12 صف	4
	2019-09-02	180	25	100%	قيد التنفيذ / تلكن الشركة بسبب عدم صرف المستحقات المالية	التربية	ناحية ربيعة	تأهيل مدرسة ابو خشب /ناحية ربيعة مع بناء جناح (6) صف طابقين مع وحدات صحية عدد (4)	5
860,206,300	2019-09-02	210	26	90%	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	الكهرباء	تلعفر	إعادة انشاء ورشة فحص المحولات في تلعفر	6
	2019-09-02	210	26	100%	منجز	الكهرباء	تلعفر	اعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي / تلعفر	7
406,700,000	2019-10-22	150	40	61%	قيد التنفيذ / تم التاكيد على اكمال اجراءات امر التغيير في 26/8/2021	المجاري	الموصل	اعادة بناء القناطر في حي االمامون	8
	2019-10-22	150	40	100%	منجز	المجاري	الموصل	اعادة بناء القناطر في حي النجار	9
944,158,800	2019-12-07	210	72	27%	قيد التنفيذ	التربية	سنجار	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين + (4صف) + مجموعة صحية /مدرسة عبد الله بن مسعود / سنجار	10
	2019-12-07	210	72	10%	قيد التنفيذ	التربية	سنجار	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين / مدرسة القيروان / سنجار	11
	2019-12-07	210	72	29%	قيد التنفيذ	التربية	سنجار	هدم و اعادة بناء مدرسة ام الشبابيط - 12 صف/سنجار	12
2,400,000,000	2019-12-08	180	78	100%	منجز	الصحة	الموصل	تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد (2)	13
648,128,000	2019-12-24	210	94	59%	قيد التنفيذ	الزراعة	الموصل	تاهيل مبنى الادارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور	14
	2019-12-24	210	94	12%	قيد التنفيذ	الزراعة	الموصل	تجهيز و نصب معمل تنقية البذور	15
1,571,942,400	2019-12-30	270	100	100%	منجز	التجارة	الموصل	تأهيل سايلو الموصل - وادي حجر لخزن الحبوب	16
	2019-12-30	270	100	100%	منجز	التجارة	الموصل	تأهيل مجمع تل عبطة لخزن الحبوب	17
	2019-12-30	270	100	100%	منجز	التجارة	الموصل	صيانة وتاهيل ساحة الموصل لخزن الحبوب	18
275,000,000	2020-01-01	180	104	100%	منجز	مباني حكومية	الموصل	اعادة تأهيل جمعية الحدباء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	19
2,324,000,000	2019-12-31	180	201	100%	منجز	الصحة	الموصل	تجهیز و تنصیب و تشغیل جهاز قسطرة عدد 1	20
435,000,000	2019-12-31	90	240	100%	منجز	الصحة	الموصل	تجهيز ونصب اجهزة طبية	21
11,660,655,100									

127

























اعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)















تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

كلفة العقد الأصلى	تاريخ المباشرة الفعلى	مدة العقد / يوم	يام 10 10. رقم العقد	نسبة الإنجاز الفنى	الا عدال المشروع الله المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,545,240,000	2019-08-11	200	16	100%	منجز	البلدية والبلديات	حديثة	اكساء وتاهيل ارصفة في قضاء حديثة	1
, , ,	2019-08-11	200	16	100%	منجز	البلدية والبلديات	هيت	اعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي	2
2,773,520,000	2019-09-01	360	21	100%	منجز	البلدية والبلديات	الرمادي	تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 5 كيلو الرمادي	3
	2019-09-01	360	21	100%	منجز	البلدية والبلديات	الفلوجة	اعادة تاهيل طريق بين حي اليرموك وجسر التفاحة بطول 2900م	4
1,289,200,000	2019-08-22	120	22	100%	منجز	الطرق والجسور	الحبانية	تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني (السي سي) من جهة حي العمال بطول اكم وعرض 25,5 متر	5
	2019-08-22	120	22		متوقف بسبب اعتراض قيادة قاعدة الحبانية وتم توجيه كتاب استبدال الى مقر الصندوق من ديوان المحافظة مديرية التغيطيط والمتابعة ذي العدد و2999 في 16/12/2019	الطرق والجسور	الحبانية	تاهيل طريق أبو فليس الحولي المحاذي لقاعدة الحبانية بطول 3425 م وعرض 30 متر	6
1,104,560,000	2019-09-02	210	24	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تاهيل وصيانة محطة الدفع ( (14 p التابعة الى مركز مجاري الفلوجة	7
818,148,000	2019-09-12	360	36	100%	منجز	مبان <i>ي</i> حكومية	الرمادي	اعادة بناء هيئة استثمار الانبار	8
443,448,000	2019-10-14	180	44	100%	منجز	الصحة	عنة	هدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية الاولية في عنه	9
4,370,761,100	2019-10-10	730	46	93%	قيد التنفيذ	الداخلية	الرمادي	هدم واعادة بناء مديرية شرطة الانبار	10
789,244,000	2019-10-13	180	48	100%	منجز	الماء والمجاري	القانم	هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة /القانم	11
655,650,000	2019-11-13	200	57	100%	منجز	الطرق والجسور	الرمادي	اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقائي كم (900+94) على طريق المرور السريع	12
1,141,571,200	2019-11-13	240	62	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية - مجمع الاخاء	13
2,823,356,000	2019-11-24	180	69	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة التل الاخضر- المميرة 12 صف	14
	2019-11-24	180	69	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف في الرمادي / المركز	15
	2019-11-24	180	69	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد الابتدائية للبنين 12 صف	16
	2019-11-24	180	69	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة الشقائق الابتدائية للبنات 12/ صف	17
1,141,590,000	2019-12-01	180	70	87%	قيد التنفيذ	التربية	الكرمة	هدم واعادة بناء مدرسة الغر المحجلين الابتدائية المختلطة 12 صف	18
	2019-12-01	180	70	87%	قيد التنفيذ	التربية	الفلوجة	هدم واعادة بناء مدرسة الامين 12 صف الفلوجة	19
2,271,912,000	2019-11-30	180	71	100%	منجز	التربية	هيت	هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 12 صف - هيت	20
	2019-11-30	180	71	100%	منجز	التربية	هيت	هدم واعادة بناء مدرسة الحبوبي الابتدائية 12 صف في البغدادي	21
	2019-11-30	180	71	100%	منجز	التربية	هيت	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة الابتدانية للبنين /12 صف	22
	2019-11-30	180	71	100%	منجز	التربية	هيت	هدم و اعادة بناء مدرسة الاخاء الابتدائية المختلطة /12 صف	23
1,994,886,800	2019-12-22	310	75	100%	منجز	الصحة	القانم	تاهيل مستشفى القائم العام	24
2,214,564,000	2020-02-12	360	77	100%	منجز	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر/ الفلوجة	25
1,474,000,000	2019-12-21	180	79	95%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الرمادي	اعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي	26
2,124,214,400	2019-12-18	300	80	95%	قيد التنفيذ	التربية	الكرمة	هدم واعادة بناء ثانوية الوطن للبنين 18 صف الكرمة	27
	2019-12-18 132	300	80	100%	منجز	التربية	الخالدية	هدم واعادة بناء تاتوية الرشيد 18 صف	28
			85	100%	منجز	البلدية والبلديات	الرطبة	تاهيل شوارع عدد 7 لمديرية بلدية الرطبة	29

1,912,832,000	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي الصفرة ومغذي النهية	30
	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة	31
	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي الكرابلة من محطة سعدة	32
	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	تأهيل الشبكة الكهربانية لقرى جريجب والفياضية والقنيطرة	33
	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	اعادة ايصال التيار الكهرباني الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات	34
	2019-12-21	150	86	100%	منجز	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي سعده من محطة سعده	35
2,385,056,000	2019-12-24	180	96	92%	قيد التنفيذ/تم تغيير الاسم والموقع من سومرالى الاحواز بحسب كتاب الصندوق المرقم 1613 في 2020/6/30	التربية	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة سومر ( الاحواز) الابتدائية / 12 صف	36
	2019-12-24	180	96	76%	قيد التنفيذ	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة التلاحم الابتدانية 12 صف	37
	2019-12-24	180	96	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج الابتدائية 12 صف في زنكورة	38
	2019-12-24	180	96	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 12 صف	39
524,432,000	2019-12-26	180	101	100%	منجز	مبائي حكومية	الرمادي	تاهيل بناية مديرية احصاء الانبار	40
675,000,000	2019-12-31	200	102	100%	منجز	مبائي حكومية	القائم	اعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة	41
439,555,000	2020-01-02	200	109	100%	منجز	مبائي حكومية	القائم	اعادة اعمار محطة تعبنة وقود ناحية الكرابلة/الانبار	42
3,186,564,000	2020-01-04	300	112	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء تُاتوية الامالي للبنين 18 صف ـ القائم	43
	2020-01-04	300	112	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير الابتدائية للبنين / 18 صف	44
	2020-01-04	300	112	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة المهدي الابتدائية للبنين/18 صف	45
1,062,188,000	2020-01-08	300	118	100%	منجز	التربية		هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 18 صف	46
1,189,108,800	2020-01-09	270	122	100%	منجز	الكهرباء	الرمادي	اعادة انشاء مديرية كهرباء الانبار مع مخزن	47
1,099,946,750	2020-01-08	150	123	100%	منجز	الكهرباء	هيت	تأهيل مغذي كهرباء المعسكر	48
2,271,912,000	2020-01-08	180	125	100%	منجز	التربية	راوة	هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة الابتدائية 12 صف - راوه	49
	2020-01-08	180	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء تُاتوية الرحاب للبنات12 صف - القائم	50
	2020-01-08	180	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين / 12 صف	51
	2020-01-08	180	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة حلب الابتدائية للبنين/ 12 صف	52
2,398,284,000	2020-01-08	300	126	100%	منجز	الطرق والجسور	الرمادي	تاهيل سدة جويبة باتجاه النساف بطول 3كم من المحطة 11+000 الى المحطة 14+000 باعتبار (صفر +صفر) جسر النافورة	53
425,981,600	2020-01-08	210	129	100%	منجز	الداخلية	الرمادي	هدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي	54
388,055,000		120	131		لم يباشر / وجود مخاطبات بين الصندوق ووزارة التخطيط حول تغير الموقع	الصحة	القائم	اعادة انشاء مركز صحي فرعي /العبيدي	55
596,160,000	2020-01-08	120	133	100%	منجز	الطرق والجسور	الرمادي	تاهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعيثة	56
2,124,376,000	2020-01-08	300	134	100%	منجز	التربية	هيت	هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 18 صف في هيت/ كبيسة	57
	2020-01-08	300	134	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم واعادة بناء اعدادية حليمة السعدية (ابن الاثير) للبنات /18 صف	58
536,652,000	2020-01-08	180	150	100%	منجز	مبان <i>ي</i> حكومية	عنه	ترميم وتاهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه	59

1,222,113,600	2020-01-07	200	151	98%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة خط ناقل بطول 3500 متر	60
	2020-01-07	200	151	98%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القانم	تاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القانم	61
950,060,000	2020-01-08	120	153	100%	منجز	الطرق والجسور	عنة	اعادة تاهيل مقطع من الطريق العام حديثة-عنه	62
	2020-01-08	120	153	100%	منجز	الطرق والجسور	عنة	اعادة تاهيل قنطرة صندوقية ثلاثية على طريق حصى -جباب وقنطرة عبرة انحدارية على طريق الشارع العام اقضاء عنة	63
2,165,133,600	2020-01-14	300	162	98%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الرمادي	تاهيل مشروع ماء ال 5 كيلو في الرمادي	64
4,477,492,000	2020-01-09	200	163	100%	منجز	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الضباط اقضاء الفلوجة	65
	2020-01-09	200	163	100%	منجز	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الشرطة والجغيفي/قضاء الفلوجة	66
	2020-01-09	200	163	100%	منجز	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شارع المحيط الفاصل بين الحي العسكري وحي الشركة /قضاء الفلوجة	67
745,647,200	2020-01-12	240	169	100%	منجز	البلدية والبلديات	الرمادي	هدم واعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء	68
	2020-01-12	240	169	100%	منجز	مباني حكومية	الفلوجة	هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقلاوية	69
566,500,000	2020-01-14	90	173	100%	منجز	الشباب والرياضة	هيت	اعادة تأهيل منتدى شباب هيت	70
812,784,000	2020-01-13	220	174	91%	قيد التنفيذ	التربية	راوة	هدم و اعادة بناء قسم تربية راوة	71
567,978,000	2020-01-13	180	175	100%	منجز	التربية	الكرمة	هدم واعادة انشاء مدرسة الصادق الامين (12) صف / الانبار	72
5,335,640,000	2020-01-12	240	176	100%	منجز	البلدية والبلديات	الرمادي	اعادة تاهيل كورنيش الورار من جهة التاميم الرابط بين جسر الحوز الى جسر القاسم	73
1,484,752,000	2020-01-31	270	182	100%	منجز	مباني حكومية	الرطبة	هدم و اعادة بناء بناية قانممقامية الرطبة	74
4,256,696,000	2020-01-13	360	187	97%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	القانم	هدم واعادة بناء بناية الاقسام العلمية /كلية التربية في القائم	75
	2020-01-13	360	187	97%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	القانم	اعادة انشاء بناية الاقسام الداخلية للطلاب لكلية التربية في القانم	76
1,382,400,000	2020-01-13	300	189	70%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	هيت	صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية - هيت B1,B2,B3,B4	77
812,784,000	2020-01-13	220	193	8%	متوقف / تلكو الشركة وتم توجيه كتاب انذار لها	التربية	الفلوجة	هدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة	78
462,000,000	2020-01-13	120	198	100%	منجز	الماء والمجاري	الكرمة	تجهيز ونصب مجمع ماء السعيد_سعة 100 م3/ساعة	79
613,200,000	2020-01-13	150	199	100%	منجز	الماء والمجاري	الرمادي	الغاء مبزل الحفرية بمد خط دفع لمحطة مجاري الاحتقالات والمخابرات / الرمادي	80
1,142,160,000	2020-01-10	200	200	100%	منجز	الماء والمجاري	القانم	تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 200م3/ساعة مع خط ناقل بطول 1500 متر	81
	2020-01-10	200	200	100%	منجز	الماء والمجاري	القانم	تأهيل وتوسيع مشروع ماء الشرب للمدينة السكنية في القانم / العبيدي	82
	2020-01-10	200	200	100%	منجز	الماء والمجاري	القانم	استبدال نواقل رنيسية لمغذي المدينة السكنية / العبيدي	83
459,746,784	2020-01-13	240	204	100%	منجز	الكهرباء	هيت	هدم واعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة	84
2,093,401,200	2020-01-13	240	205	100%	منجز	الطرق والجسور	الخالدية	اعادة تأهيل طريق محطة البزل الرنيسية في المضيق باتجاه نهر الفرات مع طريق داخلي	85
2,255,600,000	2020-01-13	270	212	100%	منجز	الطرق والجسور	الحبانية	صيانة وتاهيل جسر الخالدية الكونكريتي / قضاء الحبانية	86
588,930,000	2020-01-14	140	219	100%	منجز	التعليم العالي	الفلوجة	تاهيل كلية العلوم الانسلامية / جامعة الفلوجة	87
881,490,000	2020-01-13	220	229	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	تأهيل وصيانة محطة ( (p10الفاو (امطار)	88
2,020,430,000	2020-01-13	270	230	97%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل بنايتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم الانسانية	89
	2020-01-13	270	230	97%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية/بناية المساعد العلمي	90
703,530,800		180	132		متوقف بسبب ملكية الأرض	مباني حكومية	القانم	اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي / قضاء القانم	91
4,400,960,000	2020-02-17	300	243	98%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الفلوجة	تأهيل شارع الشرشار الحولي من تقاطع النافورة الى شارع المحيط / الفلوجة	92
3,974,340,000	2020-06-22	270	245	100%	منجز	البلدية والبلديات	القانم	تاهيل الطريق الخدمي في الكرابلة - سعدة سايدين - المرحلة الثانية	93
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	مبان <i>ي</i> حكومية	هيت	اعادة انشاء بناية المجلس المحلي لقضاء هيت	94
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	التربية		هدم واعادة انشاء مدرسة اغادير للبنين 12 صف / الانبار	95
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الكهرياء	اقضية متعددة	تجهيز مواد لدعم وتاهيل الشبكات الكهربانية لقرع توزيع كهرباء مركز الأنبار في أقضية (الرمادي الخالدية هيت الرطبة )	96
			1	1	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الماء والمجارى	الكرمة	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 100م3/س في قرية بني زيد في الكرمة / الانبار	97

# الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

قِم العقد مدة العقد / يوم تاريخ المباشرة الفعلي كلفة العقد الأصلي	نسبة الانجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ث
1,649,372,000 2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	الخالدية	تاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية	1
2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	الزراشية	فك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم	2
2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	راوه	تاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية	3
2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	راوه	تاهيل جزء من مغذي راوه القديمة	4
2019-08-01 150 1	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	رمادي	تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري	5
2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	الكرمة	تاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه	6
2019-08-01 150 <b>1</b>	100%	منجز / تم استلام المشروع اوليا	الكهرباء	الفلوجة	اعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة	7
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	الفلوجة	اعادة اعمار محطة الدفع ( (p4لتصريف مياه الإمطار في الفلوجة	8
2,474,805,800 2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	فلوجة	تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 50 م3/ساعة	9
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	رمادي	تاهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس 200م3/ساعة	10
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	حديثة	تاهيل مجمع ماء سعة 250 غالون في الخفاجية	11
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	رمادي	استبدال الانابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع	12
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	فلوجة	تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 200م3/ساعة	13
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	فلوجة	تاهيل مجمع ماء الزغاريت الصقلاوية	14
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	الكرمة	تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمة	15
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	حديثة	تاهيل مجمع ماء الزاوية 200م3/ساعة	16
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	العامرية	صيانة مجمعات الماء في العامرية	17
2019-08-03 120 3	100%	منجز	الماء والمجاري	هيت	اعادة تاهيل مجمع ماء البوشلال 200م3/ساعة في هيت	18
849,935,000 2019-08-04 120 7	100%	منجز	البلديات	الكرمة	اعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمة	19
2019-08-04 120 7	100%	منجز	الطرق	الرطبة	مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثلاث محاور (كيلو 160و كربلاء و الرطبة )	20

								·	
	2019-08-04	120	7	100%	منجز	البلديات	هيت	تاهيل الشارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفرقة ـ كبيسه	21
	2019-08-04	120	7	100%	منجز	البلديات	هيت	اعادة انشاء شوارع في حي السلام في ناحية المحمدي	22
1,093,879,000	2019-08-05	180	9	100%	منجز	الزراعة	القائم	اعادة انشاء شعبة الزراعة في الرمانة	23
	2019-08-05	180	9	100%	منجز	التجارة	الرمادي	اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 3 في موقع سايلو الرمادي	24
	2019-08-05	180	9	100%	منجز	الزراعة	الرطبة	هدم واعادة بناء شعبة زراعة الرطبة	25
	2019-08-05	180	9	100%	منجز / بانتظار امر غيار	التجارة	رمادي	اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية - فرع الانبار	26
	2019-08-05	180	9	100%	منجز / بانتظار امر غيار	الزراعة	راوه	تاهيل بناية شعبة زراعة راوه	27
731,329,600	2019-08-10	210	14	100%	منجز / بانتظار امر غيار	الموارد المائية	راوه	انشاء شعبة الموارد المانية في راوه	28
	2019-08-10	210	14	100%	منجز / بانتظار امر غيار	الموارد المائية	رمادي	اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع الاروائية	29
	2019-08-10	210	14	100%	منجز / بانتظار امر غيار	الموارد المائية	القائم	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المانية في القاتم	30
567,981,000	2019-11-14	180	59	100%	منجز	التربية	الرطبة	هدم واعادة بناء مدرسة المكاسب الابتدائية للبنين	31
311,191,000	2020-01-08	180	120	100%	منجز	البلديات	الصقلاوية	انشاء طريق قرية زغيدان بطول 1800 م و عرض 9م	32
	2020-01-08	180	120	100%	منجز	مباني حكومية	الحقلانية	اعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقلانية	33
998,974,100	2020-01-09	180	121	83%	قيد التنفيذ	البلديات	القائم	هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم	34
	2020-01-09	180	121	15%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	هيت	تأهيل الاقسام الداخلية في قضاء هيت	35
	2020-01-09	180	121	100%	قيد التنفيذ	التربية	هيت	اعادة بناء الجناح الاداري المهدم مع تاهيل الاجزاء المتضررة في مدرسة المسار /هيت	36
	2020-01-09	180	121	90%	قيد التنفيذ	البلديات	القائم	تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القائم	37
567,978,000	2020-01-08	180	154	68%	قيد التنفيذ	التربية	الخالدية	هدم واعادة انشاء مدرسة الخليج العربي (12) صف / الانبار	38
489,700,000	2020-01-14	90	185	100%	منجز	التربية	هيت	اعادة بناء الجزء المتضرر للبناية مع القاعة الامامية في اعدادية هيت للبنات	39
226,730,000	2020-01-13	90	186	100%	منجز	مباني حكومية	الرمادي	اعادة تأهيل بناية شبكة الاعلام العراقي	40
136,485,000	2019-01-02	75	الامر الاداري المرقم 1250	100%	منجز /تنفيذ امانة	الداخلية	هيت	اعادة بناء الطابق الاول لدائرة الجنسية في قضاء هيت	41
72,880,000		136	تنفيذ امانة	100%	منجز /تنفيذ امانة	الشباب والرياضة	هيت	تاهيل قاعة في منتدى شباب هيت	42
10,171,240,500		130						المجموع	



تأهيل مستشفى القائم / الانبار





تأهيل عمادة كلية التربية الرياضية / جامعة الانبار









اعادة انشاء مديرية كهرباء الانبار مع مخزن








	الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين									
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
3,289,200,000	2019-09-07	360	26/8/2019	35	%100	منجز	الطرق والجسور	عموم المحافظة	عادة تاهيل طريق تكريت - بيجي بطول 45 كم	
1,085,670,400	2019-09-16	220	2019-09-02	39	%92	قيد التنفيذ	الداخلية	يك	هدم واعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد	
	2019-09-16	220	2019-09-02	39	%80	قيد التنفيذ	الداخلية	سامراء	هدم واعادة بناء مركز شرطة الركة	3
2,038,806,000	2019-10-28	210	14/10/2019	51	%80	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	يلد	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف ثانوية قتيبة المختلطة	4
	2019-10-28	210	14/10/2019	51	%84	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	بلد	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف التحدي الابتدائية	5
	2019-10-28	210	14/10/2019	51	%50	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	بلد	هدم واعادة بناء مدرسة لبنان الابتدائية 12 صف	6
920,492,000	2019-10-30	150	2019-10-17	53	%50	قيد التنفيذ / لم يقدم برنامج تقدم عمل	التربية والتعليم	تكريت	ناهيل وصيانة البنى التحتية لجامعة تكريت (كيوسكات) مع قابلوات الضغط الواطئ	7
	2019-10-30	150	2019-10-17	53	%50	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	تكريت	ناهيل وصيانة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الامطار لجامعة تكريت	8
2,698,634,400	2019-10-30	220	17/10/2019	54	%100	منجز	الصحة	بيجي	هدم واعادة بناء مركز صحى رئيس عزيز بلد	9
	2019-10-30	220	17/10/2019	54	%76	قيد التنفيذ	الصحة	بيجي	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي بيجي	10
	2019-10-30	220	17/10/2019	54	%76	قيد التنفيذ	الصحة	بيجي	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي الحجاج	11
430,000,000	2020-01-08	120	26/12/2019	124	%83	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الصينية	صيانة وتاهيل محطة تقوية الصينية سعة 500م3/ساعة	12
1,285,004,000	2019-11-27	150	2019-11-14	67	%100	منجز	الطرق والجسور	الشرقاط	عادة تاهيل قناطر عدد 7 على طريق بيجي - الشرقاط	13
	27/11/2019	150	2019-11-14	67	%100	منجز	الطرق والجسور	تكريت	عادة تاهيل جسور صغيرة عدد 3 (جسري كبان والسيد غريب وجسر حاوي البور) ني محافظة صلاح الدين	J 14
899,918,400	22/12/2019	220	12/11/2019	88	%21	قيد التنفيذ	مبان <i>ي</i> حكومية	الدور	هدم واعادة بناء دار القضاء في الدور	15
1,799,836,800	24/12/2019	220	12/11/2019	95	%100	قيد التنفيذ	مبان <i>ي</i> حكومية	الضلوعية	هدم واعادة بناء دار القضاء في الضلوعية	16
	24/12/2019	220	12/11/2019	95	%100	منجز	مبان <i>ي</i> حكومية	يثرب	هدم واعادة بناء دار القضاء في يتُرب	17
2,675,000,000	2020-01-14	180	26/12/2019	156	%91	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الطوز	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف سليمان بيك الابتدائية	18
	2020-01-14	180	26/12/2019	156	%100	منجز	التربية والتعليم	بيجي	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف بيجي الابتدائية للبنات	19
	2020-01-14	180	26/12/2019	156	%100	منجز	التربية والتعليم	سامراء	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف الخلفاء الابتدانية	20
	2020-01-14	180	26/12/2019	156	%80	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	يثرب	هدم واعادة بناء مدرسة الفياض للبنين 12 صف	21
286,529,600	2020-01-14	170	31/12/2019	192	%60	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الشرقاط	هدم واعادة بناء مدرسة الوادي الخصب 6 صف	22
1,755,200,000	2020-01-08	120	26/12/2019	128	%100	منجز	البلدية والبلديات	الطوز	بليط الشوارع المجاورة لسايلو طوز في منطقة 77 قضاء الطوز	23
	2020-01-08	120	26/12/2019	128	%100	منجز	البلدية والبلديات	الطوز	عمال الارصف الجانبية واكساء الشوارع في حي الطيار	24
2,254,560,000	2020-01-08	240	26/12/2019	135	%60	قيد التنفيذ	الطرق والجسور		اعادة تأهيل طريق كفري - سليمان بيك بطول 14.8كم / صلاح الدين	25
2,673,348,000	2020-01-08	300	26/12/2019	158	%100	منجز	الطرق والجسور	بيجي	بليط طريق بيجي - مفرق الشرقاط المرحلة الاولى	26
4,004,200,000	2020-01-13	300	2019-12-31	224	%100	منجز	البلدية والبلديات	سامراء	صيانة واكساء طريق سامراء بين جسر الثرثار وجسر العباسية / صلاح الدين	27
3,746,771,002	2019-12-29	200 +55	2019-12-15	97	%100	منجز	البلدية والبلديات	امرلي	عادة تأهيل الشوارع المتضررة من جراء العمليات الارهابية في مركز آمرلي / ركمانية	28
	2019-12-29	201 +55	2019-12-15	97	%100	منجز	البلدية والبلديات	امرلي	صب طرق داخلية في قرى آمرلي / تركمانية	29
	2019-12-29	202 +55	2019-12-15	97	%100	منجز	البلدية والبلديات	امرلي	عادة تاهيل الشوارع الداخلية المتضررة في آمرلي / تركمانية	30
	2019-12-29	203 +55	2019-12-15	97	%100	منجز	البلدية والبلديات	الطوز	صب الشوارع والطرق الضيقة بالكونكريت المسلح ب( B.R.C في قضاء الطوز / ركمانية	1 21
192,000,000	2020-01-30	90	2019-12-31	210	%100	منجز	البلدية والبلديات	الطوز	صب شوارع وطرق بالكونكريت المسلح داخل ناحية ينكجة / قضاء الدوز / تركمانية	32
32,035,170,602		1	11							

### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

	الحظه التشعيلية لمشاريع صندوق إعاده الإعمار للموازنة القيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين										
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ß	
905,440,000	2019-09-01	150	2019-08-18	20	%85	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	امرلي	مشروع معالجة و اكساء طريق ( المدخل الشمالي) بطول 1700 م لمركز قضاء امرلي	1	
	2019-09-01	150	2019-08-18	20	%85	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	امرلي	اعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات الارهابية في قضاء امرلي	2	
782,609,500	2019-08-05	180	2019-07-23	10	%100	منجز	مباني حكومية	ناحية المعتصم	هدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم	3	
	2019-08-05	180	2019-07-23	10	%100	منجز	الشباب والرياضة	علا	تأهیل و صیاتة منتدی شباب و ریاضة بلا	4	
1,989,736,200	2019-09-07	220	2019-08-26	34	%100	منجز	مبان <i>ي</i> حكومية	مكحول	هدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول	5	
	2019-09-07	220	2019-08-26	34	%100	منجز	مباني حكومية	الصينية	هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية	6	
	2019-09-07	220	2019-08-26	34	%100	منجز	البلدية والبلديات	الصينية	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية	7	
	2019-09-07	220	2019-08-26	34	%100	منجز	مباني حكومية	الطوز	هدم وإعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك	8	
606,960,000	2019-09-16	120	2019-09-03	41	%86	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	العلم	اعادة تأهيل طريق الشهيدة امية الجبارة	9	
705,174,400	2020-01-08	170	26/12/2019	127	%100	منجز	الماء والمجاري	يثرب	هدم و اعادة بناء بناية مركز ماء يثرب	10	
	2020-01-08	170	26/12/2019	127	%80	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	بيجي	هدم واعادة بناء بناية مركز ماء بيجي	11	
4,989,920,100											

142

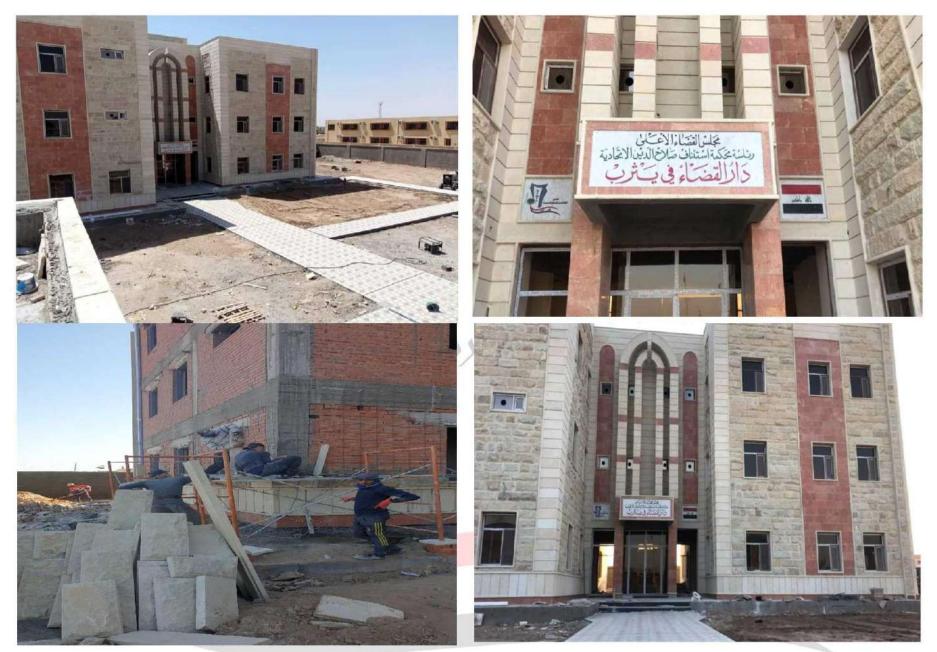

مشروع هدم وإعادة بناء دار القضاء في يثرب / محافظة صلاح الدين



هدم وإعادة بناء مدرسة بيجي الابتدائية للبنات 12 صف / محافظة صلاح الدين







#### الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك نسبة الإنجاز رقم العقد الفنى حالة المشروع كلفة العقد الأصلي تاريخ المباشرة الفعلى تاريخ العقد القطاع الناحية او القضاء اسم المشروع ت صيانة واكساء وتبليط الشوارع الداخلية في ناحية الرياض البلديات الرياض 333,646,000 2019-08-18 2019-07-25 13 %100 منجز 1 قيد التنفيذ التربية الحويجة هدم واعادة بناء مدرسة اشبيلية 12 صف - مركز الحويجة %85 2,369,721,600 2019-08-22 270 2019-07-30 15 2 التريية %100 داقوق هدم واعادة بناء مدرسة الربيع 12 صف داقوق -قرية الصمود 2019-08-22 270 2019-07-30 15 منجز 3 %100 منجز التربية الملتقي هدم واعادة بناء مدرسة كواز عرب الابتدائية 6 صف - ناحية الملتقى 2019-08-22 2019-07-30 4 التربية %100 منجز داقو ق هدم وإعادة بناء مدرسة زمزم الابتدائية 6 صف - داقوق -طويلعة 2019-08-22 270 2019-07-30 15 5 التربية %100 منجز تازة هدم وإعادة بناء مدرسة تل الجول 6 صف - تازة 2019-08-22 2019-07-30 6 15 التربية 2019-07-30 %100 منجز الملتقي هدم واعادة بناء مدرسة الخندق 6 صف - الملتقى 2019-08-22 270 15 7 قيد التنفيذ التربية هدم واعادة بناء مدرسة الزيتون الابتدائية 6 صف - الدبس 2019-08-22 270 2019-07-30 15 %95 الديس 8 هدم وإعادة بناء مدرسة المصطافية الابتدائية المختلطة 6 صف - الحويجة - المصطافية قيد التنفيذ التربية الحويجة 2019-07-30 %13 9 2019-08-22 15 هدم واعادة بناء مدرسة اسماعيل اوة الابتدائية المختلطة 6 صف - الدبس- اسماعيل التربية 2019-07-30 %100 منجز الدبس 10 2019-08-22 270 15 قيد التنفيذ التريية هدم وإعادة بناء مدرسة كواز كرد الابتدائية المختلطة 6 صف - الملتقى 2019-08-22 270 2019-07-30 15 %15 الملتقي 11 2019-08-25 20/8/2019 %100 منجز المجاري الحويجة تاهيل مجاري حي حطين في قضاء الحويجة 3.339.335.000 330 27 12 تاهيل مجارى حى النصر في قضاء الحويجة 2019-08-25 330 20/8/2019 27 %100 منجز المجاري الحويجة 13 تاهيل مجاري حي النداء في قضاء الحويجة 20/8/2019 %100 منجز الحويجة 2019-08-25 330 المجاري 14 منجز تاهيل شوارع حي النصر في قضاء الحويجة 20/8/2019 %100 البلديات الحويجة 2019-08-25 330 27 15 %100 منجز البلديات الحويجة تاهيل شوارع حي حطين في قضاء الحويجة 20/8/2019 2019-08-25 27 16 تاهيل شوارع حي النداء في قضاء الحويجة 20/8/2019 %100 منجز البلديات الحويجة 2019-08-25 330 27 17 تاهيل شوارع القطاع الثالث في قضاء الحويجة 21/8/2019 %100 البلديات الحويجة 1,998,406,800 2019-09-05 220 31 منجز 18 %100 منجز الحويجة 2019-09-05 220 21/8/2019 31 البلديات تاهيل السوق الصغير وجزء من حي اليرموك 19 هدم واعادة بناء ورشة مركزية لبلدية الحويجة قيد التنفيذ %86 البلديات 2019-09-05 220 21/8/2019 31 الحويجة 20 تاهيل مجارى القطاع الثالث في قضاء الحويجة الحويجة 2019-09-05 220 21/8/2019 %100 منجز المجاري 21

1,458,892,001	2019-12-24	200		63	%100	منجز	البلديات	تازة	صب الشوارع الداخلية بالكونكريت مع المجاري واسالة الماء قرب جامع التقلين في مركز ناحية تازة / تركمانية	22
	2019-12-24	200		63	%100	منجز	البلديات	تازة	تبليط الشوارع الداخلية في مناطق متفرقة في قرية البشير في ناحية تازة / تركمانية	23
	2019-12-24	200		63	%100	منجز	البلديات	تازة	تبليط الشوارع الداخلية خلف مركز الشباب مع الفروع قرب حسينية علي الاكبر في الحية تازة / تركمانية	
289,100,000		45	24-11-2019	74	%100	منجز	الكهرياء	الحويجة	تجهيز محولات مع ملحقات و ومواد تأهيل في قضاء الحويجة	25
3,250,000,000	2019-12-31	200	2019-12-19	106	%100	منجز	الطرق والجسور	الحويجة	اعادة تأهيل الطريق الرابط بين قضاء الحويجة ومفرق الصفرة	26
	2019-12-31	200	2019-12-19	106	%100	منجز	الطرق والجسور		تأهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين الاقضية والمدن التابعة للمحافظة	27
406,845,600	2020-02-18	180	19-12-2019	110	%92	قيد التنفيذ	مبائي حكومية	الحويجة	هدم واعادة بناء شعبة احصاء الحويجة	28
2,807,000,000	2020-01-28	180	25-12-2019	114	%100	منجز	البلديات	الحويجة	تأهيل مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	29
	2020-01-28	180	25-12-2019	114	%100	منجز	البلديات	الحويجة	تاهيل مشروع مجاري مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	30
1,269,760,000	2020-01-05	360	26-12-2019	116	%100	منجز	الطرق والجسور		صیانة جسر زغیتون علی طریق کرکوك - تکریت	31
692,200,000	2020-01-05	240	2019-12-26	137	%100	منجز	الطرق والجسور	كركوك	تاهيل جسر التون كوبري	32
462,400,000	2020-01-09	60	26-12-2019	143	%100	منجز	الماء	الحويجة	تجهيز مضخات ومعدات لمشاريع الماء للمناطق المحررة في كركوك	33
2,400,000,000	2020-01-08	180	26-12-2019	157	%100	منجز	الطرق والجسور	الحويجة	صيانة الطريق الرابط بين الشلالات وقرى النكارات	34
	2020-01-08	180	26-12-2019	157	%100	منجز	الطرق والجسور	الحويجة	اعادة تأهيل الطريق الرابط بين تل علي قرية مصطفى العباسي والقرية الغازية بطول 10 كم	35
780,884,000	2020-01-28	210	26-12-2019	166	%100	منجز	الماء والمجاري	الحويجة	بناء دائرة ومركز جباية ماء قضاء الحويجة مع تأهيل المخزن	36
886,635,040	2020-01-21	120	2019-12-31	188	%100	منجز	الكهرباء	الحويجة	تاهيل شبكات كهرباء في قرى متفرقة ومغنيات 11كف - السلام وباجوان مع تنفيذ مغني جديد من محطة الطابوق في ناحية الملتقى	37
2,131,577,600	2020-02-10	220	2019-12-31	244	%100	منجز	الزراعة	الحويجة	هدم واعادة بناء مخازن عدد في قضاء الحويجة مع بناية الشعبة الزراعية والقاعة الارشادية	38
	2020-02-10	220	2019-12-31	244	%100	منجز	الزراعة	الحويجة	اعادة تأهيل منشاة محطة بستنة الحويجة	39
24,876,403,641										

#### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك نسبة الإنجاز الفني مدة العقد ا الناحبة او كلفة العقد الأصلى تاريخ المباشرة الفعلى تاريخ العقد حالة المشروع القطاع اسم المشروع ت القضاء فع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحربية على كتف القناة الموارد المائية الحويجة 1,910,400,000 2019-08-05 180 2019-07-21 4 %100 منجز 1 الرئيسية رى كركوك و نقلها الى مطار كركوك صيانة واكساء طريق الحويجة - العباسي منجز الطرق والجسور الحويجة 2019-08-05 180 2019-07-21 %100 2 4 اكساء شوارع قرى (ابو الجيس - الرشيدية - النعيمية) منجز الطرق والجسور الحويجة 3 2019-08-05 180 2019-07-21 4 %100 منجز الطرق والجسور الحويجة صيانة طريق كركوك - تكريت 180 2019-07-21 %100 4 2019-08-05 الداخلبة الحويجة هدم واعادة بناء مركز شرطة الماحوز - الحويجة 23/7/2019 %100 منجز 5 8 461.959.000 2019-09-02 150 الداخلية هدم وإعادة بناء مركز شرطة الشعب منجز الحويجة 150 23/7/2019 6 2019-09-02 8 %100 هدم واعادة بناء قسم مكافحة الاجرام الداخلبة الحوبجة %100 منجز 7 2019-09-02 13 23/7/2019 8 تنفيذ امانة تاهيل شارع القراغول في قضاء الحويجة %100 الطرق والجسور الحويجة 67,490,000 2019-12-22 45 منجز 8 منجز %100 الموارد المائية كركوك تجهيز مواد احتياطية لمحطات الضخ الكبرى في محافظة كركوك 370,000,000 9 2020-01-28 180 2019-12-31 215 / معدات استيرادية 2.809.849.000







تأهيل جسر التون كوبري / كركوك



تبليط الشوارع الداخلية في مناطق متفرقة في قرية البشير في ناحية تازة / كركوك







## إعادة اعمار وصيانة جسر زغيتون على طريق كركوك - تكريت






الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالي

					ستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدراا			
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الانجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	ت اسم المشروع
881,920,000	2019-08-04	210	2	100%	منجز	الطرق والجسور	الخالص	صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص (منصورية الشط بطول 25م , الجيزاني الامام بطول 1,5كم , السندية بطول 1,5كم , البوبالي بطول 1,5كم )
1,792,062,000	2019-09-02	180	32	100%	منجز	الطرق والجسور	المقدادية	تبليط شوارع في قرية سنسل (عدنان اللهبيي) وتبليط افرع الحساوية والحي العسكري وتبليط قرى الوسط وحمبس وجرخي اسيود وصيانة طريق الوجيهية
1,789,146,400	2019-10-02	240	33	100%	منجز	البلدية والبلديات	المقدادية	3 اكساء شوارع في ناحية ابي صيدا في قضاء المقدادية
	2019-10-02	240	33	100%	منجز	البلدية والبلديات	المقدادية	4 اعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية
	2019-10-02	240	33	100%	منجز	البلدية والبلديات	المقدادية	تاهيل شوارع في قضاء المقدادية ( حي التاميم - حي اشور - الحي العصري - حي 5 التحرير)
1,010,560,000	2019-09-15	210	38	100%	منجز	الطرق والجسور	خاتقين	صيانة واكساء طريق اشتوكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد في ناحية جبارة وقره تبه
1,511,600,000	2019-10-09	210	47	100%	منجز	الطرق والجسور	الخالص	تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والقرى التابعة لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقراها وقضاء بعقوبة وقراها
1,709,140,000	2019-10-13	90	49	100%	منجز	الكهرباء	المقدادية	ة تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربانية لناحية ابي صيدا وقراها
	2019-10-13	90	49	100%	منجز	الكهرباء	المقدادية	و تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربانية في مناطق متفرقة في السبكة الكهربانية في المقدادية
1,184,010,000	2020-06-23	180	50	0%	متوقف / تم المباشرة بالمشروع 23/6/2020 بعد حل المشاكل العالقة بين الطرق والجسور و مديرية الكهرباء وفقرة الاعمدة لم تحل لحد هذا التاريخ وتم توجيه كتاب حث 1 للشركة بتاريخ 29/9/2020 وبانتظار كتاب الصناعات الفولانية بخصوص اسعار الاعمدة 17/11/2020	الكهرباء	الخالص	تاهيل خط جهد 33 كي في وتحويله الى خط دبل سركت باستخدام اعمدة 14 م من محطة الغربية الى محطة جديدة الشط بطول 22 كم
771,600,800	2020-02-05	120	52	100%	منجز	البلدية والبلديات	الخالص	اعادة تاهيل الجزرة الوسطية طريق بغداد - كركوك في ناحية سد العظيم وتبليط شوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية
1,425,158,000	2019-11-07	180	56	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	المقدادية	صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى (رعد الفرج ,طامي , بني ويس , الأركوش عساكره)
1,947,480,000	2019-11-14	240	61	84%	قيد التنفيذ/ تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد/2 وتوجيه انذار بتاريخ 29/9/2020	البلدية والبلديات	خانقين	اعادة تاهيل شارع سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قرة تبة مع اكساء شوارع منقرقة لاحياء(الصدر - الشرطة - الشهداء - المشروع)
	2019-11-14	240	61	84%	قيد التنفيذ/ تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد/2 وتوجيه انذار بتاريخ 29/9/2021	البلدية والبلديات	خانقين	اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة المحليات الخاصة به
1,266,747,000	2020-01-16	180	64	100%	منجز	البلدية والبلديات	بعقوبة	العادة تاهيل شوارع في حي (الزهور والزهراء- المصطفى -الرسول والنور)قضاء عقوبة بلدروز
957,746,000	2019-12-16	100	73	100%	شوارع حي المعلمين منجزة بتاريخ 20/2/2020 والافرازات والحي العسكري	البلدية والبلديات	المقدادية	اعادة تاهيل شوارع (الافرازات -شوارع خلف معطة الغازفي الحي العسكري - شوارع حي المعلمين)
1,519,200,800	2020-01-19	360	83	100%	منجز	الداخلية	السعدية	17 هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء
	2020-01-19	360	83	100%	منجز	الداخلية	الخالص	18 هدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية
1,599,006,400	2020-01-26	100	87	100%	منجز	الكهرباء	خانقين	المجهيز مواد لتاهيل وتشييد خط 33كف دبل سركت اعمدة 14م من محطة بلدروز (19 كيم محطة مندلي 11/33ك بطول 45 كم
2,851,339,000	2020-01-08	180	91	100%	منجز	الصحة	بعقوبة	20 تاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي
576,050,000	2019-12-26	180	92	100%	منجز	التربية	السعدية	21 هدم واعادة بناء مدرسة الحليمة الابتدائية 12 صف
1,620,712,160	2020-02-03	210	99	100%	منجز	التربية	خانقين	22 هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 12 صف
	2020-02-03	210	99	100%	منجز	التربية	خانقين	23 هدم واعادة بناء مدرسة الفراهيدي 12 صف
4,125,000,000	2020-02-03	210	107	100%	منجز	الصحة	بعقوبة	24 تاهيل مستشفى البتول التعليمي للنسانية والاطفال
466,640,000	2020-01-08	120	111	100%	منجز / قيد الاستلام	البلدية والبلديات	قره تبة	25 صب الازقة وتبليط الشارع الحولي في القصبة القديمة قره تبه / تركمانية
	2020-01-08	120	111	100%	منجز / قيد الاستلام	البلدية والبلديات	جلولاء	اعادة تاهيل وصب الازقة القديمة بالكونكريت في محلة العروبة - جلولاء / 26 تكمالية
2,790,800,000	2020-01-09	210	140	100%	منجز	الطرق والجسور	بعقوبة	الهيل وتطوير طريق بعقوبة من تقاطع القدس الى مجسر الغالبية لممري الذهاب والإياب
728,000,000	2020-01-09	153 <b>100</b>	141	100%	منجز / قيد الاستلام	البلدية والبلديات	الخالص	للهبل طريق الزركانية سفيط , العودة, الدراويش,) المرحلة الثانية 5كم / قضاء لخالص
	2020-01-09	100	141	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	الخالص	29 تاهيل طرق الداينية
			-		-	-		

1,235,060,000	2020-01-06	200	145	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	خانقين	صيانة طريق سليمان بيك - كفري /مقطع محافظة ديالى	30
613,560,000	2020-01-29	180	148	100%	منجز	الطرق والجسور	بلدروز	تاهيل وتبليط شوارع في بلدروز	31
2,410,955,400	2020-01-09	180	149	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	خانقين	اعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحي الضباط في جلولاء	32
	2020-01-09	180	149	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	خانقين	اعادة تاهيل الشوارع في حي السلام الثاني في جلولاء	33
	2020-01-09	180	149	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	خانقين	اعادة تاهيل الشوارع الاربعة خلف مركز الشباب في جلولاء	34
1,656,448,000	2020-01-08	200	152	100%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	ناهيل طريق التحويلة من المحطة (صفر +صفر ) تقاطع سيطرة ابو نخل لمحطة (2+700)	
	2020-01-08	200	152	100%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	ناهيل شوارع قرية شيروين/ قضاء الخالص	36
	2020-01-08	200	152	100%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	ناهيل طرق سراجق العزبان والمحاذي لنهر الخالص والحي العسكري/ لمنصورية	
1,767,181,600	2020-02-18	210	155	100%	قيد التنفيذ	التربية	جلولاء	هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد(12 صف)في ناحية جلولاء.	38
	2020-02-18	210	155	100%	قيد التنفيذ	التربية	خانقين	هدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خانقين	39
	2020-02-18	210	155	100%	منجز	التربية	جلولاء	هدم واعادة مدرسة العلوم6 صف	40
	2020-02-18	210	155	100%	منجز	التربية	جلولاء	هدم واعادة مدرسة الفرات6 صف	41
300,300,000	2020-01-26	90	159	100%	منجز	الكهرياء	جلولاء	عادة تاهيل انارة الشوارع في مدينة جلولاء / ديالي / تركمانية	42
969,442,400	2020-02-15	300	170	86%	قيد التنفيذ	التربية	بعقوبة	هدم واعادة بناء قسم الإعداد والتدريب للتربية	43
1,171,138,000	2020-01-14	120	172	100%	منجز	الماء والمجاري	خانقين	تاهیل مشروع ماء خانقین	44
	2020-01-14	120	172	100%	منجز	الماء والمجاري	الخالص	تاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد	45
	2020-01-14	120	172	100%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري		لخط الناقل قطره (225) ملم لمنطقة جلوة واعغا وخليفة مع مضخة الرفع	46
708,240,000	2020-01-14	150	183	100%	منجز	البلدية والبلديات	العظيم	تاهيل الطريق الريفي لقرية خان الغرفة بطول 7.55م ولقرية الشيخ شنيف بطول 5.15م / ناحية العظيم	47
766,000,000	2020-02-09	90	195	100%	منجز / قيد الاستلام	الماء والمجاري	السعدية	ناهيل محطة ضخ السعدية التابعة لمشروع سد حمرين (يوجد فرق بين مبلغ لعقد والكشف التخميني) / تركمانية	
449,940,000	2020-01-14	180	197	100%	منجز / قيد الاستلام	الداخلية	بعقوبة	نأهيل بناية مديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الاقامة	49
429,936,000	2020-01-27	180	206	100%	قيد التنفيذ	الصحة	المقدادية	تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي رئيسي	50
900,000,000	2020-02-11	180	207	100%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	العظيم	مشروع ماء خان الغرفة/العظيم	51
981,985,000	2020-02-02		214	100%	منجز / قيد الاستلام	الكهرباء	السعدية	نجهيز محولات واسلاك واعمدة لقرى ناحية بني سعد وتاهيل وتغيير مسار مغذي القرى 11 كف في ناحية كنعان	52
827,048,000	2020-02-03	150	220	100%	منجز	الطرق والجسور	بعقوبة	ناهيل طريق الدوريين في ناحية العبارة /قضاء بعقوبة	53
	2020-02-03	150	220	100%	منجز	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل طرق في بهرز (خميس - علي الحمود)	54
1,500,000,000	2020-01-13	180	231	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طريق منصورية الجبل والقنطرة الصندوقية في قرية نوفل وتبليط قرية المنصورية	55
	2020-01-13	180	231	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	السعدية	نبليط طريق قرية بلاط الكبير وبلاط الصغير في ناحية قره تبة / تركمانية	56
888,000,000	2020-02-24	210	232	100%	منجز / قيد الاستلام	التربية	العظيم	هدم واعادة ثانوية السهول 12 صف	57
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الطرق والجسور	خانقين	عادة تأهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولاء ( مرحلة اولى )	58
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	قره تبة	نبليط طرق متفرقة في قرة تبة -جبارة / ديالى	59
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	قره تبة	عمار مزار السيد ابراهيم السمين في ناحية قرة تبة / ديالي	60
	-								

	2020-12-27	180	231	100%	الإضافي الأول /منجز	الطرق والجسور	السعدية	تبليط طرق في ناحية السعدية/ شوارع ربيعة العساكرة الخضراء بني ويس	61
921,000,000	2020-12-30	160	196	100%	الإضافي الأول /منجز	الماء والمجاري	الكاطون	توسيع مجمع ماء اليرموك من 600 م3/س الى 800 م3/مع تبديل الخط الناقل للعمارات السكنية	62
			214	100%	منجز	الكهرياء	السعدية	تأهيل شبكة كهرباء قرية ربيعة / السعدية	63
563,213,000		160	236		الإضافي الأول / فسخ عقد	الكهرياء	الكاطون	تأهيل مغذيات ال11كي في في المارة من مناطق الكاطون	64
		160	236		الإضافي الأول / فسخ عقد	الكهرياء		ايصال التيار الكهرباني لمشروع ماء الهارجة	65
3,135,626,560		180	241	73%	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الكاطون	تأهيل جزء من الشارع الثلاثيني بطول 1400 م خلف الفتطرة مع اكساء بعض الشوارع الفرعية	66
		180	241	73%	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الكاطون	اعادة تاهيل شارع مستشفى الرحمة للجزء المتبقي من السايد الثاني وبطول 1200 م.ط مع المقتربات	67
		180	241	73%	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الكاطون	اعادة تاهيل شارع الصحفيين والشوارع الفرعية ويطول 10000 م. ط	68
		180	241	73%	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الكاطون	اعادة تاهيل السايد الثاني لشارع الرازي من مدخل السيطرة وصولا الى امتداد شارع الحسينية وبطول 4000 م.ط	69
		180	241	73%	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الكاطون	تاهيل شبكات مجاري مياه الامطار	70
54,718,992,520		, ,		,				المجمو ع	

	الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالي													
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü				
712,233,600	2019-08-04	120	2019-07-22	6	%100	منجز	الماء والمجاري	ناحية بهرز	ايصال الماء الصافي لقرية جبارة	1				
	2019-08-04	120	2019-07-22	6	%100	منجز	الماء والمجاري	ناحية بهرز	تجهيز ونصب محطة تحلية سعة 0 5م3 ساعة في قرية الشيخ طامي / ناحية بهرز	. ,				
1,315,643,110	2019-08-06	200	23/7/2019	11	%100	منجز	الماء والمجاري	جديدة الشط	تأهيل مشروع ماء الحويش ـ جديدة الشط	3				
	2019-08-06	200	23/7/2019	11	%100	منجز	الماء والمجاري	بلدروز	تأهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون ـ بلدروز	4				
	2019-08-06	200	23/7/2019	11	%100	منجز	الماء والمجاري	ابي صيدا	تأهيل مشروع ماء ابي صيدا	5				
1,153,920,000	2019-08-21	180	2019-08-08	18	%100	منجز	طرق وجسور	الخالص	صيانة و تأهيل 4 كم من طريق السندية الرابط مع محافظة صلاح الدين	6				
510,000,000	2019-10-31	60	2019-10-31	58	%100	منجز	الكهرباء	المقدادية	تجهيز اعمدة كهربانية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية	7				
	2019-10-31	60	2019-10-31	58	%100	منجز	الكهرباء	بعقوبة - المقدادية	تجهيز محولات جهد 0,4/11 كف سعة 250 KVI عدد 40 لتأهيل شبكة كهرباء احياء المفرق و حي المعلمين و الكاطون					
1,461,010,000	2019-12-09	120	2019-11-11	65	%100	منجز	الكهرباء	العظيم - دلي عباس - المنصورية	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربانية للقرى المتضررة في ناحية العظيم و ناحية دلي عباس و ناحية المنصورية	9				
	2019-12-09	120	2019-11-11	65	%100	منجز	الكهرباء	بعقوبة	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية لاحياء (313 و303) مع تأهيل شبكة انارة الشوارع الرئيسية في التحرير / بعقوبة					
	2019-12-09	120	2019-11-11	65	%100	منجز	الكهرباء	جلولاء	اعادة تأهيل و تحسين و فك اختناق الشبكة الكهربانية لمناطق ناحية جلولاء قرى ( الشموخ ,شيخ بابا, جميلة,الاصلاح,امين الحبيب ,حي السلام,انارة الشارع بين القصبة القديمة و حي المشروع)	11				
701,772,500	2020-02-20	200	2019-12-26	119	%100	منجز	التربية	الخالص	اعادة تأهيل مدرسة صفية في قضاء الخالص	12				
	2020-02-20	200	2019-12-26	119	%100	منجز	التربية	الخالص	اعادة تأهيل ثانوية سعد الواقعة في قضاء الخالص	13				
	2020-02-20	200	2019-12-26	119	%100	منجز	الشباب والرياضة	الخالص	اعادة تأهيل ساحة (11) لاعب بمساحة (100*70) م	14				
497,921,480	2020-02-03	160	2019-12-08	82	%100	منجز	الماء والمجاري	المقدادية	استبدال الخط الناقل الرنيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا 500ملم دكتايل					
	2020-02-03	160	2019-12-08	82	%100	منجز	الماء والمجاري	المقدادية	صيانة مجمعات ماءسعة نصف مليون غالون /جلبي/ابي صيدا	16				
	2020-02-03	160	2019-12-08	82	%100	منجز	الماء والمجاري	المقدادية	تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون	17				
6,352,500,690	_	156							المجموع					

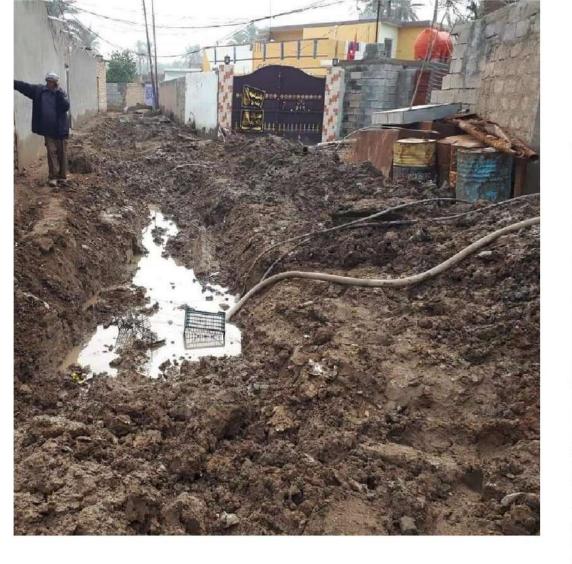



تبليط شوارع وافرع قرية الحساوية في قضاء المقدادية / ديالى



#### الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

		-/	<del>دا دا ن</del>	19 <del>-2-</del> / -9/9	وق إحادة الاحتدار ت	یہ مساریع صد	الصف الاستمار		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,051,360,000	2019-08-08	120	5	100%	منجز	الكهرياء	الطارمية	تاهيل مغذي 33 كي في ( مغذي ماء الكرخ - طارمية قديمة /طارمية جديدة وينظام الدبل سيركت)	
1,240,000,000	2020-02-16	150	237	100%	منجز	الماء	النهروان	نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة 9 نيسان / النهروان	2
2,273,600,000	2019-12-25	100	89	100%	منجز	البلدية والبلديات	الطارمية	تصليح وصيانة طريق مرمرة وطريق البوصالح الاحمد بطول 8كم	3
	2019-12-25	100	89	100%	منجز	البلدية والبلديات	الطارمية	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثانر الثانية- الطارمية	4
	2019-12-25	100	89	100%	منجز	البلدية والبلديات	الطارمية	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثانر الاولى وطريق البوفراس 8كم	5
	2019-12-25	100	89	100%	منجز	البلدية والبلديات	الطارمية	تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول 14000م وعرض 6 متر	6
2,298,000,000	2020-01-30	100	146	100%	منجز	البلدية والبلديات	التاجي	قلع وتوسيع واكساء طريق مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد -موصل الى موقع السجن بطول 6000 متر وبعرض 8 م	
	2020-01-30	100	146	100%	منجز	البلدية والبلديات	التاجي	قلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتداءا من طريق بغداد - الموصل الى منطقة المددة التابعة الى قضاء التاجي بطول 5000 متر وعرض 6 متر	
	2020-01-30	100	146	100%	منجز	البلدية والبلديات	التاجي	تصليح وتبليط واكساء طريق اللاين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة 12 ضباعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي الجديد بطول 10000متر وعرض 6 متر	
2,663,000,000	2020-01-02	100	138	100%	منجز	البلدية والبلديات	التاجي	قلع واعادة تبليط مع انبوب تصريف مياه الامطار لشوارع هور الباشا	10
	2020-02-12	100	138	100%	منجز	البلدية والبلديات	التاجي	تصليح واكساء طريق هور الباشا من شارع بغداد- موصل الى منطقة الشيخ عامر/قضاء التاجي	
329,420,000	2020-02-09	250	115	100%	منجز	التربية	الطارمية	هدم واعادة بناء مدرسة البواسل 9 صف في قضاء الطارمية	1
272,400,000	2020-01-03	120	167	100%	منجز	البلدية والبلديات	الطارمية	تأهيل واكساء طريق قرية الضحى	1
1,976,000,000	2020-01-25	180	164	100%	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	صيانة واكساء الشارع الممتد من حي البانوراما الى شارع البنية بطول 23000 م وعرض 7	
325,220,000	2020-02-09	120	223	100%	منجز	الصحة	المدائن	تأهيل مركز صحي الخناسة	_
1,636,111,350	2020-02-13	210	136	85%	قيد التنفيذ	التربية	المحمودية	هدم واعادة بناء مدرسة الرواشد	1
	2020-02-13	210	136	85%	قيد التنفيذ	التربية	المحمودية	هدم واعادة بناء مدرسة عباس بن فرناس	
	2020-02-13	210	136	85%	قيد التنفيذ	التربية	المحمودية	هدم واعادة بناء مدرسة المنامة	:
689,183,500	2020-02-11	180	184	100%	منجز	التربية	الطارمية	هدم واعادة بناء مدرسة الايثار الابتدانية 12 صف	•
340,000,000	2020-01-13	90	216	100%	منجز	الكهرباء	المدائن	اعادة تأهيل شبكات كهرباء في قضاء المدانن والقرى والنواحي	:
761,600,000	2020-01-15	210	144	100%	منجز	البلدية والبلديات	النهروان	تأهيل طريق القرية الهولندية وطريق فيصل مريخ	1 2
537,180,800	2020-02-09	180	208	100%	منجز	التربية	اللطيفية	هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد12 صف	. :
549,937,500	2020-01-21	100	191	100%	منجز	الكهرباء	أبو غريب	مشروع تاهيل انارة ابوغريب القديم	- :
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	الطارمية	تصليح وصيانة طريق شيخ رافع حاتم والطرق المجاورة له بطول 7كم	4 :
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	اطيفية	(,,,,	
					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	طارمية	صيانة وتصليح طريق الاسحاقي والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7 كم وعرض 5م / قضاء الطارمية	9 4
16,943,013,150	159							المجموع	

			2019 / بغداد	الية لعام (	موازنة الفيدر	ق إعادة الاعمار للـ	بة لمشاريع صندو	الخطة التشغيلب		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	تاريخ العقد	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,215,600,000	2019-09-22	90	2019-08-08	19	%100	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية /النهروان	1
	2019-09-22	90	2019-08-08	19	%100	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	تبليط شوارع قرية المهجرين الاولى /النهروان	2
	2019-09-22	90	2019-08-08	19	%100	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	تبليط طرق قرية الزيتية /النهروان	3
284,972,000	2019-10-28	180	2019-09-16	42	%100	منجز	الموارد المائية	ابو غريب	تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع (8) كم وناظم صدر ابو غريب	4
1,056,200,000	2019-11-23	150	2019-10-31	60	%100	منجز	الماء والمجاري	المدائن	تصليح الاضرار و مد شبكة امطار و صرف صحي في قرية الحرية	5
	2019-11-23	150	2019-10-31	60	%100	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	تبليط شوارع قرية الامام الرضا (ع)	6
	2019-11-23	150	2019-10-31	60	%100	منجز	البلدية والبلديات	المدائن	تبليط طرق حي الصدرين خلف القرية النفطية و المفروشة بالسبيس عن طريق محافظة بغداد بطول (2500م) و بعرض (5م)	7
536,943,000	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل مدرسة ابن الارقم الابتدانية	8
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل مدرسة اعياد الربيع	9
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل مدرسة الحضارة للبنات	10
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل مدرسة نور العلم	11
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غريب	اعادة تأهيل مدرسة القبة الزرقاء الابتدائية	12
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل ثانوية ابي غريب للبنات	13
	2019-12-27	60	2019-11-14	68	%100	منجز	التربية والتعليم	ابو غریب	اعادة تأهيل مدرسة المنامة الابتدانية	14
905,006,000	2020-01-20	100	2019-12-08	81	%100	منجز	الصحة	ابو غريب	تأهيل مركز صحي النصر و السلام	15
	2020-01-20	100	2019-12-08	81	%100	منجز	الداخلية	ابو غریب	تأهيل بناية الجوازات	16
	2020-01-20	100	2019-12-08	81	%100	منجز	الصحة	ابو غریب	توسيع و تأهيل مركز صحي عكركوف	17
	2020-01-20	100	2019-12-08	81	%100	منجز	الصحة	ابو غریب	توسيع و تأهيل مركز صحي الزيتون	18
645,424,000	2020-02-24	150	19/12/2019	108	%100	منجز	الماء والمجاري	المدائن	تاهيل مجمع ماء صالح الاحمد 50م3/ساعة	19
	2020-02-24	150	19/12/2019	108	%100	منجز	الماء والمجاري	التاجي/ الحماميات	مشروع مد انبوب ناقل للماء الصالح للشرب في منطقة شاطيء التاجي و بطول (40000م) و قطر (8 انج) في ناحية الحماميات	20
	2020-02-24	150	19/12/2020	108	%100	منجز	الماء والمجاري	المشاهدة	تاهيل مجمع ماء المشاهدة 200م3/ساعة	21
	2020-02-24	150	19/12/2021	108	%100	منجز	الماء والمجاري	المدائن	صيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام	22
250,000,000				تنفيذ امانة	%100	منجز / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	ابو غریب	تأهيل طريق قرية العفو بطول 3كم / ناحية النصر و السلام في قضاء ابو غريب	23
250,000,000				تنفيذ امانة	%100	منجز / تنفيذ امانة	مباني حكومية		إضافة وحدة الارشفة في مقر الصندوق	24
9,288,000				تنفيذ امانة	%100	منجز / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	التاجي	شراء انابيب لاكمال مشروع طريق حنون	25
180,000,000				تنفيذ امانة	%100	منجز / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	المدائن	تأهيل و اكساء طرق في قرية الامام السجاد خلف قرية المهجرين الثانية في ناحية النهروان بطول 2500 م	26
161,250,000		160		تنفيذ امائة	%100	منجز / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	المدائن	تأهيل و اكساء طرق في قرية الإمام الصادق / ناحية النهروان - قضاء المدائن بطول 1500م	27
5,494,683,000		100							المجموع	



#### الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بابل حالة المشروع الفني المناقصة رقم العقد العقد / تاريخ المباشرة الفعلي تاريخ الإنجاز الفعلي المناقصة الفني المناقصة الفني المناقصة المناقصة الفني المناقصة الم الناحية او كلفة العقد الأصلي القطاع اسم المشروع القضاء تنفيذ امانة 75 197,190,000 2019-11-10 2019-08-27 100% منجز جرف النصر الطرق والجسور تاهيل طريق المسيب - الصويرة 197,190,000 المجموع

# مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2020



## خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة نينوى

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ű
237,423,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	البلدية	الموصل	معالجة الجزرة الوسطية في مجسر الصحة الى مقتربات الجسر الثالث	1
200,425,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	الطرق	الموصل	تأهيل شوارع في حي التحرير مقابل جامع الزهراء	2
220,185,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	الداخلية	الموصل	اعادة تاهيل مكتب مطومات الموصل الايمن	3

658,033,000



#### خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة الانبار

كلفة النتفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفنى	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ú
248,900,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	الفلوجة	تأهيل الشارع الخدمي من الجسر الجديد الى تقاطع النقوس بطول 1500 م	1
249,700,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	الفلوجة	تأهيل الشارع الخدمي من تقاطع شارع السد الى تقاطع مجسر الاردن	2
220,700,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	الصقلاوية	أنشاء طرق فرعية في منطقة رميلة البو شجل المرحلة الاولى في الصقلاوية	3
215,275,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	هيت	تأهيل شارع الحمام في هيت	4
202,106,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	الشباب و الرياضة	حديثة	ترميم و تأهيل نادي حديثة الرياضي	5
249,975,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	الداخلية	عنه	منظومة جوازات عنه	6

1,386,656,000



### خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة صلاح الدين

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ป
194,750,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	الماء	تكريت / الدبسة	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 500م^3/ساعة	1
237,400,000	20-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	الطرق	سامراء	تأهيل طريق قرية السموم في سامراء	2
226,450,000	20-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	الطرق	سامراء	تأهيل و أكساء طريق داخلي مكيشيفة -سموم	3

658,600,000



### خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة ديالي

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü
121,837,500	21-12-20	100%	منجز	تشغیل <i>ي  </i> تنفیذ امانة	التربية	السعدية	تاهيل مدرسة ربيعة	1
246,400,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیل <i>ي  </i> تنفیذ امانـة	الطرق	بعقوبة	تبليط طريق حي الجامعة	2
220,000,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	الطرق	المقدادية	تبليط طريق قرية العقود	3
244,720,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفید امانـة	الطرق	الخالص	تأهيل طرق في جديدة الشط	4
197,500,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیل <i>ي  </i> تنفیذ امانة	الطرق	خانقين	تأهيل طريق قرية النصر في ناحية قره تبه	5



## خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة كركوك

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ป
179,547,500	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	مبا <i>تي</i> حكومية	حويجة	بناية الدائرة الزراعية في قرية الماحوز	1

179,547,500



## خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة بغداد

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفنى	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü
206,858,000	21-12-20	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	البلدية	ابو غريب	تأهيل بوابة مدخل قضاء ابو غريب	1
196,075,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	ابو غريب	تبليط شارع السكلات في قضاء ابو غريب	2
223,196,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	ابو غریب	تبليط مجموعة شوارع في حي مربع المدارس	3
227,575,000	21-12-20	100%	منجز	تشغيلي / تنفيذ امانة	البلدية	ابو غريب	تأهيل احياء في ابو غريب	4



### خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة - محافظة بابل

كلفة التنفيذ	تاريخ المباشرة الفعلي	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت	
195,233,500	2020-12-15	100%	منجز	تشغیلی / تنفیذ امانة	التربية	المسيب	تأهيل مدرسة البواسل الابتدائية	1	

195,233,500

# مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2021



#### مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021

	معدريع عمدوق العداف العدام المعاص المعاص المعاص المعاص المعاصدة المحاصدة ال										
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü	
4,315,912,500	2021-12-12	360	189	30%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شارع السايدين من نفق الجامعة الى نفق القصور	1	
579,850,000		210	196	29%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة	تلكيف	تاهيل مركز صحي نموذجي في حتارة /تلكيف	2	
4,376,350,000	2021-12-13	360	197	29%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير شارع الغابات من دورة الظلال الى دورة فندق نينوى اوبروي	3	
4,165,750,000	2021-12-13	360	212	27%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	اعمال تطوير الشارع من تقاطع الجسر الرابع الى مستشفى الحميات	4	
2,876,215,000	2021-12-15	330	227	34%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل الجزرات الوسطية ومقتربات المجسرات من تقاطع السكر الى الجسر الثالث والجزرات المجاورة لها	5	
980,469,000	2021-12-27	180	232	90%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	معالجة الشارع الممتد من دورة روضة النسور الى المتحف	6	
3,677,219,000		330	256	1%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الموصل	هدم واعادة انشاء عمادة كلية الطب / جامعة الموصل	7	
3,002,147,500	2022-01-05	300	264	38%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير الشارع من نفق القصور الى سايدين الرشيدية	8	
3,543,926,000	2022-02-02	330	282	2%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الموصل	هدم واعادة انشاء بناية الاقسام العلمية 4 طب الموصل /جامعة الموصل	9	
3,061,530,000	2022-01-12	300	301	29%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	ربط قرى المالحات وقبة الوهبي بطول 3,5كم مع تبليط الطبقة الثانية (البايندر) لطرق بليج تل العرج بطول 14,5كم	10	
2,859,337,800		330	335	15%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل بناية قطاع الحدباء	11	
		330	335	15%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	اعادة تاهيل بناية قطاع الربيع	12	
		330	335	15%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل بناية قطاع السلام	13	
		330	335	15%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل بناية قطاع الموصل الجديدة	14	
2,036,837,833		300	356	2%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية	الموصل	اعادة تاهيل بناية هندسة المرور	15	
3,196,875,000	2022-02-10	270	377	26%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الموصل	اعادة تاهيل مع اكمال انشاء شارع كورنيش البلدية	16	
4,260,567,500	2021-08-09	240	19	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير مدخل الموصل -ربيعة من نفق الصحة الى الهرمات	17	
3,994,597,000	2021-08-09	240	24	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير مدخل مدينة الموصل بغداد من دورة المكعبات وبطول 3,5كم	18	
3,732,010,000	2021-08-10	240	26	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير شارع اربيل من نهاية كوكجلي الى البوابة	19	
3,704,000,000	2021-08-10	240	28	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شارع سايدين نينوى اوبري وسايدين السدة الى مستشفى ابن سينا في الرشيدية	20	

كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ប្
3,202,550,000	2021-08-17	180	34	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شارع السايدين من تقاطع السكر الى الجسر الثالث	21
2,113,300,000	2021-08-25	240	42	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تبليط طرق ابو خشب القيروان -قضاء سنجار	22
4,350,625,000	2021-08-17	240	43	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شوارع في منطقة وادي حجر	23
2,614,525,000	2021-08-22	360	44	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل الشوارع في منطقة الزنجيلي/الجانب الايمن	24
3,290,070,000	2021-08-22	240	46	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شوارع حي الثؤرة	25
3,002,147,500	2021-08-23	360	47	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	معالجة واكساء شوارع متفرقة في مدينة الموصل الجانب الايسر والايمن	26
2,221,750,000	2021-08-24	210	50	87%	قيد التتفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شوارع في منطقة اليابسات وحي الإبار	27
4,121,443,500	2021-08-31	360	54	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير شارع كركوك من جسر وادي الشور الى سايدين يارمجة	28
3,060,375,000	2021-08-29	240	58	96%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تاهيل شوارع في منطقة الصناعة القديمة	29
4,353,520,000	2021-09-06	240	59	92%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الموصل	تطوير شارع دهوك من سايدين الرشيدية الى سيطرة القوسيات	30
242,973,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الموارد المانيه	الموصل	تأهيل بناية ادارة الدراسات و التصاميم الهندسية و التابعة لوزارة الموارد المانية في الموصل	31
142,710,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امائة	الماء و المجاري	الموصل	مد خط ناقل 250 ملم بولي اثيلين و بطول 1900 م و شبكة 110 ملم بولي اثيلين و بطول 1000م في قرية المنكوبة/ ناحية القيارة) في محافظة نينوى	32
239,250,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الموصل	تأهيل و تبليط و صب الطرق الداخلية لقرية الحود التابعة لناحية القيارة ) في محافظة نينوى	33
104,500,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امائة	الطرق والجسور	الموصل	تأهيل و تبليط الطريق الرابط من الشارع الرنيسي موصل -قيارة وصولا الى محلة الشهيد عبد المعين دنون في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة ) في محافظة نينوى	34
214,123,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مباني حكومية	الموصل	تأهيل ملعب سباعي بابعاد 30 * 50 م في موقع السماح	35
214,123,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مبان <i>ي</i> حكومية	تلكيف	تأهيل ملعب سباعي بابعاد 30 * 50 م في موقع الشلالات	36
214,123,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مباني حكومية	تلعفر	تأهيل ملعب سباعي بابعاد 30 * 50 م في موقع تلعفر	37
214,123,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مباني حكومية	الموصل	تأهيل ملعب سباعي بابعاد 30 * 50 م في موقع القيارة	38
233,500,000					قيد التنفيذ	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	تلعقر	انشاء وتبليط طرق خارجية و داخلية لقرية البشار التابعة لناحية العياضة	39
243,000,000					قيد التنفيذ	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	تلعقر	تاهيل طريق قرية ابطخ مشيرفة التابعه لناحية ربيعه	40

181



	<del></del>		<u> </u>			به من العصي	<del>,,,</del>		ماري حدري	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,153,999,000	2021-08-26	270	51	100%	منجز	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	تبليط شوارع في النساف	1
,,,	2021-08-26	270	51	100%	منجز	استثماري	البلدية والبلديات	الحيانية	تبليط شوارع القدس الحبانية	2
709,345,000		240	70		لم يتم تسليم الموقع من قبل الجهة المستفيدة	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة اغادير للبنين 12 صف	3
1,298,775,000	2022-02-10	210	389	25%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الكرمة	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 100م7/س في قرية بني زيد	4
2,164,050,000		270	242	25%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشارع القديم من تقاطع العباسي باتجاه الشارع العام في الفلوجة	5
3,707,669,000	2021-11-13	300	131	45%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	القائم	توسعة وتاهيل طريق الرمانة الرنيسي المرحلة الثانية بطول 1700م وعرض 25م	6
2,856,930,000	2021-11-13	330	133	43%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	القانم	تاهيل شوارع داخلية في حي 12 ربيع الأول في قضاء القانم/	7
	2021-11-13	330	133	43%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	القائم	تاهيل شوارع داخلية في ناحية الكرابلة/ القائم	8
3,296,260,000	2021-11-14	360	141	100%	منجز	استثماري	الماء و المجاري	ارمة	تاهيل وصيانة وحدة مجمع ماء سعة 200ه الساعة منطقة النباعي قرية بني زيد واكمال النواقص في المالة	9
	2021-11-14	360	141	100%	منجز	استثمارى	الماء و المجاري		جرير" كمال تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمنطقة تل الجبل (قرية كوبع) جزيرة الكرمة	10
	2021-11-14	360	141	100%	منجز	استثماري	الماء و المجاري		عمال طبهر ولعلب ولحدة ساء مبعث المنه على 200م المناطقة على المبين الرية مويي) بريرة المرسة المادة نصب مجمع ماء البو سودة والروفة سعة 200م الساعة في جزيرة الكرمة	11
	2021-11-14	360		100%		*			وعده نصب مجمع ماء البو سوده والروقة سعة 2000م الساعة في جريره العرمة	
2,053,460,000	2021-11-14	210	144	79%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	حديثة	تاهيل شارع معمل الحجر باتجاه مدخل حديثة الجنوبي في حي الشرطة	12
	2021-11-14	210	144	79%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	حديثة	ا تاهيل وتبليط شوارع في إحي المعلمين وحي بني داهر) ضمن قضاء حديثة	13
2,374,385,000	2021-11-23	240	153	68%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شوارع حي الفناتين في الفلوجة	14
4,520,260,000	2021-11-27	360	156	28%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تأهيل شوارع حي الجغيفي في الفلوجة	15
3,398,566,500	2021-11-24	360	160	30%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تأهيل الشوارع الخدمية لشارع 60 من تقاطع التقوى وصولا الى النهر / الفلوجة	16
1,192,448,000	2021-11-29	300	168	30%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	حديثة	نشاء بوابة مدخل ناحية بروانة الشمالي	17
, - , -,	2021-11-29	300	168	30%	قيد التنفيذ	استثماري	مبائى حكومية	حديثة	إعادة انشاء مديرية ناحية بروانة	18
2,347,000,000	2021-11-21	240	171	100%	منجز	استثماري	البلدية والبلديات	الكرمة	تأهيل طرق في منطقة الرشاد واللهيب في قضاء الكرمة	19
764,910,000	2021-11-30	180	174	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	الحبانية	تاهبل طريق البو دمنة في ناحية حصيبة الشرقية بطول 7525م / الحبانية	20
7,054,956,750	2021-12-26	270	175	38%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	البغدادي	اعادة تاهيل جسر الشهيد وحيد ومقترباته على نهر الفرات في ناحية البغدادي	21
1,867,025,000	2021-12-02	240	178	2%	قَبِد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الرمادي	إعادة تاهيل شارع الميثاق في الرمادي	22
2,773,520,000	2021-12-06	270	179	30%	قَبِد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الكرمة	تاهيل طريق البوحداد والبوعوسج بين نهر اللهيبية ونهر التميمي	23
4,369,860,000	2021-11-28	360	181	46%	قَبِدُ الْتَنْفَيْذُ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شوارع في حي اليرموك (المرحلة الرابعة) في الفلوجة	24
4,368,000,000	2021-11-26	360	184	75%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	المول شوارع عي سي مود بلدية الحبانية	25
602,910,000	2021-12-20	270	185	37%	قيد التنفيذ	استثماری	مبانی حکومیة	الفلوجة	تاهيل مجمع اتصالات الفلوجة	26
930,940,000	2021 12 20	300	188	32%	قيد التنفيذ	استثماری	البلدية والبلديات	الصقلاوية	هدم وإعادة بناء مديرية بلدية الصقلاوية	27
1,824,845,000	2021-12-05	210	191	65%	قيد التنفيذ	استثماری	البلدية والبلديات	الكرمه	ما و بعد به / ساري بيد بيدوي تاهيل الطرق الواقعة بين شارع 20 وشارع التميمي في الكرمة	28
1,686,650,000	2021-12-03	300	192	72%	قيد التنفيذ	استثماری	البنية والبنيات	الكرمة	حمون العربي الواسعة بين العرب 20 وتعترج العميسي في العربية العربية اللبنين في الرمادي العربية اللبنين في الرمادي	29
1,000,000,000				/-	1	*		,		
	2021-12-10	300	192	2%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية	الرمادي	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام الغزالي 12 صف الابتدائية للبنين في الرمادي	30
1,107,401,000	2021-12-10	270	193	86%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرياء	الحبانية	تاهيل مغذي مزدوج 33كف بطول 8كم لتغذية محطة الخالدية 11/33كف من محطة الملاحمة 11/33كف / الحبانية	31
890,905,500	2021-12-09	270	194	70%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الفلوجة	تجهيز ونصب مجمع ماء الصوفية/ الحلابسة والمناطق المجاورة لها سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة / الفلوجة	32
1,359,000,000	2021-12-15	360	199	21%	قيد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية	عنه	هدم وإعادة بناء دار القضاء في عنه	33
1,133,475,000	2021-12-15	240	204	43%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	القائم	إعادة اكساء شوارع في المدينة السكنية في العبيدي بطول 13000م.ط/ القائم	34
1,342,590,000	2021-12-04	180	206	81%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية	الممادي	مشروع انشاء السياج الامني كونكريتي مع ابراج كونكريتية	35
498.000.000	2021-12-05	180	207	89%	قيد التنفيذ	استثماری	الكهرياء	الفلوجة	تاهيل الخط الناقل للشبكة الكهربانية لمول الفلوجة	36
3,916,410,000	2021-12-12	300	215	83%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	.,	اعَّدَةَ انشَاء مجمع ماء لتَغَنِّهُ وَوَرَ واطنهُ الكَلْفَةُ الاول والثاني وتوزيع الشهداء والجرهي في السكنية وهي الارامل ومنطقة حصيوات والبوجويلة سعة 400 م3/ساعة / الانبار	37
4,281,107,800	2021-12-07	360	216	40%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	إعادة تاهيل شارع 60 من تقاطع التقوى الى تقاطع 40 الرابط بالجسر الثالث (السايدات الرئيسية) في قضاء الفلوجة	38
	2021-12-07	360	216	40%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	العادة تاهيل دوار الساعة في قضاء الفلوجة	39
1,473,250,000	2021-12-12	180	217	85%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الكرمة	عادة تبليط طرق متفرقة في منطقة الهريمات. العامرية وإعادة اكساء طريق جسر بزيبز من الجسر الحديدي باتجاه بغداد/ الكرمة	40

	<u> </u>		7 7-		- " - "		<i></i>	<u> </u>	<u> </u>	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلى	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفنى	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	٢
1,382,522,200	2021-12-20	360	225	55%	قد التنفيذ	استثماري	مبانى حكومية	الرطبة	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الرطبة	41
4,119,500,000	2021 12 20	270	230	30%	قبد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	تاهيل الشارع الحولي من حي المعتصم باتجاه حي الأمين ضمن حدود بلدية الحبانية	42
, , ,	2021-12-31	270	246	30%	قيد التنفيذ	استثماري		1 1	ديون المعارع الموري من عني المعتمم بالمباد عني الأمين معمل معارد بدية المبارية الفرات هذم وإعادة بناء مديريه ناحية الفرات	
1,778,120,000	2021-12-31	2/0	240	30%	متر استعتر	استماري	مباني حكومية	هيت	مدم واعده بناء مديرية تلكية العرات تاهيل طريق البوعلي بطول 1.5 كم وعرض 10 م في قرية الخفاجية ناحية الحقلانية /	43
327,220,000	2022-01-03	180	252	29%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	حديثة	قضاء حديثة	44
	2022-01-03	180	252	24%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	هيت	تاهيل طريق البودرج بطول 1100م وعرض 5 م في قضاء هيت الناحية الفرات	45
343,500,000	2022-01-04	150	260	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	هيت	تاهيل طرق المشتل بطول 3.5كم و عرض6 م في قضاء هيت	46
951,310,000	2022-01-05	300	267	20%	قيد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية	عنه	هدم وإعادة بناء فانمقامية قضاء عنه و دار القانمقامية في القضاء	47
3,841,000,000	2022-01-11	360	272	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الموارد المانيه	الرمادي	تاهيل وتطوير المبزل الرنيسي من بوابة (شرق الرمادي) الى المصب في المضيق ( المرحلة الأولى) بطول 3700م	48
4,298,099,000	2022-01-24	270	280	9%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور		تاهيل طريق الجرايشي من محطة 4000 الى المحطة ( 4000) و يعرض 26.5 باعتبار المحطة 4000 الجسر الفوقاني على طريق المرور السريع	49
4,323,494,000	2022-01-17	270	285	20%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	تاهيل الشارع العام والشوارع الخدمية ومقتربات جسر الناظم ضمن حدود بلدية الحبانية	50
3,749,667,500		270	289	54%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الصقلاوية	انشاء وحدة ماء مجمعة سعة مليون غالون في منطقة البوشجل- ناحية الصقلاوية	51
, , ,		270	289	59%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الصقلاوية	انشاء وحدة مجمعة مليون غالون في منطقة الطالعة ناحية الصقلاوية	52
		270	289	28%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الصقلاوية	إعادة انشاء مشروع ماء العبيدي 200م3/ساعة مشروع ماء مخيم الموظفين	53
		270	289	39%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الصقلاوية	تجهيز ونصب وحدة مجمعةً سعة 200م³/ساعة الحماميات -الخالدية	54
1,265,860,000	2022-01-24	210	291	30%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين الطريق الحولي وشارع 30 بطول 1250م وعرض30م في عامرية الصمود / الانبار	55
4,252,500,000	2022-01-17	300	294	65%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الفلوجة	هدم وإعادة انشاء مجمع ماء سعة 600 م3 / ساعة لتغذية المنطقة الجنوبية ( احياء الأمين والمامون والمعارض جامعة الفلوجة موقع السريع	56
4,309,050,000	2022-01-17	300	295	85%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري		هدم وإعادة انشاء مجمع ماء الجغيفي 2 سعة 200 م3/ساعة المرحلة الثانية مع الربط مع مجمع المرحلة الأولى مع تنفيذ الخط الناقل	57
1,766,530,000	2022-01-20	210	296	72%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الرمادي	انشاء طريق فوق المبزل في منطقة حصيبة الشرقية احمد صلال وخلف احمد بعرض 20	58
629,667,000	2022-01-24	300	299	13%	قيد التنفيذ	استثماري	الشباب والرياضة	حديثة	هدم وإعادة انشاء مركز الشباب/حديثة	59
4,368,900,000	2022-01-17	270	302	31%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الفلوجة	وكراج الاليات / الانبار p5و و p5و p4تاهيل محطات مجاري شارع أربعين و	60
300,000,000	2022-01-17	150	303	70%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات		تاهيل شارع من نهاية السوق الى الشارع امام المدرسة النموذجية ضمن حدود بلدية النخيب	61
1,644,674,750		300	304	1%	قيد المباشرة	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء ثانوية ام المؤمنين للبنات 18 صف	62
849,505,000	2022-01-17	300	305	60%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	هيت	تاهیل کراج بلدیة هیت	63
329,100,000	2022-01-24	180	306	100%	منجز	استثماري	الماء و المجاري		تجهيز نصب وحدات طاقة شمسية عدد/3 مع تجهيز مواد احتياطية لمركز ماء الوليد	64
1,499,645,000	2022-01-17	210	307	89%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور		تاهيل مجموعة طرق في منطقة البوعساف/ الطرابشة بطول 15550 م	65
3,620,099,750		300	309	3%	قيد المباشرة	استثماري	التربية	الحبانية	إعادة بناء تاتوية زيد بن الحارث للبنين 18 صف في قضاء الحبانية	66
		300	309	5%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم واعادة بناء مدرسة النصر 12 صف	67
		300	309	2%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم واعادة بناء مدرسة الخالصة النموذجية 12 صف	68
1,971,700,000	2022-01-17	240	310	65%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الرطبة	تاهيل شوارع في احياء الميثاق الجديد والمطار الجديد والانتصار في قضاء الرطبة	69
4,281,576,000		270	311	37%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	تاهيل شوارع في حي المعتصم وحي الخلفاء ضمن حدود بلدية الحبانية	70
4,293,650,000	2022-02-28	300	312	73%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري		هدم وإعادة انشاء مجمع ماء البو سودة والبو خليفة وكري اطراف ذراع دجلة سعة 400 م3 / ساعة	71
4,281,490,000	2022-01-17	300	313	78%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الحبانية	هدم وإعادة بناء مخازن مديرية ماء الانبار / المرحلة الأولى	72
746,020,000		270	314	50%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري		إعادة بناء بناية مركز مجاري القائم	73
217,500,000	2022-02-05	120	315	15%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	هيت	إعادة تأهيل شوارع في ناحية المحمدي	74
2,002,729,000	2022-02-01	240	318	62%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الرمادي	تبليط طريق فوق المبزل في منطقة البو ضليل بطول 1300 م وعرض 20 م	75
1,000,000,000		300	319	4%	قيد المباشرة	استثماري	مباني حكومية		هدم وإعادة انشاء بناية ملاحظية التسجيل العقاري في الخالدية	76
951,251,500	2022-02-05	300	320	20%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء		إعادة بناء مركز صيانة كهرباء الفلوجة الجنوبي	77
1,132,100,000	2022-01-17	300	321	20%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة بلال الحبشي الابتدائية 12 صف في المشحنية	78
4,317,400,000	2022-01-17	270	322	26%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	الحبانية	تاهيل الشارع الحولي ضمن التصميم الأساسي المحدث لمديرية بلدية الحبانية	79
1,948,382,000		270 <sup>4</sup>	323	52%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري		إعادة تاهيل شبكات الماء في حديثة	80

	<u> </u>		\ *		<del>,                                    </del>	, · · · ·	<del>,,,</del>		<del>55 C.5</del>	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
		270	323	52%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجارى		إعادة تاهيل مجمع ماء البوحياة / قرية بهصة سعة 100م3/س في ناحية الحقلانية	81
		270	323	52%	قيد التنفيذ	استثماری	الماء و المجاري		إعادة تاهيل مجمع ماء البوحياة الشرقي سعة 100م3/س في ناحية الحقلانية	82
916,050,000	2022-01-18		324	18%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		تاهيل وترميم مستشفى العامرية العام والعيادة الاستشارية	83
1,644,674,750		330	327	21%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة ام الطبول الابتدائية 18 صف في الصبيحات	84
1,242,556,000	2022-01-24	240	328	82%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء		تأهيل الشبكة الكهربانية لقضاء الكرمة ونواحيها (ضغط واطئ)	85
	2022-01-24	240	328	82%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء		تاهيل الشبكة الكهربانية الضغط العالي والواطى لقضاء الكرمة ونواحيها	86
1,395,160,000	2022-01-24	150	329	100%	منجز	استثماري	الكهرباء		تجهيز مواد ساندة لفرع توزيع كهرباء شرق الانبار	87
1,018,990,000	2022-01-24	270	330	27%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية	الفلوجة	هدم وإعادة بناء جملونات مخازن الكتب قياس ( 18*40 ) م عدد (4) مع الجناح الاداري / الفلوجة	88
394,508,000		180	331	65%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		ترميم مدارس المجمع السكني في العامرية	89
1,300,000,000	2022-01-17		332	90%	قيد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية	البغدادي	إعادة اعمار 10 دار وقاعة ضيافة تابعة +دار كبير +مولد 50 كي في التابعة للإدارة المحلية قرب مستشفى طوارئ البغدادي	90
1,317,500,000		210	333	3%	قيد المباشرة	استثماري	البلدية والبلديات	القانم	تاهيل شوارع رئيسية من الشارع الرئيسي آلى الشارع الحولي الجنوبي في القائم	91
2,128,708,000		300	334	30%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		هدم وإعادة بنَّاء ثانوية هاجر للبنات 18 صف	92
		300	334	30%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		هدم وإعادة بناء مدرسة جميلة بوحيرد الابتدائية المختلطة 6 صف	93
320,950,000	2022-02-01	180	337	43%	قيد التنفيذ	استثماري	الزراعة		إعادة انشاء مستوصف بيطري لمنطقة النعيمية والدفار	94
3,612,100,000		330	339	20%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		إعادة تاهيل مدرسة الإرادة الابتدائية في زنكورة الثانية للبنات 12 صف	95
		330	339	20%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		اعادة تاهيل مدرسة القعقاع الابتدائية 12 صف في القرية العصرية	96
		330	339	20%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة العامل الابتدائية 12 صف في البوخليفة	97
1,556,167,500	2022-01-24	270	340	89%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري		إعادة تاهيل وحدة ماء اليونسيف بسعة 200 م3 في القرية العصرية	98
678,220,000	2022-01-17	270	342	90%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية		هدم وإعادة بناء امرية قاطع مرور الرطبة	99
2,760,010,000		330	343	9%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي طابقين في البو عبيد مع دار سكن مزدوج للطبيب و مركز اسعاف فوري وصالة ولادة	100
		330	343	9%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		هدم وإعادة بناء مركز صحي فرعي مع دار سكن في السعدان والعناز قرية الرحمة	101
1,238,036,500	2022-01-24	330	344	35%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة المفلحون الابتدائية للبنين 6 صف	102
	2022-01-24	330	344	29%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسةالفهد الابتدائية 12 صف / الحصي	103
1,644,674,750	2022-01-24	330	345	17%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء متوسطة الجاحظ للبنات 18 صف في الفلوجة / الجولان	104
1,132,100,000		300	346	15%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية		هدم وإعادة بناء مدرسة عامرية السلام الابتدائية للبنين 12 صف	105
452,225,000	2022-01-17	240	347	88%	قيد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية	القانم	إعادة تاهيل بناية الاثار في القائم	106
1,131,313,000	2022-01-24	300	348	12%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية	الحبانية	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن البيطار الابتدائية للبنين 12 صف في الحبانية	107
1,541,000,000	2022-01-17	300	349	42%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		انشاء مركز صحى رئيسى طابقين فى العبيدي	108
, , ,	2022-01-17	300	349	42%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		انشاء مركز صحى فرعى حى الننك - القائم	109
1,302,463,500	2022-02-01	240	351	45%	قيد التنفيذ	استثماري	الموارد المانيه		إعادة انشاء كورنيش لضفة نهر الفرآت الجآنب الأيمن في هيت (المرحلة الثانية)	110
2,500,000,000	2022-01-17	300	352	89%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية		إعادة انشاء بناية قسم شرطة قضاء الحبانية	111
3,368,550,000	2022-01-24	270	353	21%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي		هدم وإعادة انشاء سياج الموقع الجامعي	112
350,000,000	2022-01-24	210	354	30%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	عنه	تاهيل بناية مركز مجاري عنه	113
1,792,735,000	2022-02-10	210	357	60%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء	الحبانية	تشييد مغذي مزدوج 33 كف بطول 13 كم باستخدام عمود مشبك 14 م لتغذية محطة الخالدية 11/33 كف المرحلة الثانية	114
1,000,000,000		270	358	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	القانم	إعادة انشاء مجمع ماء الدرة سعة 200 م/ 3س داخل مشروع القائم الموحد	115
843,325,000	2022-01-17	300	359	22%	قيد التنفيذ	استثماري	التربية	الرمانة	هدم وإعادة بناء متوسطة الفضيلة 12 صف في قرية ختيلة/ قضاء الرمانة	116
1,540,000,000	2022-01-17	210	360	27%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات		تاهيل شارع 30 في حي الربيع مع مد شبكة مجاري مياه الامطار في قضاء الكرمة	117
2,345,160,000	2022-01-24	240	363	75%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء		تاهيل مغذيات النساف المقترحة الثابتة 11 كف	118
688,000,000	2022-01-24	180 5	364	27%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	عنه	تاهيل وتبليط طرق في قضاء عنه المرحلة السكنية الثانية بطول 6 كم	119
2,231,520,000	2022-01-17	300	365	89%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية		إعادة انشاء بناية فوج طوارئ الانبار الرابع في الفلوجة	120

	عه ۱۵ تبار	20,	ب د عدم ۱ ک	ررته الانصاد	ے اور ماہید سمو	ره س رسسيا	اعق المنتصرر	ושונה ושמול וומם	مساريع عساوو	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
	2022-01-17	300	365	89%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية		اعادة انشاء بناية مركز شرطة الخالدية	121
3.501.300.000		270	366	20%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات		انشاء شارع خدمي يربط دوار الساعة بدوار جسر السكنية في الفلوجة	122
1,671,651,000		300	367	18%	قبد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية		إعادة اعمار معمل السجاد اليدوى في عنه	123
.,,		300	367	18%	قيد التنفيذ	استثماري	مباتى حكومية		إعادة تاهيل بناية من طابقين لادارة معمل خياطة عنه	124
2,000,505,500	2022-01-17	270	368	54%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	الرمادي	تجهيز وتنصيب مجمع ماء سعة 200 م3 / ساعة لناحية المحمدي مع تاهيل مجمع ماء المحمدي الجديد	125
470,000,000	2022-01-17	240	370	37%	قيد التنفيذ	استثماري	مبائى حكومية		إعادة انشاء بناية مجمع اتصالات هيت	126
1,059,087,500		210	372	17%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	بروانة / حديثة	إعادة تاهيل وتبليط طريق السنجك بروانة بطول 4 كم وعرض 10 م باعتبار تقاطع الطريق مع مدخل مجطة التعينة وقود بروانة نقطة 00+00	127
452,874,000	2022-01-17	210	373	95%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربانية الهوانية من محطة وقود الكرمة الى محطة كرمة 2-منطقة الزراعة - البعيدالعودة - منطقة فورة العشرين)	128
	2022-01-17	210	373	95%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربانية الهوانية المتضررة لمغذي الخيرات من سور بغداد الى منطقة البورات المتعدد الى المنطقة المتعدد ال	129
368,410,000		150	374	18%	قيد المباشرة	استثماري	البلدية والبلديات		ناهيل طرق ريفية في زويغير بطول 4.47كم	130
399,296,000		180	375	80%	قيد التنفيذ	استثماري	الداخلية	القائم	إعادة بناء بناية قسم مرور القانم	131
1,635,088,000	2022-01-24	240	376	52%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	حديثة	تاهيل وتبليط شارع الكورنيش مع شوارع داخلية ضمن قضاء حديثة	132
490,117,000		150	378	72%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل مبنى كلية الاداب القاعات الدراسية / جامعة الانبار	133
243,060,000	2022-02-05	120	379	60%	قيد التثفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	حديثة	اعمال احياء الازقة القديمة من الطريق الرئيسي باتجاه نهر الفرات بطول 1325 م ومعدل عرض 3م في ناحية بروانة	134
542,185,000	2022-02-03	210	380	42%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل بناية عمادة كلية الاداب / جامعة الانبار	135
2,371,953,000		330	381	21%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الفلوجة	توسعة كلية العلوم الإسلامية ( العمادة والنادي الطلابي ) في جامعة الفلوجة	136
1,477,482,500		210	382	22%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل واجهات بناية القسم العلمي لكلية التربية الرياضية / جامعة الانبار	137
		210	382	22%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	إعادة انشاء بناية مكتبة كلية التربية للبنات / جامعة الانبار	138
		210	382	22%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالى	الرمادي	تاهيل واجهات بنايات كلية القانون والعلوم السياسية	139
2,317,509,800	2022-02-24	270	384	26%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالى	الرمادي	اعادة تاهيل بناية المختبرات العلمية / كلية الزراعة	140
, ,	2022-02-24	270	384	26%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل بناية كلية التربية للعلوم الإنسانية والصرفة في الموقع الجامعي / جامعة الانبار	14:
	2022-02-24	270	384	26%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل سقف الورش الهندسية / قسم الميكانيك لكلية الهندسة / جامعة الانبار	14
	2022-02-24	270	384	26%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالى	الرمادي	تاهيل الجناح الإداري في قسم الميكاتيك / الطابق الأول لجامعة الانبار	14
	2022-02-24	270	384	26%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل واجهات عمادة كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الانبار	14
1,895,150,000	2022-01-17	240	386	32%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديآت	الرطبة	تاهيل شارع الزيتون والافرع المحيطة به في قضاء الرطبة	14.
1,047,242,900		270	387	24%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالى	الرمادي	تاهيل ابنية كلية العلوم الإسلامية/جامعة الانبار	14
,- , ,		270	387	24%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالى	الرّماديّ	تاهيل ابنية ومسقفات وسياج النقل والاليات في الموقع الجامعي	14
2,801,380,000		240	251	20%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	_	تاثيث طريق رمادي فلوجة - الكرمة بطول 56 كم	14
	2022-02-10		389	25%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	راوه	تجهيز مضحات افقية لمجمعات ماء راوة	14
4,471,695,000	2021-08-24	180	18	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الحبانية	تأهيل الشارع الخدمي من جسر الصديقية الى بلدية الحبانية وتطوير الشارع العام الى جسر الناظم	15
3,477,550,000	2021-08-24	180	20	87%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الرمادي	تأهيل قناة اروانية مبطنة في منطقة البوعيثة	15
, , ,	2021-08-24	180	20	87%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الرّماديّ	محطة ري ومد أنبوب في البوعبيد	15
3,037,819,250	2021-08-24	180	21	75%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الرّماديّ	تأهيل سُدَّة البو عيثة - المرحلة الثانية	15
1,005,065,789	2021-08-24	180	30	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	القائم	تأهيل وتوسيع شارع مركز الشباب ضمن مركز قضاء القانم	15
983,275,000	2021-08-24	180	36	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	مباني حكومية	الوفاء / الرمادي	هدم وإعادة بناء مديرية ناحية الوفاء	15
1,195,964,000	2021-10-07	240	37	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	راوه	هدم وإعادة بناء مركز شرطة راوه	15
669,100,000	2021-08-24	180	39	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الرمادي	عادة تأهيل القناطر الصندوقية المدمرة على طريق رمادي - سامراء من المحطة (0+00) فلكة الجسر اليو فراج الى المحطة (1+00)	15
1,868,771,930	2021-08-24	150	40	100%	منجز	برامج خاصة	التعليم العالى	القائم	تأهيل سياج حول مجمع الكليات في القائم المرحلة الثانية / جامعة الانبار	15
4,301,990,000	2021-08-28	300	41	72%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الكرمة	تأهيل الطريق الرئيسي من مفرق الرشاد الى تقاطع البو سودة في الكرمة	159
· · ·		240	48		قيد التنفيذ			القائم		
1,181,929,000	2021-08-31	∠40	48	76%	هتر استعتر	برامج خاصة	الطرق والجسور	القائم	تأهيل طريق القائم - العبيدي ( الشهيد حيدر )	160

186

	J+#/ -	- 20		2, -J,	<del></del>	<del> , O ,</del>	,,, <u> </u>		<u> </u>	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
945,740,000	2021-08-25	240	52	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الرمادي	تأهيل الطريق المحاذي لنهر الفرات ومعمل الزجاج	161
1,276,000,000	2021-09-01	240	53	68%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الرمادي	تأهيل الشوارع الرئيسية في حي الجامعة	162
2,190,500,000	2021-09-06	360	55	100%	منجز	برامج خاصة	الصحة	هيت / البغدادي	إعادة انشاء مستشفى طوارئ البغدادي 25 سرير (بناية القسم الخاص وبناية القسم العام)	163
488,000,000	2021-09-07	180	63	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	عنه	تطوير وتبليط الشوارع الرنيسية في ناحية الريحانة بطول 4 كم	164
2.250.000.000		360	65	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الرمادي	وير وبيا المرورع الربياني في في المريات بالرباط المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المراب المروب المراب الم	165
2,200,000,000	2021-08-31	360	65	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الرمادي	اعادة انشاء قسم الاليات والمعمل	166
1,251,630,000	2021-09-13	270	66	88%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الكرمة	- تاهيل شارع البلدية والشوارع المرتبطة به + شارع اللهيبية في حي الصمود	167
612,718,000	2021-09-07	240	67	82%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الرطبة	اعادة بناء دائرة أحوال الرطبة والبطاقة الوطنية	168
4,665,380,000		360	69	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	<u>الطرق والجسور</u>	الصقلاوية	ما المرابع المرابع و المسلم المرابع المرابع و المرابع	169
	2021-09-09	360	69	77%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الكرمة / ناحية الخيرات	- وق عن المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى	170
	2021-09-09	360	69	77%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الكرمة	إعادة تأهيل الطريق الرابط بين جسر الشيخ عامر الى مرقد بنات الحسن بطول 8كم	171
2,155,000,000	2021-09-04	360	71	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الرمادي	إعادة انشاء قسم الحسابات والإدارة	172
	2021-09-04	360	71	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الفلوجة	إعادة انشاء مركز شرطة الشهداء	173
780,680,000	2021-09-15	360	74	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الكرمة	إعادة انشاء جسر بطول 24 م في منطقة السماك جدول إبراهيم بن علي في الكيلو متر (11+200)	174
	2021-09-15	360	74	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الكرمة	إعادة انشاء جسر بطول 24 م في منطقة المويلحة والاصبيح على المبزل الرئيسي (DD+00	175
	2021-09-15	360	74	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الكرمة	إعادة انشاء جسر بطول 24 م في منطقة البو مكلد جدول إبر اهيم على في الكيلو متر (0+700)	176
	2021-09-15	360	74	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الكرمة	إعادة انشاء جسر بطول 24 م في منطِقة الحلابسة (الحويجة) في قضاء الكرمة	177
722,740,000	2021-09-20	180	78	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الرطبة	تأهيل وتبليط شوارع في قضاء الرطبة	178
4,306,592,750	2021-09-21	360	79	61%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الرمادي	تأهيل شارع الصوفية من تقاطع جامع الوارث في البعلوان الى الحولي الشمالي بعرض (20)م	179
1,703,810,000	2021-09-20	330	81	92%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الموارد المانيه	الرطبة	إيصال الماء من سد حوران الى مدينة الرطبة	180
875,864,000	2021-10-01	240	93	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	حصيبة الشرقية / الحبانية	تأهيل طرق ريفية في ناحية حصيبة الشرقية	181
1,496,955,000		360	105	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التربية	الصقلاوية / الفلوجة	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف متوسطة المصير المختلطة / الصقلاوية	182
100 100 000	2021-10-21	360	105	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التربية	الفلوجة	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف عبد الله بن عمر / النعيمية	183
492,400,000		150	106	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الرطبة	اعمال التكسية الحجرية للاكتاف وادي حوران في الرطبة	184
4,320,674,000	2021-10-21 2021-10-13	150 360	106 108	100%	منجز منجز	برامج خاصة برامج خاصة	البلدية والبلديات الموارد المانيه	الرطبة الرمانة	عمال التكسية الحجرية للاكتاف وادي المساد في الرطبة تأهيل وتوسيع مجمع ماء اليو حردان - الحميضية مع مد ناقل رنيسي وشبكة فرعية - قضاء	185 186
	2021-10-13	360	108	100%	منجز	برامج خاصة	الموارد المانيه	الرمادي	الرماية	107
	2021-10-13	360	108	100%	منجز	برامج خاصة	الموارد المانيه	بروانة / حديثة	كَجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200ه/ساعة في منطقة البوفراج إعادة انشاء مجمع ماء (الشاعي والطحانين) سعة 200ه / الساعة في ناحية بروانة قضاء حددثة	187 188
1,159,038,130	2021-11-01	270	123	75%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	هيت / كبيسة		189
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2021-11-01	270	123	40%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	هيت / كبيسة	تأهيل شارع دور البلدية وشارع دانرة الكهرباء المرتبطة بشارع السوق القديم في ناحية عدسة	190
875,845,000	2021-11-08	210	127	75%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري		وحدة ماء مجمعة 200م3/ساعة من منطقة البو دمنة جميلة الحصى	191
2,044,010,000	2021-11-10	300	130	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الفلوجة	تاهيل مقترب جسر الفلوجة الكونكريتي (الجديد) جهة الفلوجة	192
, , ,	2021-11-10	300	130	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الفلوجة	إعادة انشاء طرق فرعية في منطقة الرميلة البو شجل (المرحلة الثانية) ناحية الصقلاوية	193
	2021-11-10	300	130	65%	قيد التَّنُّفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	هيت	تاهيل طرق المعمورة وحي أمينة والخالدية في قضاء هيت	194
2,927,775,000	2021-11-02	240	132	50%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الفلوجة	عادة تاهيل الجسر الفوقاني لتقاطع الترتار سأمراء كيلو 51	195
1,436,443,500	2021-11-12	360	140	42%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التربية	الرمادي	هدم وإعادة بناء تانوية بزيع فتيخان أبو ريشة	196
2,002,859,500	2021-11-16	360	142	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	هيت	تاهيل وإصلاح الشارع الرنيسي في حي البكر وشارع حي القادسية وحي العامل في هيت	197
1,057,705,000	2021-11-14	180	143	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	حديثة	قَلَعُ وَتُوسِعِ وَاعَادَةٌ تَبَلِيطُ الطَّرِيقُ الرَّابِطُ بِينَ كَراجَ بِلَدِيةٌ بِروانَةٌ مَع جَسَر بروانَة ٱلْعَانَم بطول 650م وعرض 20م بطول 550 وعرض 15م	198
390,428,000	2021-11-18	180	151	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الكهرياء	العامرية	عادة انشاء مركز صيانة كهرباء العامرية	199
649,160,000	2021-11-27	210 187	158	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التعليم العالي	الرمادي	إعادة انشاء سياج كلية الزراعة وانارة محيط الكلية والطرق الداخلية في جامعة الانبار	200
. ,	l			1	l		- 11	1	<u> </u>	

			,							-
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	٢
997.142.500	2021-12-11	180	190	30%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		مشروع تاهيل طرق خارج حدود البلدية (الزيتون مقابل محطة الكهرباء)	20
001,112,000	2021-12-11	180	190	30%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		- وتاهيل طرق خارج حدود البلدية (قرية جريجب)-	2
	2021-12-11	180	190	30%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		تاهيل طَرق خارج حدود البلدية (النهضّة الجنّوبية)-	2
	2021-12-11	180	190	30%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		تاهيلً طرق خارج حدود البلدية (منطقة شرق المعامل)/ ناحية الكرابلة	
1.176.350.000	2021-12-12	270	223	100%	منجز ً	بر برامج خاصة	الكهرباء	الرمادي	تجهيز مواد لدعم الشبكة الكهربانية لفرع توزيع كهرباء مركز الانبار (مركز الرمادي)	
787.394.000	2021-12-21	240	228	40%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	مبان <i>ی</i> حکومیة	الرطبة	اعادة بناء ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الرطبة	
- , ,	-			10.70			•	+->-	والمرابع ما المنافع ال	1
1,429,250,000	2022-01-02	240	248	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		المحطة 100+59 نهر الحلوة باعتبار نقطة 00+0 فلكة جسر البو فراج	
499,795,000	2022-01-02	200	266	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التربية		اكمال بناية مدرسة نموذجية 18 صف في ناحية الكرابلة/ قضاء القانم	_
1,150,100,000	2022-01-24	210	325	49%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الفلوجة	تاهيل طريق في الحي المدني ناحية الحبانية	
4,929,250,000	2022-01-20	180	326	100%	منجز	برامج خاصة	التربية		تجهيز احتياجات مدارس اقضية (الرمادي-الحبانية - الفلوجة - الكرمة)	
4,707,400,000		270	338	51%	قيد المباشرة	برامج خاصة	الداخلية		تجهيز اليات الى دوانر الاستخبارات والمخابرات والمرور في محافظة الانبار	
2,286,997,000		240	369	20%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	القائم	تاهيل البني التحتية لجسم الطريق المرحلة الأولى للطريق الحولي الشمالي في الكرابلة بعرض 25م	1
629,310,000	2021-12-12	240	209	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الصقلاوية	إعادة انشاء مركز ماء الصقلاوية	
248.395.000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الرمادي	تأهيل طرق في البو كناص و البو عطية في البو دمنة ناحية حصيبة الشرقية بطول 2325 م	
248,338,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الرمادي	تَاهِيل طُرِق البومنِّسيُ قَرب مضيف النَّمْسِ النَّمْسِ النَّمِ وَاللَّهِ المُولِيةِ الشَّرِقِيةِ وَ طُرِق مدرسة ذو الفقار الابتدائية في جزيرة الخالاية بيا الخالاية بطول 2860م	_
239.896.000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	التربية	القائم	تنفيذ سياج و سلحات و شارع اعدادية صناعة القانم	
247.840.000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الرمادي	تأهيل طرق مدرسة النصر الابتدائية للبنين و البنات في ناحية حصيبة الشرقية بطول 3600	
248,154,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الخالدية	تأهيل طرق في منطقة جامع المدينه المنورة في حصيبة الشرقية بطول 2620 م	
249,750,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجارى	القائم	أستبدال ناقل رئيسي لمجمع الحي الصناعي / 1 ناحية الكرابلة / قضاء القائم	
247,500,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	القائم	استبدال ناقل رئيسي لمجمع الحي الصناعي / 2 المكارم / ناحية الكرابلة / قضاء القائم	
247,300,000				100%	<del></del>	برامع عدد استهامت	ريب ريب ري	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	اعادة تأهيل و أنشاء شبكة مجاري و خطوط تصريف ناقلة في راوه الجديدة لفتح الاختناقات	
249,965,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	راوه	الحاصلة في شوارعها و تصريف مياه الامطار و المياه الخارجة من الدور السكنية الى الوادي و رفع الضرر عن تلك الدور / راوه	
249,400,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الرطبة	تأهيل شوارع في حي الحارة الجديدة في قضاء الرطبة	
249,910,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	القائم	استبدال ناقل رئيسي و مد شَبكة فرعية في حيّ الامين / قضاء القائم	
249,050,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	القائم	استبدال ناقل رئيسي و مد شَّبكة فرعية في حي 12 ربِّيع الأول و الدرة/ قضاء القائم	
249,900,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مبائي حكومية	الرماثة	هدم و أعادة بناء المستوصف البيطري في الرمانة	
177,881,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الرمادي	تأهيل مجموعة طرق السيد الحكم حسين في منطقة حصيبة الشرقية بطول 2550 م	
198,590,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الرمادي	نَاهِيل مجموعة طرق السيد المختَّار ضاري في منطقة حصيبة الشَّرقية تأهيل مجموعة طرق السيد (المختار ضاري عودة شرموط) في منطقة حصيبة الشرقية بطول 2915 م بطول 2915 م	
191.299.500				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الصحة	القائم	هدم و اعادة بناء مذخر الادوية في مستشفى القائم العام	
248,550,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	عنه	هدم و اعادة بناء القسم البلدي مع تأهيل قاعة المناسبات في مجمع الصكرة	
249,400,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الرطية	تأهيل شوارع في الحي الموطفين في قضاء الرطبة	
249.400.000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الرطية	تأهيل شوارع في الحي العسكري في قضاء الرطبة	
158,620,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	الرمادي	صيانة مجمع ماء الجراشي 200 م3/ساعة	
249,225,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيد امانة	الكهرباء	هيت ا	تجهيز تراكيب انارة مع مواد صيانة الانارة في مدينة هيت	
250,000,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	هیت	صيانة مجمع ماء السريدية سعة 50 م3 فيت	
244,800,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الرطبة	اعادة انشاء أرصفة و مقرنص في شوارع قضاء الرطبة	
249.867.500				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مبانی حکومیة	القانم	تأهيل بناية مركز الشباب و الرياضة ناحية العبيدى	
249,867,500				100%	منجز منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مبا <i>ي ح</i> دوميه البلدية والبلديات	الرطبة	تاهيل شوارع في غرب الوادي في قضاء الرطبة	
243,400,000				100/0	<del>سب</del> ر				المسال التيار الكهرباني الى النقاط العسكرية في مفرق الرافدة و قرب جامع الخصيم مع تأهيل جزء	$\vdash$
249,500,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الكهرياء	القائم	من مغَّذي الصفرة	
249,875,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الكهرباء	القائم	تأهيل جزء من مغذي غزة و مغذيات الطواريء في قضاء القانم	
249,585,000				100%	م <b>نج</b> ز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	التربية التربية	هيت القانم	ترميم مدرسة 18 صف تقليدية في هيت / البغدادي أمير مدرسة 12 صف مع انشاء مجموعة صحية 10مقعد داخل المدرسة /	
249,960,000				100%	منجز منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	راوه	قضاء القانم إعادة تاهيل مجمع ماء البوعبيد	
249,500,000				100%	منجز منجز	استعماري / تنفيد امانة	الطرق والجسور	عنه	إعده تاهين مجمع ماء البوطبيد تبليط طريق ناحية الريحانة – بحيرة عنة مع انشاء بوابة للمدخل الشمالي لناحية الريحانة	
249,677,000				90%	منجر قيد التنفيذ / متوقف	برامج خاصة / تنفيد امانة	العوارد المانيه	الرمادي	تبيت طريق تحديد الريحات - بحقود عدم مع الساع بوابه الصحن السمعتي تتحديد الريحات تأهيل قناة اروانية مع ملحقاتها في معلقة الوعيقة / كرطان (الشيخ عبد المجيد نايف رشيد) في محافظة الإنبار	
249.970.000		+		100%	منجز	بر امج خاصة / تنفيذ امانة	مبانى حكومية	عنه	انشاء مسقفات و كراج للسيارات داخل المجمع الحكومي في عنه	



	سارح اسین	,	2021 752	سورو- روسات	المركبية	سرره من المحلي	,,	مسارين علاون العادا	
كلفة العقد الأصلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,680,200,000	210	152	3%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	بيجى	تأهيل شارع الشط في قضاء بيجي	1
499,600,000	180	176	0%	قيد المباشرة	استثماري	البلدية والبلديات	سامرآء	تأهيل وتطوير شارع البو رحمن في مدينةً سامراء	2
937,169,000	240	219	70%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات		تطوير مركز المدينة من شارع الجنسية باتجاه مشروع الماء في الصينية	3
1,691,847,500	300	231	6%	قيد التنفيذ	استثماري	مباني حكومية	تكريت	إعادة اعمار بناية مقر تشكيلات وزارة الإسكان في صلاح الدين	4
611,725,000	180	253	41%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	سامراء	صيانة وتأهيل الأرصفة داخل حدود البلدية ـــــناحية المعتصم	5
		253	41%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	سامراء	تأهيل وتطوير الشارع الرئيسي المار بناحية المعتصم	6
1,421,630,435	210	254	5%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	بلد	تأهيل وتطوير الشارع الحولي الممتد من منطقة البو عنون الى فلكة الحي الصناعي /بلا	7
1,448,703,000	270	265	10%	قيد المباشرة	استثماري	البلدية والبلديات	بيجي	تأهيل بناية بلدية بيجي	8
	270	265	15%	قيد المباشرة	استثماري	البلدية والبلديات	تكريت	إعادة انشاء بناية بلدية العوجة	9
3,692,909,000	270	317	36%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	بلد	تطوير الشارع الرئيسي لمدخل ناحية يثرب	10
2,694,403,000		355	5%	قيد المباشرة	استثماري	الماء و المجاري	الضلوعية	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية كبيبة / الضلوعية	11
		355	5%	قيد المباشرة	استثماري	الماء و المجاري	الضلوعية	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية خزرج / الضلوعية	12
3,094,281,500		385	0%	قيد المباشرة	استثماري	الماء و المجاري	تكريت	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية الفرسان /تكريت	13
		385	0%	قيد المباشرة	استثماري	الماء و المجاري	بيجي	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في القرية العصرية بيجي	14
3,289,820,000	240	29	93%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل شارع طريق سامراء بغداد من الجسر السريع الى جسر سامراء الكونكريتي	15
4,345,600,000	360	32	10%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الضلوعية	تطوير الشارع الرئيسي في قضاء الضلوعية	16
3,637,050,000	300	33	26%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الضلوعية	تطوير شبكة مياه الامطار وشبكة الماء للشارع الرئيسي في قضاء الضلوعية	17
4,347,750,000	240	38	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	تطوير المدخل الجنوبي لمدينة تكريت من بوابة القدس	18
1,413,580,000	240	57	82%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تطوير شوارع داخلية ضمن حدود بلدية الاسحاقي	19
2,058,260,500	360	75	40%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تبليط شوارع (20) متفرقة في قضاء الشرقاط مقاطعة 56	20
		75	40%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	الشرقاط	تطوير شارع السوق والفروع المؤدية اليه في قضاء الشرقاط	21
3,067,940,000	360	76	77%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	تأهيل شوارع رئيسية رابطة في مدينة تكريت	22
3,621,721,800	300	80	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تبليط مع القالب الجانبي للشوارع المتفرقة	23
		80	40%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	امرلي	تبليط مع الانارة وعمل قالب جانبي في قضاء امرلي	24
		80	47%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	الطوز	تأهيل الشوارع في حي العدل / الطوز	25
1,185,232,000	270	83	61%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الشرقاط	إعادة تأهيل طريق الشرقاط - تلول الباج بطول 13كم في قضاء الشرقاط	26
2,869,366,500	270	87	47%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل وصيانة شارع الدجيل الرئيسي من مركز الحسين الصحي باتجاه السيطرة	27
614,525,000	180	92	5%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تطوير شارع المحيط الممتد من معهد الصم والبكم في دائرة الرعاية ـرجال	28
1,877,690,000	330	100	68%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		قلع وإعادة انشاء طريق المطعم - الاسالة بطول 1200م في ناحية سليمان بيك	29
		100	68%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل المدخل الرئيسي لناحية سليمان بيك مع شارع مركز الشباب في ناحية سليمان بيك	30
		100	68%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		قلع وإعادة انشاء طريق الاسالة ـ خاصة دارلي بطول 1500م في ناحية سليمان بيك	31
		100	68%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	الطوز	تبليط الشوارع الشريانية امام اعدادية الطوز للبنين ومركز شرطة الطوز	32
4,612,480,000	240	110	58%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	تأهيل شارع 60 في تكريت	33
		110	58%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	تأهيل شارع الزهور في تكريت	34
		110	58%		برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	شارع الآنشائية في تكريت	35

190

	ے درے ہے			<del></del>	<del>55</del>	, — <del>"</del>		<u></u>	, G3—— G3	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ប្
2,644,500,000	2021-11-25	240	113	37%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل الشارع الرئيسي من سيطرة 14 الى فلكة الشهيد عبد الله جبارة بطول 3400م	36
2,579,635,000	2021-11-02	360	116	77%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		صيانة وتأهيل مدخل ناحية دجلة	37
	2021-11-02		116	61%		برامج خاصة	الطرق والجسور		تأهيل طريق الشيخ هلوب في ناحية الاسحاقي بطول 6كم	38
1,149,200,000	2021-11-07	300	120	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		إعادة انشاء بوابة المدخل الجنوبي وإعادة انشاء بوابة المدخل الشمالي	39
1,799,999,500	2021-11-07	330	124	50%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الداخلية	الدور	إعادة بناء قسم شرطة الدور	40
1,189,395,000	2021-11-11	240	129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تبليط شوارع داخلية في ناحية دجلة (البو جرن)	41
	2021-11-11		129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	تكريت	اكساء المقاطع المتضررة لطريق تكريت - سامراء بطول 3كم	42
ļ	2021-11-11		129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		صيانة واكساء الطريق الرئيسي لمنطقة عوينات والطرق الفرعية الداخلية للقرية	43
	2021-11-11		129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		صيانة واكساء طريق البو دلي وانشاء 500 م ط في القرية	44
	2021-11-11		129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		صيانة المقاطع المتضررة من طريق ناحية الشيخ جميل (المدخل الجنوبي)	45
	2021-11-11		129	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	بك	إعادة انشاء طرق داخلية فرعية لحي العباس الزراعي في مدينة بلد	46
906,700,000	2021-11-28	210	138	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري		مد خط ناقل لتغذية الجبيرية / مد شبكات متفرقة في ناحية دجلة / مدشبكات متفرقة في ناحية المعتصم	47
1,491,000,000	2021-11-07	180	139	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل الشوارع في قرية السادة	48
	2021-11-07		139	95%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		تبليط الشوارع في منطقة عرب الكبيرة الأيمن	49
	2021-11-07		139	95%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		تبليط الشوارع في منطقة عرب الكبيرة الايسر	50
	2021-11-07		139	95%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل الشوارع في منطقة البو ضايع الكراعات	51
	2021-11-07		139	95%		برامج خاصة	البلدية والبلديات		تأهيل الشوارع في منطقة البغشو	52
2 204 000 000	2021-11-07 2021-12-20	240	139 167	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	تكريت	تأهيل الشوارع في منطقة البو دوري	53
3,381,900,000	2021-12-20	240	167	34% 34%	متد اسفتد	برامج خاصة برامج خاصة	البلدية والبلديات البلدية والبلديات	ندریت	تأهيل شارع 60 في حي الديوم في تكريت / تبليط الشوارع الواقعة في حي كوماري في الطوز	54 55
1,488,380,000	2021-12-20	270	177	21%	قيد التنفيذ	برامج خاصة برامج خاصة	البلدية والبلديات		اعدة تأهيل شارع مستشفى صلاح الدين	56
2.601.005.000	2021-12-07	300	182	37%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الدور	تطوير الشارع الحولى في قضاء الدور	57
4,333,601,833	2021-12-29	360	187	22%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التعليم العالى	نکریت	تجهيز وتأهيل مختبرات جامعة تكريت	58
666,000,000	2022-12-21	150	222	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		إعادة انشاء الطريق الرابط بين قرية عين حياوى وقرية سيحة عثمان بطول 6كم	59
643,225,000	2022-01-13	330	245	6%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	مبانی حکومیة	الدور	إعادة انشاء مكتبة الدري /الدور	60
2,558,750,000	2021-12-27	180	249	15%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	بيجى	تأهيل شوارع في قرية التقدم في قضاء بيجي بطول (7)كم و عرض (10)م	61
474,270,000	2022-01-05	240	258	0%	قيد المباشرة	برامج خاصة	الماء و المجارى	الدور	هدم وإعادة بناء مركز ماء الدور	62
952.228.000	2022-01-16	360	261	13%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الكهرياء	الدور	هدم وإعادة بناء مديرية كهرياء الدور مع المحطة /الدور	63
650.000.000	2022-02-15	120	390	85%		برامج خاصة	الكهرياء	عموم المحافظة	تجهيز ومد شبكات ماء في عموم محافظة صلاح الدين	64
690,125,000		180	388	25%		برامج خاصة	الطرق والجسور	الشرقاط	اعمال صيانة وانشاء طريق مقبرة اسديرة وسطى وصيانة مقاطع متضررة من الطريق الرابط بين قرية عويجيلة ومعمل غاز الرشيد وطريق مقبرة اسديرة سفلي	65
193,800,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ اماتة	البلدية والبلديات	الدجيل	تاهيل طرق متفرقة في قريه على الدلش في قضاء الدجيل بطول 1.5 كم	66
240,000,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الدجيل	تاهيل طرق داخليه في قرية الدجمهورية الاولى الدجيل بطول 2 كم	67
249,300,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الكهرياء	بيجي	مد خط ناقل لتغنية منطقة هونداي / جنوب بيجي	68
248,416,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	سامراء	اعادة تأهيل وتحويل مسار انبوب ماء مدخل سامراء القلعة	69
238,000,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الشرقاط	صيانة و اكساء الطريق الرنيسي قرية المسحك بطول 3.5 كم	70
249,500,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية والبلديات	الشرقاط	صيانة و اكساء الطريق الرنيسي من من دار المواطن دخيل العلي الى شمال قرية المسحك بطول 2.5 كم	71



			, -		<del></del>		<del>33                                   </del>	<u> </u>	المال	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ن
3,677,200,000	23/11/2021	360	145	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الحويجة	تأهيل الطريق الرابط بين طريق كركوك تكريت وقرية غيدة مرورا بقرى تل خديجة – طار الحمر – السعيدي بطول 32كم	
1,753,200,000		210	233		قيد المباشرة	استثماري	الطرق والجسور	الحويجة	تاهيل طريق كركوك - تكريت	2
727,596,500		270	286		قيد المباشرة	استثماري	التربية	الحويجة	إعادة انشاء مدرسة العلا 12 صف / قضاء الحويجة	3
1,314,500,000		300	287	30%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	العباسي	تاهيل الشوارع المتضررة في ناحية العباسي / كركوك	4
728,420,000		300	383		قيد المباشرة	استثماري	التربية	الحويجة	انشاء مدرسة الخازر 12 صف / ناحية الزاب في قضاء الحويجة	5
3,833,620,000		360	82	51%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الحويجة	تاهيل وصيانة الشوارع في قرى / الخالدية ، الخبازة ، الخازر، عتيرة ، العنادية ، العون ، الثيلة ، حلوة الوسطى ، العرام ، الزيتون، قرية سفلى شرقية ، الحويجة	
1,891,200,000		300	85	33%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الحويجة	تاهيل الطرق لقرى كرحة غازان ، قرية هلال ، كرحة مرباط ،مراك الجلد ، العراعرة ، تالاو الفاخرة ، الذيبات ، الخبازة ، بطول 14 كم في ناحية الرشاد	7
2,629,559,000	2021-04-11	300	95	73%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الحويجة	تاهيل مسار الشارع الحولي خلف المعهد التقني مع تطور شارع كورنيش حي القادسية في قضاء الحويجة	
2,996,091,500	2021-01-11	300	96	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الحويجة	تاهيل شارع الحي العسكري والشوارع المجاورة مع شبكة المجاري والانارة في قضاء الحويجة	9
1,292,140,000	2021-11-18	300	99	20%	قيد النتفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الحويجة	تجهيز ونصب مجمع ماء عواد المهاوش ومجمع ماء سراي الفضل ومجمع ماء عليوي السعد ومجمع ماء مع تاهيل الأبنية في موقع تبة كرة / الرياض	10
1,326,070,000	2021-07-11	360	101	25%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الحويجة	تاهيل شارع علوة الفواكه والخضر في قضاء الحويجة مع اعمال المجاري	11
644,955,300	2021-09-11	180	118	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الملتقى	تاهيل الشوارع المتضررة في مركز ناحية الملتقى شوارع الشهداء- الناحية / المرحلة الأولى	12
1,033,425,000		150	125	88%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الدبس	إعادة انشاء طريق يؤدي الى قرية يارمجة التابعة لناحية ليلان	13
		150	125	88%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الديس	تاهيل طريق الصالحي بطول 2كم	14
		150	125	88%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الديس	إعادة انشاء طريق الكيف وقرية سيد طالب / قضاء الدبس	15
2,817,825,000		300	229	52%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الحويجة	تاهيل شارع علوة الأغنام والشوارع المجاورة مع اعمال المجاري والانارة	16

26,665,802,300



		_ / LUL			- <del></del> -		<i></i>	, 5 , 5 , (	<u> </u>	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,309,800,000	2021-08-15	180	31	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	قرة تبة	ليط طرق متفرقة في قرة تبة - جبارة	<u>ب</u> 1
1,165,475,000	30/9/2021	330	89	76%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	إعادة تاهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولاء (مرحلة أولى)	2
			89	76%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	إعادة تاهيل شوارع دور نواب الضباط	3
			89	76%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	تاهيل شوارع حي السلام التَّاني قرب المدرسة الكرفانية	4
1,075,730,000	15/11/2021	180	137	100%	منجز	استثماري	البلدية والبلديات	الخالص	تاهيل شوارع في (حي المصطفى -الهادي -المظفر-حي الحسين-حي البيادر-حي النور-مدخل الخالص) قضاء الخالص	5
2,590,250,000	2021-11-25	270	164	85%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الخالص	وسيع طريق المنصورية-سراجق مرورا بقرى (العبور -الابتيرا-إبراهيم الشيخ علي) بطول 6.5كم	ا تر
699,105,000	2021-11-30	180	183	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	خانقين	تاهيل طرق في جلولاء وقرة تبة وقرية عمر مندان اجلولاء	7
2,780,535,000	2021-12-15	300	198	27%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل الطريق من بني سعد الى بعقوبة الرئيسي	8
917,305,000	26/12/2021	180	202	25%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرباء	بهرز	تاهيل وتحسين الشبكة الكهربائية لناحية بهرز وقراها	9
1,590,000,000	19/12/2021	180	214	70%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	إعادة تاهيل شوارع حي الشهداء المرحلة الأولى	1
4,341,400,000	2022-01-26	300	234	10%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل وتطوير الجزء الشمالي من مجسر تقاطع القدس	1
1,951,965,000		330	237	16%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	بلاروز	جهيز ونصب مجمع ماء سعة 200 مداساعة مع خط ناقل لقرية هزية داخل مشروع ماء الشهيد غازي	
3,468,000,000	2022-03-01	330	255	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	قرة تبة	تاهيل مشروع ماء قرة تبة	1
545,280,000	2022-01-16	180	257	70%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طريق قرى التحويلة في الخالص / تاهيل طريق البو زوين / تاهيل طريق البوثويني	1
1,128,290,000		330	268	17%	قيد التنفيذ	استثماري	الصحة		هدم الجزء المتضرر واكمال المركز الصحي في داود السالم	1
1,350,115,000	2022-01-23	180	270	95%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بعقوبة	تبليط الطرق الريفية في قضاء بعقوبة وقراها بطول 7 كم مع تبليط قرية ابو عاكولة وحد مكسر وسيسبانة بطول 3 كم وبواقع 1 كم لكل قرية	1
			270	95%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل طرق في قضاء بعقوبة بطول 4.5 كم	1
2,396,440,000	2022-01-16	360	275	55%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	السعدية	تاهيل شوارع في حي الربيع / المرحلة الثانية / السعدية	1
1,745,000,000	2022-01-13	210	276	47%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	تاهيل شوارع العنبكية /جلولاء	1
498,000,000	2022-01-20	180	278	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بهرز	تبليط بيت كشكول بطول 2.75 كم	2
			278	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بهرز	تبيليط طريق ابو خميس – جنوب ناحية بهرز	2
1,381,600,000	2022-01-16	210	279	33%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	العظيم	صيانة واكساء طريق الناي	2
895,590,000	2022-02-03	180	281	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	الخالص / هبهب	اهيل طرق قرى (المرفوع الكبير – منصورية الجبل – كشكين – السلام – دوخلة – سيف سعد – هبهب)	2
			281	83%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الخالص / جديدة الشط	تبيليط طرق ريفية في ناحية جديدة الشط	2
2,276,650,000	2021-01-18	210	288	50%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بلدروز	اهيل قرى امام عسكر والندى في قضاء بلدروز وقرى مياح وبدينة في قضاء المقدادية وطرق ريفية متفرقة في قضاني بلدروز والمقدادية	2 اتا
2,698,500,000	17/1/2022	240	292	70%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	اعادة تاهيل شوارع حي العروبة / جلولاء / المرحلة الثانية	2
3,344,474,000	2021-01-12	300	293	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل وتوسيع من تقاطع القدس باتجاه تقاطع السادة	2
869,200,000	2022-02-08	150	298	81%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	كنعان	نشاء طرق منفرقة في ناحية كنعان طرق منطقة شمر – صكوك بطول 9 كم	2
4,375,400,000	2022-01-17	270	300	20%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	قرة تبة	انشاء الممر الثاني تقاطع قرة تبة - جبارة باتجاه مركز ناحية قرة تبة	1 2
3,069,500,000	2022-01-24	270	350	40%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	جلولاء	اعادة تاهيل شوارع حي السلام الاول / مرحلة اولى / جلولاء	3
-	19	,								

	<del> </del>		- 1 7		<del>-                                    </del>	- <del></del>	<del>&gt;                                    </del>	, J , t , t	<del>55 C.5</del>	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
1,994,250,000	2021-01-08	210	362	20%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور		تبليط قرى بلدروز والداينية والدهلكية والندى	31
408,115,000		180	371	24%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء و المجاري	جلولاء	تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 100 م3 ساعة لقرية الاصلاح / ناحية جلولاء	32
521,589,000		240	361	33%	قيد التنفيذ	استثماري	الكهرياء		انشاء مركز صيانة كشكولات ذات الطابقين	33
646,000,000		180	341	10%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	بعقوبة	تاهيل شارع الحسينية في التحرير بطول 450 م وعرض 30 م	34
825,688,000		150	391		قيد المباشرة	استثماري	الكهرباء	بعقوبة	تاهيل انارة الطريق العام من الغالبية الى تقاطع القدس	35
3,127,527,200	2021-09-07	300	56	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	خانقين	تأهيل طرق في جلولاء وخانقين	36
			56	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	خانقين	اهيل شوارع قرى جلولاء سيد جابر وشيخ بابا والحصيني والرابط بين جسر حلوان وخانقين	37
1,710,849,000	2021-09-09	360	61	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	تأهيل طريق قرية البدعة في كنعان	38
			61	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل قرى كنعان الريفية	39
			61	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طريق قرية الناي والعودة والدراويش	40
			61	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بلدروز	تاهيل الطريق الحدودي في قزانية	41
3,538,558,000	2021-09-09	360	62	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص/ المقدادية	تأهيل الطريق الرابط بين الناي والدوجمة	42
			62	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	العظيم	تاهيل طرق ريفية وطريق قرية شيخ فتاح في العظيم (2.1)	43
			62	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور		تاهيل شوارع حي العسكري والعمرانية وسنيجة والتويجرية والكوام والحديد وسويدي وكودان وأخرى	44
3,025,693,000	2021-09-16	360	64	82%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	السعدية	تأهيل الشارع العام من الفلكة مقابل مركز الشرطة الى سيطرة المدخل باتجاه بغداد ويطول 2100 متر مع انشاء بوابة على الشارع العام لمدخل ناحية السعدية	45
1,719,307,000	15/9/2021	300	68	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الخالص	تأهيل وتبليط شوارع المنطقة الغربية مع خطوط المجاري في ناحية سد العظيم /	46
1,080,000,000	2021-10-04	270	72	87%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	السعدية	تأهيل طرق ريفية لقرى البيضاء والعساكرة وربيعة وبني كعب ومجمع حمرين وزركوش النادر	47
1,172,500,000	2021-09-22	270	73	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المقدادية	تأهيل طريق بروانة الكبيرة وقرية شاقراق	48
433,370,000	2021-11-10	150	84	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تأهيل شوارع في قضاء الخالص ونواحيها	49
1,079,300,000	2021-02-10	210	90	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	السعدية	تاهيل واكساء شوارع حي الربيع في ناحية السعدية	50
2,482,580,000	2021-11-10	330	91	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	اعادة تبليط طرق في ناحية هبهب وقراها بطول 5 كم وقضاء الخالص وقراها بطول 5 كم وناحية جديدة الشط وقراها بطول 5 كم	51
			91	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	إعادة تبليط طرق في قرية الحويش + القصيرين + دوخلة	52
			91	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تبليط طرق في قرية سعدية الشط / قضاء الخالص	53
			91	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	إعادة تبليط طرق متفرقة في قرى الأسود الكبير والصغير والبدوانية بطول 2700 متر	54
1,722,560,000	2021-10-13	300	97	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المقدادية وبلدروز	تاهيل قرى ريفية في قضائي المقدادية وبلدروز وناحية الوجيهية	55
697,000,000	13/10/2021	150	98	100%	منجز	برامج خاصة	الماء و المجاري	بعقوبة	تاهيل خطوط مجاري بعقوبة	56
· ·			98	100%	منجز	برامج خاصة	الماء و المجاري	بعقوبة	إعادة تاهيل خط دفع لمجاري مياه الصرف الصحي في العمارات السكنية لشركة ديالى الصناعات الكهربانية	57
1,043,251,000	14/11/2021	300	103	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الخالص	تاهيل خطوط مجاري مياه الامطار في حي الكرار/الخالص و منصورية الشط / الخالص	58
	14/11/2021	300	103	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الخالص	تاهيل شوارع منفرقة في حي الحسين مع شبكة مجاري مياه الامطار	59
1,501,085,000	2021-10-23	210	104	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بهرز	تبليط قرى قرية ملا عيد بهرز - قرية بيت حرامي - قرية رحيم سلمان - قرية نهر إبراهيم كنعان - تاهيل وترصيف الشارع العريض في حي القادسية / ناحية بهرز	60

196

	<del> </del>		- 1		** J-		<del>,                                    </del>		55—— ( <del></del> ,5	
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
577,400,000	2021-11-10	120	107	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوية	تأهيل قرية الحي العسكري الثاني حي الضبع في حد مكسور بطول (22م) ناحية العبارة وتبليط (200 م) شارع بيت درجال و (200 م) شارع بني لام و (200 م) شارع جديث في قرية السلام و (150 م)شارع المشاتل في قرية الشاكرين وتبليط شوارع في قرية البوعيثة بطول (12م) وحي الصادق الثانية (150 م)وقرية الحد الأخضر بطول (500 م)وقرية عبد الحميد بطول (600 م) و العطشانة بطول (500 م)	61
2,542,312,000	15/11/2021	360	109	72%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	بعقوبة	تأهيل واكمال شارع الحد الفاصل بين حي المعلمين والحي العسكري في الكاطون / تنفيذ شبكة مجاري مياه الامطار في الشارع الفاصل بين منطقة حي المعلمين وحي اليرموك/بعقوبة / انشاء بني تحتية للاتصالات في شارع الحد الفاصل بين حي المعلمين والحي العسكري في الكاطون	62
4,190,120,000	2021-10-26	360	111	59%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بلدروز	تاهيل الطرق من بلدروز الى كنعان وتاهيل طرق ريفية في قضاء بلدروز ونواحيها	63
651,600,000	2021-11-24	180	121	82%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابو صيدا	تاهيل طرق في ناحية ابي صيدا والوجيهية والمقدادية	64
1,108,104,000	2021-11-25	300	122	6%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المقدادية	تاهيل مدخل الزهيرات السايد الثاني	65
1,749,654,000	2021-01-11	270	134	92%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	بلدروز + مندلي	تأهيل طرق ومجاري في بلدروز ومندلي / تاهيل شوارع متفرقة في مندلي / تنفيذ مجاري الامطار في حي الحسين (تكملة) وكسيرات	66
824,100,000	2021-11-14	240	135	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل مدخل الهويدر	67
731,700,000	2021-11-16	180	136	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تبليط طرق في الخالص وقراها	68
			136	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تبليط طرق في ناحية العظيم	69
			136	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	صيانة واكساء طريق زنبور /قضاء الخالص	70
956,250,000	2021-11-11	210	147	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المقدادية	تبليط طرق السدة-نوفل -الخمس جسور وامام طالب الفاروق وجزيرة محطة البيات في المقدادية	71
646,000,000	2021-10-11	160	148	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	بعقوبة	تاهيل شوارع الكاطون وجرف الملح للشوارع الرنيسية التي لاتقل اعراضها عن 15 م/ الكاطون	72
1,562,740,000	2021-11-17	240	165	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	إعادة تاهيل طرق في العبارة (قرية زهرة _ قرية زاغنية _ قرية ركة حجي سهيل	73
			165	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	عادة تاهيل طرق ريفية في بعقوبة (قرية جبينات دربونة بيت حمادة والسوامرة الثانية منطقة الزراعة الثانية	74
			165	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بني سعد	إعادة تاهيل طرق ريفية في بني سعد (قرية داوود السالم وقرية خديدان)	75
			165	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	إعادة تاهيل طرق في قضاء بعقوبة (قرية التاميم قرية بدعة قرية المرادية قرية الرسول) -بني سعد بطول 4.5 كم	76
495,670,000	2021-11-24	180	170	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	إعادة تاهيل طرق متفرقة ريفية في ناحية الجديدة	77
			170	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	إعادة تاهيل قرى ناحية جديدة الشط في الخالص	78
651,750,000	2021-12-01	180	173	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المقدادية	إعادة تبليط طرق في العزية وبركنية وكرز الدين	79
2,182,000,000	2022-01-11	270	226	0%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	بعقوبة	صيانة وتاهيل طريق تقاطع المطار باتجاه دلي عباس بطول 20 كم من المحطة (40+0) الى المحطة (40+0)	80
1,679,760,000	2021-12-22	240	236	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	خانقين	تاهيل وتبليط طرق في (نارين – عليان – الاخوة – شلال – شيخ حمدي – المشايخ – دعاج – بني ويس) في خانقين	81
1,646,486,000	2021-12-23	240	239	37%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	العظيم	تبليط الطريق الرابط بين ديالي وصلاح الدين ــ ناحية العظيم	82
1,702,833,000		300	243	89%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	السعدية	تاهيل شبكة مجاري مياه الامطار في مناطق (الزيتون والنور والسلام) مع تأهيل خط ناقل في السعدية	83
526,900,000	2022-01-11	180	263	58%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طرق قرى الدومجة بطول 2 كم والزركانية بطول 2 كم والمحمودية بطول 1.5 كم / الخالص	84
515,352,000		180	271	25%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الصحة	خانقين	اكمال المرحلة الثانية لصالة العمليات في مستشفى خانقين العام	85
785,336,000		300	169	17%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	مبان <i>ي</i> حكومية	بعقوبة	هدم وإعادة انشاء بناية جهاز الامن الوطني	
248,080,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الخالص	تأهيل طرق متفرقة ريفية في قضاء الخالص	87
248,080,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الخالص	أعادة أنشاء طرق متفرقة في ناحية هبهب	88
247,400,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بعقوبة	تأهيل طرق المشاهدة و خليل داوي و مدخل كلية القانون في بعقوبة	89
240,000,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	خانقين	تأهيل طريق مرجانة في جلولاء	90

202				7		<del>//                                   </del>		<u> </u>		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع		القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ü
240,000,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	خانقين	تأهيل طريق دور المعسكر في جلولاء	91
240,300,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	قره تبه	تبليط طريق قرية على سراي في قرة تبة	92
248,810,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بلدروز	تأهيل طرق متفرقة في مندلي و قزانية	93
215,750,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	ماء ومجاري	بعقوبة	تنفيذ شبكات ماء قطر 110 ملم في قضاء بعقوبة و نواحيه	94
171,457,500				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية	بعقوبة	أكمال محلة 108 من فرع الرعاية الصحية بأتجاه الأسواق	95
172,278,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية	بعقوبة	تأهيل الازقة محلة 106 (57،54،66)/ بعقوبة التكية	96
216,463,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بعقوبة	طريق قرية عامر الشمري و سيد هاشم	97
184,800,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	بلدية	كفري	تبليط شوارع متفرقة في حي السناجرة ناحية جبارة	98
248,700,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بلدروز	تأهيل قرية عين السبع وقرية كاظم الغيدان	99
239,500,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	الخالص	صيانة و تاهيل 1500 م طريق السندية الرابط بين ديالي - صلاح الدين	100
249,750,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	المقدادية	اعادة تأهيل قرى متفرقة في ابي صيدا والمقدادية	101
237,400,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	خانفین	تأهيل طريق قرية الجاغات	102
248,095,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بعقوبة	تأهيل قرى شفته و مناطق متفرقة في قضاء بعقوبة	103
215,640,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية	خانفين	تاهيل الفروع الداخلية في حي الاسراء	104
249,400,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بعقوبة	تبليط طريق درويش رحمن / هادي حسيب / حسن هادي في قضاء بلدروز و قرية صدر البدعة في ناحية كنعان	105
247,965,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	بلدروز و المقدادية	تبليط قرية المجمعات و منطقة ابو كاظم و بيت خلف و قرية دبيش و قرية حجي سعدون و مناطق متفرقة من منطقة العزية في قضاء بلدروز و منطقة المناز و قرية بركنية – قضاء المقدادية	106
208,769,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	مراكز شرطة	خانفين	تأهيل مركز شرطة كشكول	107
216,002,200				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	كهرباء	خانفين	انارة شوارع قرى كشكول الكبير وكشكول الصغير / قره تبة	108
166,200,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	المقدادية	تأهيل القناطر الصندوقية و المقتربات في سيد جابر و كشكول	109



كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلى	مدة العقد / يوم	رقم العقد	و اراك القني الناسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ث
1.857.000.000	عریخ اعجادراد العملي 2021-09-05	370	رع, عدد	مب برجب سي	قيد التنفيذ	استثماری	الطرق والجسور	المحمودية	سيانة وتبليط طرق شاخة (1, 2, 3) ناحية اللطيفية	1
1,857,000,000	2021-09-05	370	45	92%	जंबता। जंब	استعماري	الطرق والجسور		صيانة واكساء طريق الشيخ رافع حاتم والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة	
	2021-09-05	370	45	92%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الطارمية	بطول 7كم وعرض 5م قضاء الطارمية	2
	2021-09-05	370	45	92%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الطارمية	صيانة وتصليح طريق الاسحاقي والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7كم وعرض 5م قضاء الطارمية	3
1,775,345,000		240	201	20%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	تاهيل طرق متفرقة في اليوسفية: 1.اكساء طريق الشارع الاول ويبدأ من بنر الحمام وينتهي بابو حصوة 2. اكساء طريق الشارع الرابع الذي يبدأ من محلات البو عامر (ثامر الشبلي) الى الشارع الرنيسي وشارع مدرسة الاماني 1.اعادة اكساء الشارع الثاني يبدأ من بنر الحمام باتجاه ابو حصوة 4. تبليط طريق قرية بريسم مقاطعة 2 البو مفرج بطول 2850م	4
		240	201	20%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	المحمودية	اعادة اكساء وتاهيل وتطوير شارع العمارات من جامع الوصي الى تقاطع شارع المحمودية	5
3,056,895,000		270	211	35%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	المحمودية	تبليط شوارع متفرقة في قضاء المحمودية (شوارع حي النور - حي الوصي - الشوارع الخدمية للمدخل الشمالي والجنوبي)	6
		270	211	35%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	المحمودية	اعادة اكساء وتبليط شوارع متفرقة في قضاء المحمودية (شوارع حي الربيعي قطعة 35 مق 36 ابو الشمع , شوارع حي الربيعي خلف مركز الشرطة - الشارع المجاور لمحطة الوقود	7
2,356,600,000		300	218	25%	قيد النتفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	تاهيل طرق متفرقة في اليوسفية :1. تبليط طريق هادي حسن الحميري بطول 1.5م الجاون الجنوبي / 2. تبليط طرق الشيخ شهاب احمد شلال بطول 1800م الحركاوي الجنوبي/3. تاهيل تبليط طريق قرية الشريفات بطول 25م مقاطعة الحركاوي الشمالي/ 4. تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين مدرسة الجندول وقرية عرب داود	8
		240	218	25%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	اكساء الطريق الرابط بين حي الشهداء والطاقة الروسية والمار بعشيرة كراغول بطول 22.8 كم وعرض 6 م / اليوسفية	9
1,578,200,000	2021-08-12	180	220	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	تبليط شوارع حي الداخلية في ابو غريب	10
	2021-08-12	180	220	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	تبليط طريق قرية (الصفر) بطول (2000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	11
	2021-08-12	180	220	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	تبليط طريق قرية (البو عيسى الجطل) احمد عواد جطل بطول (2000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	12
	2021-08-12	180	220	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	تبليط طريق قرية (محمد الشَّهُوانُ) بطول (2000)م وعُرض (5)م في ناحية النصر والسلام	13
2,569,400,000		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل شارع لاحج السكان منطقة ديليبة بطول 1000م	14
		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل شارع عباس الحتروش /منطقة دويليبة	15
		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل مجموعة طرق في منطقة البو علوان والحلابسة ومنطقة ابو وسام اليساري / ناحية عكركوف بطول 5000م	16
		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الشعار بطول 3600م	17
		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الزيدان بطول (6700)م	18
		240	221	40%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الحمدانية /الشيخ صالح المحل	19
2,867,475,000		300	247	45%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	ابي غريب	تبليط طرق العنازي والمحامدة والبكر والحدباء وتاهيل شوارع واحد اذار والريان والمنسية والصديق والمهندسين وغواص / ابو غريب	20
1,458,000,000		300	250	30%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	اعادة تبليط الجزء المتبقي من شوارع حي المرتضى للطرق المشيدة على القطع (10/4 و 11/4 و 13/4 ) والواقعة ضمن حدود بلدية المحمودية	21
747,520,000		2400	259	15%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	اكساء طريق قرية الفرات بطول (2)كم	22

	•		ب حدم ا ک		<del></del>	ر من العصي	<del>/</del>			
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
		240	259	15%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	اعادة اكساء الطريق الرابط بين حي الشهداء والطاقة الروسية والمار بعشيرة البو مفرج والكرابلة بطول 2كم	23
		240	259	15%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء	المحمودية	اعادة تاهيل وتشغيل مجمع ماء سعة 50م3/س في قرية الفرات مقاطعة الحركاوي الشمال ناحية البوسفية	24
		240	259	15%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء	المحمودية	استبدال خط ناقل مجمع ماء الجمبلاطية الجنوبي سعة 200م3/ساعة ناحية اليوسفية	25
868,550,000		180	262	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المدائث	قلع واعادة اكساء وانشاء قالب جانبي للطريق الحولي الاول لقرية الحرية وتأهيل الجزرة الوسطية وفرشها بالمقرنص واعادة اكساء بعض الشوارع المتضررة داخل القرية	26
		180	262	35%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المدائن	قشط واعادة اكساء وتطوير مدخل قرية 9 نيسان وشارع السوق في قرية 9 نيسان	27
4,348,686,000		330	273	78%	قيد التنفيذ	استثماري	الموارد المانية	ابي غريب	معالجة التأكلات الحاصلة في ضفاف ايسر نهر الفرات في الرضوانية الغربية - مناطق ( ريكان الفليح ) و ( البطي و الدرناج ) بطول 1500 م	28
819,000,000		180	277	63%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المدانن	تبليط شوارع ( محمد زويع وفايز مظهر ووسام محمد ورعد سلطان ، شوارع قرية الجوادين ابو حسين الدفاعي ،شارع عباس حسن وسليم ربيش ومهدي الداود ، شارع العريفية ، شارع منعم عبد الله الهميص والشيخ ستار الرديني والحاج مطشر / نلحية الجسر بطول 7000 م	29
279,900,000		150	284	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	المحمودية	تبليط طريق فحيل ام الجير النحالات في ناحية اللطيفية بطول 3 كم	30
2,027,275,000			290	80%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء	التاجي	تنفيذ خط ناقل الى مناطق البو خليفة والبو عبيد والبو صباح وفهد الفاضل / التاجي	31
1,476,300,000			297	100%	منجز	استثماري	الطرق والجسور	المدائن	ناهيل وإعادة اكساء المناطق التالية ( منطقة رجاء / منطقة عتاب /منطقة عكيل / منطقة الجوادين / منطقة قرب التقاطع / المنطقة النفطية ) والطرق المجاورة لها في قضاء المدانن	32
1,545,218,000			308	93%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء	ابي غريب	تاهيل الخط الناقل للماء في عرب كاموس / النصر والسلام	33
3,734,330,250			316	93%	قيد التنفيذ	استثماري	الماء	ابي غريب	استبدال خط ناقل وشبكات ماء ( خرنابات الخيول وعكيل والخزرج وخرنابات الشمالية الى مفقس تموز والاسبيست من جسر الزيتون الى جسر السكراب / ناحية عكركوف	34
871,308,900		300	392	0%		استثماري	التربية	المحمودية	هدم واعادة بناء مدرسة الرباب ابن امرو القيس 12 صف / المدانن	35
4,710,025,000	2021-07-22	240	15	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير المحلة 312	36
	2021-07-22	240	15	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير محلة 314	37
	2021-07-22	240	15	67%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير شارع الضباط	38
4,394,345,000	2021-07-22	300	16	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير محلة 316	39
3,854,345,000	2021-07-22	300	16	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير مناطق متضررة والمتفرقة في شارع عمر بن عبد العزيز من ساحة عنتر لغاية شارع 29 الباخرة	40
	2021-07-22	300	16	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير شارع الامام الاعظم من ساحة عنتر الى جسر الصرافية	41
4,513,075,000	2021-07-22	300	17	63%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع النداء الى قناة الجيش	42
	2021-07-22	300	17	63%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع شارع المغرب الى تقاطع النداء	43
	2021-07-22	300	17	63%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع شارع المغرب الى كلية الفنون	44
	2021-07-22	300	17	63%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاعظمية	اعمال تطوير شارع المشاتل	45

	33—— ( <del>,,</del> ,)===	<u> </u>	<u> </u>		<del></del>	<b>-</b>	ټ			
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	كلفة العقد الأصلي
46	تاهيل بناية التسجيل العقاري	ابي غريب	مباني حكومية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	22	360	2021-07-28	2,857,160,000
47	تاهيل بناية البطاقة الموحدة	ابي غريب	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
48	تاهيل بناية القسم البلدي لقاطع الشهداء	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
49	تاهيل بناية مركز شرطة ابي غريب	ابي غريب	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
50	تاهيل شارع خرنابات الرئيسي الموازي لجدول النهر السايد الثاني	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	3,932,815,000
51	تطوير شوارع في خان ضاري بطول 2,3 كم ( شارع 40 والشارع الحولي )	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	
52	تطوير شوارع الرضوان بطول 1,5 كم و تغذية الانارة	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	
53	تأهيل شارع الكراج السايد الثاني	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	3,021,204,000
54	مد شبكة تصريف مياه الامطار وتاهيل محطة الزهور	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
55	تأهيل وتبليط وتاثيث شارع 30 في حي المهندسين باتجاهين والشوارع المؤدية اليه	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
56	تأهيل السياج الواقي لطريق ابراهيم بن علي ناحية عكركوف	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
57	تطوير شارع 30 مركز المدينة بطول 5,3 كم في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	27	240	2021-08-26	4,789,230,000
58	تأهيل وتأثيث طريق ابي غريب - الشعلة ناحية عقرقوف	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	49	180	2021-09-05	2,256,800,000
59	تاهيل وتاثيث طريق الشعلة في ناحية ابراهيم بن علي ناحية عقرقوف طول 18كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	60	180	2021-09-05	2,452,200,000
60	انارة منطقة الاعظمية والمناطق المجاورة لها	الاعظمية	الكهرباء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	86	240	2021-09-29	2,771,170,000
61	تاهيل مجموعة شوارع في حي عويسات حطين - مربع مدرسة العدالة - المنسية - الرسالة - حي الصديق - الصحفيين - الدور الحمر	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	88	360	2021-09-25	3,999,100,000
62	تأهيل واكساء شوارع – اكساء مجموعة شوارع ضمن مناطق النصر والسلام منطقة الاولى – مناطق 2000و3000و4000و6000 بطول 32كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	4,228,600,000
63	تبليط شوارع حي الفارس بطول كلي 1200م	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
	تبليط شارع الزيدان بطول كلي 4000م	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
	تبليط شارع سوق السعدان ابتداءً من تقاطع السعدان الى مدرسة الزخرف بطول كلي 22م	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	

	مساريح فعدوق العداد العمليات الارهابية للموارث المعاطف العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة										
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت	
	2021-09-25	360	94	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	ابی غریب	تبليط شارع مدرسة السراة من مدرسة السراة الى جامع اولى العزم بطول ككم	66	
	2021-09-25	360	94	100%	منجز	برامج خاصة	البلدية والبلديات	ابي غريب	تبليط شارع منطقة الطويل ابتداء من منطقة الشمال الى تقاطع السعدان بطول ككم	67	
991,600,000	2021-10-24	210	119	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	تاهيل طرقى متعددة في اليوسفية (طريق مدرسة الهداية بطول 900م الحركاوي الشمالي / طريق قرية حامد احمد صالح بطول 2150 م الجمبلاطية الجنوبية/ طريق هيثم مبدر فياض بطول 400م مقاطعة 18 الحركاوي الشمالي/ طريق قرية ابراهيم الخليل بطول 2650م الرضوانية الشرقية مقاطعة 15/ الطريق الرابط بين جاعع البو واوي وصدر اللطيفية القديم والجديد بطول 900م/ اعادة اكساء طريق شبيشة الرابط بين طريق اليوسفية كراغول وطريق شركة القعقاع بطول 5400 م	68	
1,736,800,000	2021-11-11	210	150	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الطارمية	تصليح واكساء طريق قرية عمشة بطول (9000)م وعرض (5)م ضمن قضاء الطارمية	69	
	2021-11-11	210	150	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الطارمية	تصليح واكساء طرق في قرية نديم الذي تعرض لاعمال ارهابية بطول (7500)م وعرض(4)م	70	
	2021-11-11	210	150	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الطارمية	مشروع تأهيل وتبليط طرق في ناحية المشاهدة (تأهيل وتبليط طرق في قرية البو خميس مع الدور والطرق القريبة منها بطول 5,33م - تأهيل وتبليط الطريق الرئيسي المؤدي الى قرية محمود الجاسم بطول 2م - تأهيل وتبليط الطرق المؤدية الى الدور السكنية لقرية محمود الجاسم بطول 1,5 كم )	71	
886,250,000	2021-11-13	180	154	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تبليط طريق هشام السهيل بطول (1000)م –ناحية عكركوف	72	
	2021-11-13	180	154	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تبليط طريق صالح العلواني بطول (1000)م و عرض (5)م في ناحية النصر والسلام	73	
	2021-11-13	180	154	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابی غریب	أعادة تبليط الشوارع الرئيسية في (قرية الذهب الإبيض - حي اشبيلية - باب الحارة)	74	
	2021-11-13	180	154	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تبليط طريق سامي الدخيل(الجزء الرابط) منطقة البو عنوان بطول (700)م وعرض (5)م	75	
	2021-11-13	180	154	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	ابي غريب	اعادة تبليط طريق عودة الرحال منطقة الشيحة بطول (700)م وعرض(4)م	76	
939,000,000	2021-11-14	180	155	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	عادة تبليط طريق السيافية الاولى من السور الى قرية الامين والسمرة وقرية 1 اذار (قرية الصابون وسيد رعد وقرية ابو درع)	77	
3,519,400,000	2021-11-30	360	157	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	التاجي	قُلع واعادة تبليط ومد انبوب يصب في المبزل الرئيسي ـمع عمل منهولات لتصريف مياه الامطر في قرية عواد الحسين ضمن مقاطعة (12) ضباعي بطول (12000)م وعرض (6)م	78	
1,667,250,000	2021-11-20	240	159	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	التاجي	تُبلِيط اطراف جرف الملح مقابل معسكر التاجي التابعة الى مديرية ناحية الحماميات يطول 5000م وعرض 5م	79	
1,668,000,000	2021-11-20	240	159	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	التاجي	تبليط قرية شاطىء الناجي ومنطقة البو شاوي والطرابلة بطول 10000م وعرض 5م ضمن ناحية الحمامييات	80	
1,128,750,000	2021-11-16	210	161	73%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	تبليط الطرق الفرعية للسيافية الاولى والسيافية الثانية بطول 10,500م وعرض 4م ناحية الرشيد	81	
2,136,400,000	2021-11-25	240	162	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المدانن	اعادة تبليط طرق متفرقة في منطقة التويثة والقرى المجاورة لها - ناحية الجسر	82	
	2021-11-25	240	162	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المدانن	عادة تبليط قرى نزار وهيب وحيدر عليوي وكريم جابر رشيد وشاخة 5 وحجي ناصر وحسين حمادي وخضير عباس والمولى ونوري تخيمة وحسين علي شكر والبو جناء والعكيدات وابو عباس ناحية الوحدة	83	
3,063,000,000	2021-11-25	270	163	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المدانن	اعادة تبليط مناطق كل من حي العروبة وحي الزلك (الامير) والطرق المجاورة	84	
	2021-11-25	270	163	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المدائن	اعادة تبليط شوارع في منطقة سيد على والكراغول واطراف قرية محمد الوسمي والطرق المجاورة	85	

عادرت		ייי בכן וב		<del></del>	رد من المحد	الله المسارر		JJ G_J	
تاريخ المباشرة الفع <i>لي</i>	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	Ú
2021-11-25	270	163	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المدانن	اعادة تبليط قرية اليو جمل وهادي الحمادي وقرية المعامرة (حقي اسماعيل المعموري والقرى المجاورة /مركز قضاء المدانن	86
2021-11-28	210	180	76%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	عادة تبليط قرية عيسى كاظم نايل -اللطيفية- الجسر الخامس شاخة 3 بطول 1,5كم	87
2021-11-28	210	180	76%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	اعادة تبليط قرية كامل خيري سريهد بطول 1250م في ناحية الرشيد	88
2021-11-28	210	180	76%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	تبليط قرية بيت روضان في العدوانية وطرق موسى حبيب وطريق علي روكان وطريق على حمود وطريق المشيد عمران وطريق محمد جاسم العيثاوي الناحية الرشيد	89
	270	195	70%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	الطارمية	تاهيل وتبليط طرق في قضاء الطارمية (على العزاوي + مشعان عرميط) و (الحلابسة البو خادم + البو عبيد) و (الشيخة +زويع) و (اللهيب + العناز) و (خلف حمادي + خضير الحلبوسي) و (المعين + غايب حميد ندا)	90
	360	200	20%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	التربية	الطارمية	هدم واعادة بناء مدرسة ابو ايوب الاتصاري سعة 18 صف / الطارمية	91
	240	203	35%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحمودية	اعادة تاهيل وصيانة الطريق الرابط بين الدولي وقرية خضير شويرد مرورا بعدة قرى في صخيرجة الغربية قرية قري في صخيرجة الغربية قرية قادل الصالح ومدرسة الشاكرين وشمس الماجد وناهض فاضل وال فيحان ناصر السعيدي ونجم عبيد وعبد الستار جبر وسعد عيسى وقرية العجنة والطرق المجاورة	92
2021-12-05	270	210	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء	ابي غريب	تاهيل الخط الناقل منطقة عبد السهر / قضاء ابو غريب / ناحة النصر والسلام	93
	300	213	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء	الطارمية	تجهيز وتنصيب مجمع ماء سعة 200م3/ساعة قرية عبد الحمد النمر /الطارمية	94
2021-12-15	300	224	97%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء	التاجي	الخط الناقل المغذي لمنطقة المصالحة والطجاج / التاجي - شبكة ماء قرية المسارة / التاجي - شبكة ماء قرية المسارة / التاجي - شبكة ماء قرية الغزة طريق لبث محمد العزوي / المشاهدة - الخط المعذي لمنطقة ابو صباح / منطقة البو خليفة 12 ضباعي / التاجي - الخط المغذي لمنطقة البو ريحان / شاطي التاجي - الخط المغذي لمنطقة كريم النجم / التاجي - شبكة ماء ركية وفاضل قطر 110ملم / التاجي	95
	150	241	0%		برامج خاصة	الكهرباء	المدانن	اتارة طريق مدخل المدانن من فلكة المدانن الى مرقد سلمان المحمدي / قضاء المدانن	96
	150	336	0%		برامج خاصة	الداخلية		تجهيز اليات لدوائر جهاز الامن الوطني العراقي في المناطق المحررة	97
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	البلدية	ابي غريب	تطوير تحويلة و غرف لافراد السيطرة في مدخل ابو غريب	98
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	ابي غريب	تنفيذ خط ناقل ماء لقرى الطرفة و الرموث و المروح ناحية النصر و السلام	99
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	ابي غريب	تنفيذ خط ناقل و شبكة ماء لقرى الخليفة و العبيد ناحية النصر و السلام	100
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الماء و المجاري	ابي غريب	تنفيذ خط ناقل و شبكة ماء لقرى الخوصة و الكدير و المشاهدة و الرعيد و الفداغة	101
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق و الجسور	الطارمية	تصليح واكساء طريق قرية القاضي وليد بطول 2000 م وعرض 4 م	102
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق و الجسور	الطارمية	تصليح و اكساء طريق الكردي بطول 2000 م و عرض 4م ناحية العبايجي	103
			100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق و الجسور	الطارمية	تصليح و اكساء طريق 10- رفيع و طريق الاسالة بطول 2000م و بعرض 4 م ناحية العبايجي	104
	تاریخ المباشرة الفعلي 2021-11-25 2021-11-28 2021-11-28 2021-11-28 2021-11-28	عدة العقد / تاريخ المباشرة الفعلي عوم الفعلي 2021-11-25 270 270 2021-11-28 210 2021-11-28 210 270 360 240 2021-12-05 270 300 300 2021-12-15 300	الفعلي تاريخ المباشرة يوم الفعلي يوم	الفني         الفعلي         الفي         الفي	حالة المشروع الفعلى عاملة الإنجاز رقم العقد المدة العقد الفعلى الفعلى عاملة الفعلى الفعلى الفعلى عاملة الفعلى الفعلى الفعلى الفعلى الفعلى الفعلى الفعلى المنافية المنافية الإنجاز المنافية المنافقة المن	الفعلي حالة المشروع القنون الفعلي المسروع الفني المباشرة الإنجاز رقم العقد / الفعلي المباشرة الإنجاز رقم العقد / يوم الفعلي المنتفذ المشروع الفني المباشرة الإنجاز المباهدة الإنجاز المباهدة المسروع المباهدة الم	القطاع نوع المتمويل حالة المشروع الفني (قم العقد مدة العقد / الفعلي الف	التاحية او القضاء الفطاع نوع التمويل حالة المشروع نسبة الإنجاز رقم العقد مدة العقد / كالقطي وم القطي المعاشرة العدائن الطرق والحسور المراجع خاصة عنبا المعاشرة المحدودية الطرق والحسور المراجع خاصة قبد التنفيذ 76% 180 180 210 2021-11-28 210 180 2021-11-28 210 180 76% المحدودية الطرق والحسور المراجع خاصة قبد التنفيذ 76% 180 210 180 2021-11-28 2021-11-28 210 180 76% المحدودية الطرق والحسور المراجع خاصة قبد التنفيذ 76% 270 195 270 2021-11-28 270 195 270 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195 270 195	اسم المشروع المدون الم



		\			<i>"</i>		<del>33</del>	<u> </u>		
كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ت
684,791,550	2022-01-12	180	172	90%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	كوثى	تاهيل طريق العكير الشاخة (3) بطول 4 كم	1
342,745,000	2021-07-12	210	186	100%	منجز	استثماري	الماء و المجاري	الاسكندرية	تاهيل وصيانة شبكات مجاري ومحطات مجمع حطين السكني في الاسكندرية	2
748,291,600	26/1/2022	180	244	35%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	المسيب	تبليط شوارع حي المواطنين خلف جامع المتقين -	3
	26/1/2022	180	244	9%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	المسيب	صيانة طريق اولاد مسلم البيراوي في قضاء المسيب	4
3,096,000,000	23/1/2022	240	274	30%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الاسكندرية	تبليط شوارع حي الامير في الاسكندرية	5
1,121,300,000		210	283	95%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	الاسكندرية	تاهيل طريق البوعلوان بطول (50 1375 م) باعتبار المحطة (0+00) نقطة تقاطع الطريق بطريق بغداد - الحلة مع تنفيذ استدارات نظامية لتنظيم حركة المرور على طريق حلة - بغداد / استثماري/ محافظة بابل	6
2,439,145,000	13-10-2021	330	102	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	صيانة شوارع في حي الانوار	7
	13-10-2021	330	102	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	تبليط شوارع في حي العسكري مع عمل ارصفة جانبية	8
	13-10-2022	330	102	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	اكساء وتبليط شوارع في حي الانتصار / ناحية الاسكندرية	9
4,124,940,500	17-10-2021	360	112	44%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	تبليط شوارع في ملحق حي المصطفى /	10
	2021-10-17	360	112	82%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	اكساء الطرق الداخلية في مجكمع حطين السكني / ناحية الاسكندرية	11
3,435,419,250	18-10-2021	300	114	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	<b>كو</b> ثى	اعادة تأهيل طريق جنابية الحميري بطول 1,5 كم	12
	18-10-2021	300	114	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوث <i>ى</i>	أعادة أنشاء طريق الرابط بين الحميري و ابو شعير	13
	18-10-2021	300	114	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	أعادة أنشاء طريق فرع الامام شاخة 4 بطول 3 كم	14
	18-10-2021	300	114	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوث <i>ى</i>	تأهيل و صيانة طريق سريديب الطلايع بطول 19,1 كم بأعتبار المحطة (0+00) مقتربات مجسر كيش المرور السريع وطريق بطول 1.8 كم باعتبار المحطة (00+0) مقتربات المجسر الفوقائي لتقاطع النيل القديم مع المرور السريع	15
1,228,948,000	19-10-2021	210	115	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	صيانة طريق قرى الشجيرية – البو داغر – الكلابيين – الزوية – الليلي بطول ( 8240 ) م / /	16
	19-10-2021	210	115	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	تبليط افرع من طريق قرى ( الشجيرية – البو داغر – الكلابين – الزوية – الليلى ) بطول ( 1960 ) م	17
	19-10-2021	210	115	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	تبليط طريق الحصوة الكبير بطول (2) كم	18
4,267,702,450	19-10-2021	360	117	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	تبليط طريق مدرسة ميسلون ( ام الحمام بطول 4,700 م )	19
	19-10-2021	360	117	95%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	تبليط طريق ضياء عبد الزهرة السعداوي بطول 2400م	20
	19-10-2021	360	117	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	طريق الشهيد هاشم عدنان وزياد سلمان بطول 2 كم	21
	19-10-2021	360	117	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	صيانة طريق قرية 2 بطول 1750 م في ناحية سدة الهندية المنهاوية	22
	19-10-2021	360	117	93%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	تبليط طريق راشد سهيل الحمداني بطول 3,9 كم/	23
	19-10-2021	360	117	100%	منجز	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	اكمال تبليط تاهيل شوارع حي الزهراء في مدينة الحامية المفروش بالحصى الخابط بطبقة من الاستبلايزر	24
	19-10-2021	360	117	90%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	البليط طريق عبد الكاظم عبيد قرية (5) بطول 1,25 كم	25
	19-10-2021	360	117	98%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	تبليط طريق الجانب الايسر من جدول بني حسن بطول 5,5 كم	26
	19-10-2021	360	117	85%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المسيب	تبليط طريق ابن الكاظم ( الكيلو 10 ) بطول 1.35 كم	27
4,407,093,850	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	صيانة طريق مدخل كوثى المدخل الاول مقابل قرية الامام بطول 2600م	28
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تاهيل طريق الرشايد شاخة 14	29
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تاهيل طريق قرية الرشايد (13/1) مدرسة الرضوان بطول 850 م	30

كلفة العقد الأصلي	تاريخ المباشرة الفعلي	مدة العقد / يوم	رقم العقد	نسبة الإنجاز الفني	حالة المشروع	نوع التمويل	القطاع	الناحية او القضاء	اسم المشروع	ن
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	کوٹ <i>ی</i>	اعادة تاهيل طريق الهزيز مدرسة بيان النصر	3
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة انشاء طريق منطقة الهلالي شاخة (9)	3
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة انشاء طريق مدرسة صوت القرآن شاخة (2) /	:
	31-10-2021	360	126	99%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تاهيل طريق قرية الحيدري شاخة (3) مدرسة الاعتدال .	
2,853,514,300	24-11-2021	240	146		قيد المباشرة	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	صياتة طريق الجفجافة المحاذي لنهر الجفجافة بطول 6,5 كم باعتبار المحطة (0+00) الشارع العام من جهة طريق كربلاء المقدسة - بغداد	3
	24-11-2021	240	146		قيد المباشرة	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	صيانة طريق قرية تونس بطول 5325 م	
	24-11-2021	240	146		قيد المباشرة	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	صيانة طريق الدائرة بطول 7.2 كم وعرض 8م باعتبار المحطة (0+00) الشارع العام من جهة الحصوة	
	24-11-2021	240	146		قيد المباشرة	برامج خاصة	الطرق والجسور	الاسكندرية	اعادة تاهيل طريق قرية سعد محيل البعيجي	
1,702,377,250	15-11-2021	300	149	80%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الاسكندرية	اعادة انشاء مجمع ماء الجزيرة سعة 200 م3/ ساعة / ناحية الاسكندرية	
2,231,934,800	2021-01-12	300	166	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	کوٹ <i>ی</i>	اعادة تأهيل طريق جنابية عجرش مدرسة الرحمة	ii
	2021-01-12	300	166	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تأهيل طريق شاخة الشيخ عادل صليبي المعموري	
	2021-01-12	300	166	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	أعادة أنشاء طريق شاخة مزهر عداي 5/2	
	2021-01-12	300	166	60%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	مشروع تاهيل الطريق الريف الزاهر بطول (1.5) كم	
	2021-01-12	300	166	55%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تاهيل طريق الرشايد شاخة 10	
1,438,025,500	2021-06-12	270	205	73%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الماء و المجاري	الاسكندرية	مجمع ماء مويلحة 2	
1,075,482,500	27/12/2021	180	208	51%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	اعادة تأهيل طريق زبيدي شاخة 5 /	
	27/12/2021	180	208	33%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	كوثى	صيانة مدخل كوتى الثانيي المحاذي لمشروع المسيب بطول 3600 م	
2,917,500,000	2022-12-01	300	235		قيد المباشرة	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	تبليط وتاهيل واكساء الشوارع الداخلية مع الارصفة وتاهيل الحدائق العامة للمجمع السكني التابع لمركز التدريب المهني	
4,057,625,000	2021-12-19	300	238	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	اكساء شوارع العمارات الثلاثة وطريق كرفانات فندق الخبراء وتاهيل الجزرة الوسطية مع الامارة حول مجمع حطين السكني /	
	2021-12-19	300	238	65%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	البلدية والبلديات	الاسكندرية	تاهيل واكساء الطرق الداخلية لمنطقة الاسكان الصناعي ومد انبوب وانشاء خزان كونكريت مسلح من محطة الرفع في الاسكان الصناعي الى محطة الرفع على طريق الزائرين	
952,486,450	28/12/2021	240	240	24%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	انشاء طريق الدكتور امين عبد الحسن مانع	
	28/12/2021	240	240	22%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	تاهيل طريق علي العبود - البومراوح بطول 1.6 كم	
	28/12/2021	240	240	20%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	انشاء طريق قرية البو منغر - ابو بلاو بطول 550 م (250 م صيانة و 300 م انشاء)	
	28/12/2021	240	240	32%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	تاهيل طريق خضير صالح عبد الله منطقو البوعلوان في قضاء المحاويل بطول 950 م	
	28/12/2021	240	240	52%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	انشاء طريق بتة ميري	
	28/12/2021	240	240	36%	قيد التنفيذ	برامج خاصة	الطرق والجسور	المحاويل	انشاء طريق السادة النعيم بطول 1500 م	
734,930,000	16/1/2022	180	269		قيد المباشرة	برامج خاصة	الماء و المجاري	الاسكندرية	تاهيل شبكات الصرف الصحي في مجمع الاسكان الصناعي / الاسكندرية	ı
	16/1/2022	180	269		قيد المباشرة	برامج خاصة	الماء و المجاري	الاسكندرية	تاهيل محطات مجاري في مجمع الاسكان الصناعي / الاسكندرية	
	16/1/2022	180	269		قيد المباشرة	برامج خاصة	الماء و المجاري	الاسكندرية	مشروع تاهيل شبكات ومحطات مجاري الامطار في ناحية السدة	
140,670,000				100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	المحاويل	مشروع تاهيل شبكات ومحطات مجاري الامطار في ناحية السدة تأهيل طريق حسين علاوي بطول 580 م و طريق البوعلوان من جامع الحضرة المحمدية بطول 1 كم	
198,692,950			<u> </u>	100%	منجز	برامج خاصة / تنفيذ امانة	الطرق والجسور	المحاويل	أعادة أنشاء طريق رحيم عبد الصاحب بطول 850 م	

# مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها



# مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

#### قرض البنك الدولى الطارئ / الأول M\$350 عدد المشاريع عدد المشاريع عدد المشاريع المبلغ المصروف المبلغ المتبقي المخطط لها المتعاقد عليها المنجزة المشاريع المبلغ المخصص الملاحظات القطاع USD)) USD)) الكهرباء 2,713,039.16 67,286,960.84 28 28 28 70,000,000.00 الطرق والجسور 28,314,737.60 108,685,262.40 35 35 35 137,000,000.00 البلديات 12422078.63 49,577,921.37 45 45 62,000,000.00 45 الصحة 12,971,403.85 15,028,596.15 3 3 3 28,000,000.00 دائرة المبائي 11,906,073.00 93,927.00 0 6 6 12,000,000.00 الموارد المائية 14 30,000,000.00 29,935,583.00 64,417.00 0 0 المجموع 98,262,915.24 240,737,084.76 <u>111</u> <u>117</u> <u>131</u> 339,000,000.00

#### قرض البنك الدولي الطارئ / الاضافي M\$400 عدد المشاريع عدد المشاريع المبلغ المصروف المبلغ المتبقي ((USD) المنعقد عليها المنجزة عدد المشاريع المخطط لها المبلغ المخصص الملاحظات القطاع USD)) الكهرباء 48,948,728.17 1051271.83 0 6 20 50,000,000.00 الطرق والجسور 107,231,560.11 3768439.89 0 1 24 111,000,000.00 البلديات 47,500,000.00 0.00 0 0 12 47,500,000.00 الصحة 28,000,000.00 0.00 0 0 28,000,000.00 1 الموارد المائية 30,000,000.00 0.00 0 6 7 30,000,000.00 النقل 5,000,000.00 0.00 0 7 5,000,000.00 0 التربية والتعليم 32,000,000.00 0.00 0 0 26 32,000,000.00 الزراعة 0.00 0 **17** 32,000,000.00 0 32,000,000.00 محافظة الانبار / المكون 15,916,380.68 4,083,619.32 1 4 8 20,000,000.00 العاشر محافظة نينوى / المكون 20,000,000.00 0.00 1 7 20,000,000.00 7 العاشر محافظة ديالي / المكون العاشر 10,000,000.00 9,332,303.00 667697.00 1 4 9 محافظة صلاح الدين / المكون 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 3 العاشر 385,928,971.96 9,571,028.04 <u>28</u> 395,500,000.00 المجموع <u>1</u> 141

# القرض الالماني M€500

		<u> </u>	000	<del>-                                    </del>			
الملاحظات	المبلغ المتبقي Euro	المبلغ المصروف Euro	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / Euro	القطاع
	18,687,570.10	26,312,429.90	4	8	8	45,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الأولى
	172,200,454.43	7,799,545.57	0	1	6	180,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الثانية
	44,033,554.00	966,446.00	0	4	6	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / الطرق والجسور
	45,000,000.00	0	0	0	24	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / دائرة المشاريع الممولة خارجيا (الماء والمجاري)
	185,000,000.00	0	0	0	4	185,000,000.00	وزارة الصحة الصحة
-	464,921,578.53	27,278,875.90	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>48</u>	500,000,000.00	المجموع

	المنحة الكويتية – خاصة لقطاع الصحة / المرحلة الاولى M\$15									
الملاحظات	المبلغ المتبقي ((USD	المبلغ المصروف ((USD	المنجز	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD	القطاع			
	13,442,245.00	1,557,755	0	19	19	15,000,000.00	الصحة			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	15,000,000.00	المجموع			
	<u>M\$</u>	المرحلة الثانية 85	لماع الصحة /	تية – خاصة لقو	المنحة الكوين					
الملاحظات	المبلغ المتبق <i>ي</i> ((USD	المبلغ المصروف ((USD	المنجز	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD	القطاع			
	85,000,000.00	0	0	0	36	85,000,000.00	الصحة			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36</u>	85,000,000.00	المجموع			

# المنحة الصينية / منحة عينية لقطاع البلديات / بمبلغ ستون يوان (9,000,000 \$)

ملاحظات	أدوات احتياطية	عدد الاليات	المحافظة
		36	نینوی
		36	الاتبار
		18	صلاح الدين
تم تجهيز جميع الاليات والأدوات الاحتياطية	105 صندوق أدوات احتياطية	9	كركوك
		11	ديالى
		7	يغداد
		1	بایل
		<u>118</u>	المجموع

منحة البنك الإسلامي للتمنية 1,250,000											
الملاحظات	المبلغ المتبقي ((USD	المبلغ المصروف ((USD	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD	القطاع				
	1,250,000.00	0	0	0	1	1,250,000	الماء والصرف الصحي				
	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	1,250,000	المجموع				

المنحة الماليزية 100,000\$										
الملاحظات	المبلغ المتبقي ((USD	المبلغ المصروف (USD	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD	القطاع			
	100,000.00	0	0	0	1	100,000	وزارة الصحة			
		<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	100,000	المجموع			

#### المنحة التشيكية 458,421.2\$ عدد المشاريع عدد المشاريع عدد المشاريع المبلغ المصروف المبلغ المتبقي المخطط لها المتعاقد عليها المنجزة (USD)) المبلغ المخصص ((USD الملاحظات القطاع 103,161.20 77,460 1 3 180,621 الكهرباء 2 الصحة 277,800.00 0 0 3 4 277,800 المجموع <u>77,460</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>7</u> <u>458,421</u>

# اليات المنحة الصينية















جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار







إعادة تأهيل جسر شيشين \ صلاح الدين





تجهيز محطات متنقلة للمحافظات








تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة







42.5 كم شارع نفط خانة ـ منديلي

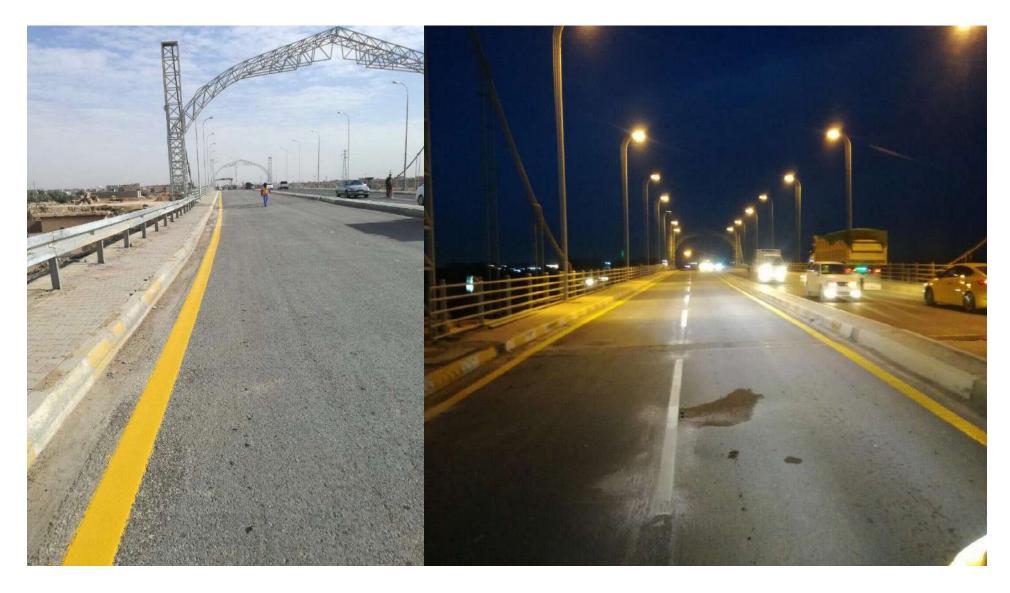

إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה Dankie Gracias Спасибо Köszönjük Grazie Dziękujemy Dėkojame Dakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Täname teid 谢谢
Thank You Tak 感謝您 **Obrigado** Teşekkür Ederiz Σας ευχαριστούμε υουρί Bedankt Děkujeme vám ありがとうございます **Tack**
